

2
عاما
من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit
C E D I U



برنامج دعم المساهمات المجتمعية
في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر
2024

وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

عَامَل

من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U



الجمهورية العربية الفلسطينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْهَا مِزْجًا مَّحْمُولًا



وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشييد (الحواجز والسدود والكرفانات)

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

مديرية معين - شارع الرباط - خلف مكتبة القلم الذهبي

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية

تلفون: 781010777

فاكس: 01 470960

البريد الإلكتروني: info@cediu.gov.ye

الموقع على شبكة الانترنت: @cediu_ye

@cediuye

جميع حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة © وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة





عندما تأتي الأمطار معظم المياه تذهب إلى الصحراء، وملايين الأطنان تصب في الوديان وتتجه إلى البحر، والشيء اليسير هو الذي يستفيد منه المجتمع. فيما مضى كان الآباء والأجداد يهتمون جداً بالسدود وحواجز المياه وبالبرك والخزانات التي تخزن الماء لاحتياجاتهم الشخصية والزراعية، في هذا الزمن نحتاج إلى العناية بالحواجز المائية بكل أشكالها: الخزان، والبركة، والحوض، والسد... على المستوى الشخصي والجماعي والعزل والقرى والمناطق بشكل عام.

السيد العلم/

عبدالملك بدر الدين الحوثي

”يحفظه الله“

الإهتمام بالقطاع الزراعي والنهوض به، وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع بإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز دور القطاع الزراعي في مجال الأمن الغذائي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضرورة الإهتمام بإنشاء السدود والحواجز والكرفانات المائية والتوعية والإرشاد الزراعي وإيجاد الحلول والآليات العلمية والعملية، والبنية التحتية اللازمة لتسويق وتخزين وتصدير المنتجات الزراعية واستنهاض الدور المجتمعي للمساهمة في تحقيق التنمية.

فخامة الأخ الرئيس/

مهدي محمد المشاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى





أثناء قيام معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (في حكومة الإنقاذ الوطني) برفقة محافظ محافظة الضالع عبداللطيف الشغدري والسلطة المحلية بالمديرية والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المهندس شهاب الشامي وممثل وحدة التدخلات بالمحافظة المهندس عصام أبو لحوم وأعضاء كادر وحدة التدخلات وعدد من الأهالي لمشروع إنشاء حاجز الضيق .

مديرية جين - م / الضالع



| المشاركة المجتمعية وانطلاق التنمية للنهوض في بناء الأوطان

كلمة مدير إدارة مشاريع البرامج الزراعية:



م. محمد صالح بشر
مدير إدارة مشاريع البرامج الزراعية

◀ **تمثل الزراعة** من حيث المبدأ نشاط إقتصادي هام للكثير من أفراد المجتمع، وحجر أساس قوي في التنمية المستدامة للدول وخطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي للدولة والذي يقلل من اعتمادها على الدول الأخرى ويمنحها الأمن الغذائي ويمكنها من تجاوز أكبر نقاط الضعف التي يمكن أن يتم إستهدافها عبرها، وقد إهتمت القيادة السياسية والثورية العليا بالنهضة الزراعية وركائزها الأساسية وبذلت الجهود وأصدرت التوجيهات في سبيل ذلك.

من المعروف أن النهضة الزراعية تعتمد بشكل أساسي على الموارد المائية المتاحة في البلد؛ الأمر الذي وضع المزارعين في المناطق الريفية في تحدٍ كبير فرضه المناخ الموسمي السائد في اليمن وشحة الموارد المائية إضافة إلى الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية بإعتبارها المصدر الرئيسي للمياه المتاحة التي تتناقص بصورة مخيفه بفعل تسارع وتأثير السحب في مقابل التغذية الموسمية الخفيفة لها والتي ستزيد حده بتوسع النشاط الزراعي، وإذا ما إستمر الوضع كما هو عليه فان ذلك سيؤدي بشكل حتمي إلى كارثة حقيقية من شأنها أن تهدد البيئة الطبيعية وتعيق إمكانيات البلاد في التنمية.

مثل إنشاء وتفعيل مشاريع وأنظمة حصاد مياه الأمطار بمختلف أنواعها (سدود - حواجز - كرفانات - خزانات - برك...) الحل الأمثل في مواجهة تحدي محدودية الموارد المائية في النهضة الزراعية لذلك سارعت وحدة التدخلات إلى إستهداف هذه المشاريع ضمن برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) وبرنامج إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) من أجل تحريك عجلة التنمية الزراعية في البلد بشكل أوسع.

أثناء زيارة حاجز السيلتين برفقة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة/ محمد أحمد مفتاح والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المهندس/ شهاب أحمد الشامي
مديرية جُبْن - م/ الضالع

برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) في سطور.....


في وقتنا الحالي أصبحت الكثير من المجتمعات المحلية مفرطة في الإتكالية ومتلقي سلبى للخدمة وإن وجدت أحياناً بعض المبادرات التعاونية فهي جهود فردية لا ترتقي إلى المعنى الحقيقي للمبادرات وغابت المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية والريفية وهذا ظهر جلياً في غياب الإستدامة للتدخلات التنموية وتدني في خدماتها المقدمة للمستهدفين وغابت روح العمل التعاوني والتكافلي بين أفراد المجتمع.

ومن هذا المنطلق، جاء دور وحدة التدخلات المركزية ببرنامجها دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) بهدف تحفيز المبادرات المجتمعية وتنظيم المجتمع المحلي تنموياً بفرض إيجاد أطر مجتمعية فاعلة وراعية لدورها التنموي بإشراك المجتمعات المحلية في تعزيز العمل التنموي في إطار مناطقها بإيجابية وفاعلية بما يعكس مستوى الوعي والتنظيم الذي وصلت إليه هذه المجتمعات وإستعادة لتلك الأعراف والعادات التعاونية المتجذرة في المجتمع اليمني.

من خلال دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) يمكن تحسين المستوى الإقتصادي للمجتمعات الريفية عن طريق توسعة النشاط الزراعي طوال العام وإستصلاح الأراضي الزراعية وبالتالي تقليل الفجوة الإقتصادية بين سكان الريف والحضر بل وإكتفاء المجتمعات الريفية بالنتائج الزراعي المحلي وبالتالي وضع أساس تنموي قوي لبناء مستقبل أفضل للمجتمع بشكل خاص وللبلد بشكل عام.

أهمية برنامج

دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشييد (الحواجز والسدود والكرفانات)

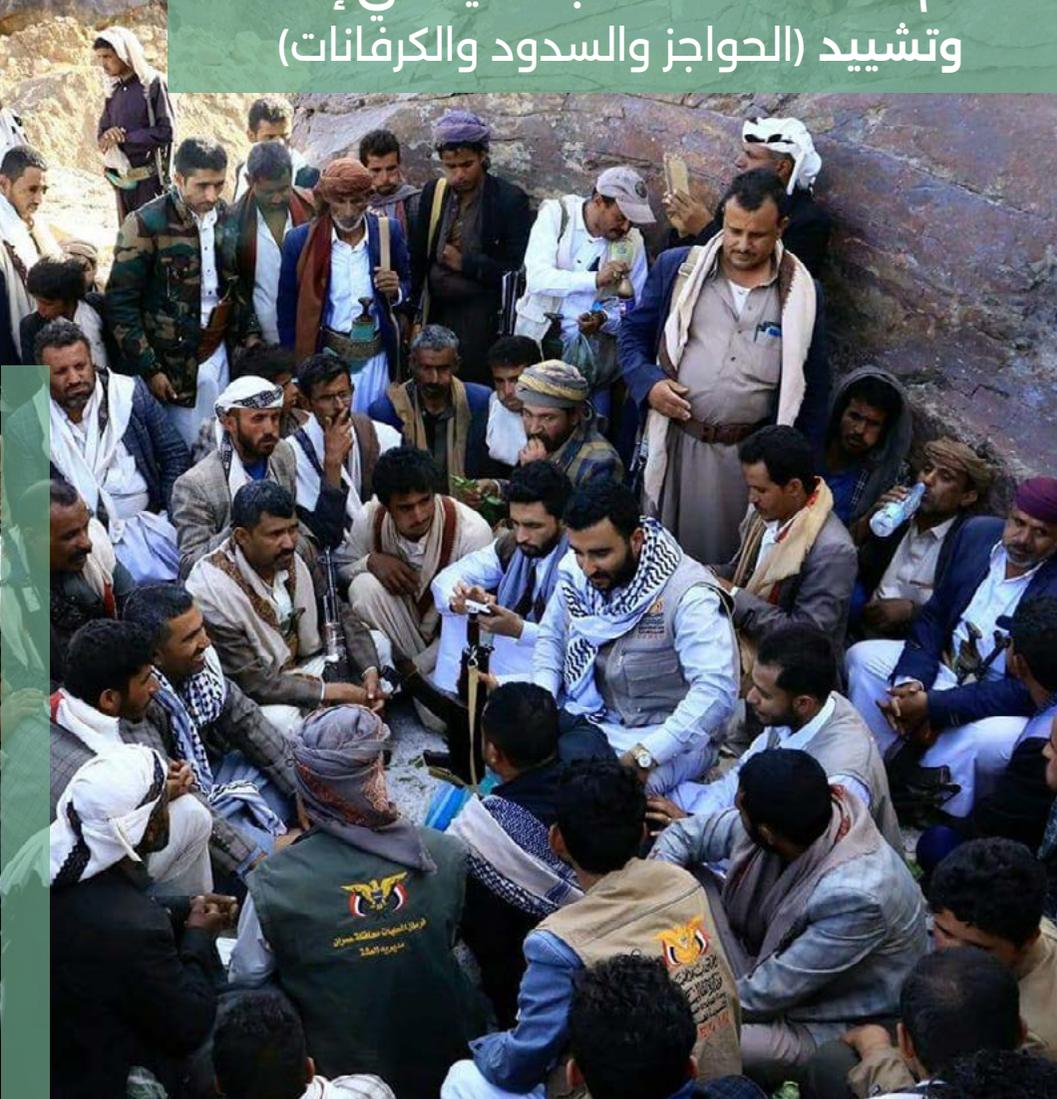

2 تقوية الروابط المجتمعية:

تشجع على التعاون والعمل الجماعي، مما يقوي العلاقات بين أفراد المجتمع.

4 الإستدامة البيئية:

تشجع على الممارسات المستدامة وحماية البيئة من خلال مشاريع تعني بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

6 تحسين الزراعة:

توفر المنشآت الزراعية (السدود والحواجز والكرفانات) إمدادات مستقرة من مياه الري، مما يزيد من الإنتاجية الزراعية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

8 تحسين الأمن المائي:

تسهم مشاريع حصاد مياه الأمطار في توفير مياه مستدامة للزراعة والشرب، مما يقلل من الاعتماد على مصادر المياه غير المستقرة.

10 خلق فرص عمل:

تتطلب مشاريع إنشاء الحواجز والسدود توفير وظائف جديدة لسكان المجتمع المحلي.

تفعيل دور المجتمع في عمليات الرقابة بما يعزز من مبدأ الشفافية ومنها الوصول الى المساواة.

14 الحماية من الفيضانات.

1 تعزيز الإقتصاد المحلي:

تدعم الإنتاج المحلي وتسويق المنتجات المحلية مما يعزز الإقتصاد ويقلل من الاعتماد على الواردات.

3 خلق فرص عمل:

تساعد في إيجاد وظائف محلية وتقليل البطالة.

5 تنمية الإقتصاد المحلي:

تدعم المشاريع المحلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الإقتصادي.

7 تحسين جودة المياه:

تدعم المشاريع المحلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الإقتصادي.

9 زيادة الإنتاجية الزراعية:


يوفر إمدادات مائية ثابتة للري، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل ويعزز الأمن الغذائي.

تسمح بتجميع إمكانيات المجتمع وإستثمارها بشكل كامل مما يؤدي إلى السرعة في الإنجاز والشمول في معرفة احتياجات ومتطلبات المجتمع.

توطيد العلاقة بين المجتمع ومُثليه في السلطة المحلية (بناء الثقة).

تقلل الحواجز والسدود من خطر الفيضانات التي يمكن أن تُحدث أضراراً كبيرة بالمجمعات والممتلكات.

أهداف البرنامج



2

تخزين المياه: ضمان توفير المياه للإستخدام الزراعي والتسرب خلال فترة الجفاف.



4

توليد الطاقة: إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية لتلبية احتياجات المجتمع.



6

تحسين الحياة الإقتصادية: خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإقتصاد المحلي من خلال زيادة النشاط الزراعي والصناعي.



8

الهجرة العكسية: الدفع نحو الهجرة العكسية من الحضر إلى الريف، والحفاظ على الإستقرار في الريف من خلال توفير الخدمات، ومصادر الدخل المناسبة.

1



حماية المجتمعات: حماية المناطق السكنية والزراعية من الفيضانات والأمطار الغزيرة.

3



تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني: تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال توفير موارد المياه اللازمة وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني.

5



التنمية المستدامة: دعم استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

7



خفض فاتورة الإستيراد: تقليل الإعتماد على المنتجات المستوردة، (التقليل من احتياجنا للنقد الأجنبي) مما يعزز الإقتصاد المحلي ويقلل من النفقات المالية للدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة، تحسن من دخل المزارعين، وبما يدفع نحو الإكتفاء الذاتي.

9



تغذية المياه الجوفية: تساهم مشاريع المنشآت الزراعية (الحواجز والسدود والكرفانات) في عملية تغذية المياه الجوفية وزيادة منسوب المياه في الآبار السطحية واليرتوازية.



المبادرة المجتمعية

أساس المبادرة المجتمعية

تعريف المبادرة

وتعرف المبادرة المجتمعية بأنها عمل أو مشروع يُطلقه أفراد أو جماعات داخل المجتمع بهدف تحقيق تغيير إيجابي أو تحسين ظروف معينة وتركز هذه المبادرات على تلبية احتياجات المجتمع وتقديم حلول لمشكلات محلية ويوجد عدد من الأسس لإعتبار أي مشروع كمبادرة....




عموم الفائدة

أن تعود فائدة المشروع على المجتمع أو جزء كبير منه.



تمثيل المجتمع

يوجد لجنة تتكون من عدة أفراد يتم إنتخابهم من المجتمع لتمثيل المجتمع أمام الجهات المساهمة فيما يخص المبادرة وتكون مسؤولة عن المساهمات المقدمة أمام هذه الجهات.



توفر الدعم

يوجد جهات رسمية أو خاصة أو جمعيات تساهم في المشروع بمساهمات مختلفة، حيث يتم توثيق مساهمة كل جهة في المشروع.



التغطية الإعلامية

أن يتم تغطية مراحل تنفيذ المشروع إعلامياً من أجل نقل المبادرات الناجحة والفوائد التي عادت للمجتمع بعد تنفيذها.



المشكلة أو الإحتياج

وجود حاجة مجتمعية يجب توفيرها من أجل التخفيف عن المجتمع أو مشكلة (اقتصادية أو إجتماعية) يعاني منها المجتمع وبحاجة إلى حل.



الوعي والتفاعل المجتمعي

وجود مجتمع واعي ومهتم بمصالحة ومتحرك لإنجاز المشاريع التي تخدم تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي له ككل.



توفر المساهمة

أن يكون المجتمع قادر على جمع مساهمات مالية أو عينية أو بالعمالة من أجل تنفيذ المشاريع.



متابعة وتقييم العمل

تقييم عملية التنفيذ والاستفادة من النتائج في التحسين المستمر للمشاريع.



دورة حياة المبادرة المجتمعية



النزول لتقييم الأثر



الإستلام والإغلاق



متابعة تنفيذ
المشروع



تهيئة بدء التنفيذ
(تسليم المساهمة)



دراسة وإعتماد
المبادرة



أثناء زيارة فريق الوحدة ممثلة بمدير إدارة البرامج الزراعية م/ محمد بشر لحاجز
الخمائر برفقة وكيل قطاع واستصلاح الأراضي والموارد المائية الدكتور عباس هبه
والإطلاع على سير العمل أثناء تنفيذ الحاجز
محافظة صعدة

نبذة عن البرنامج

نهوض التنمية في المجتمعات

تُولي وحدة التدخلات الكثير من الاهتمام في مشاريع المساهمات المجتمعية كون المجتمع يمثل الركيزة الأساسية في مشاريع التنمية المستدامة وقد استهدفت الوحدة ضمن برنامج دعم المساهمات المجتمعية.

ضمن برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات) عدد (486) مشروع تتوزع في عدد (13) محافظة بإجمالي تكلفة (16,513,834,026) ريال ومساهمة الوحدة المعتمدة (5,856,027,551) ريال يستفيد منها أكثر من (916,377) نسمة. من ضمن هذه المشاريع عدد (28) مشروع منجز وعدد (61) مشروع قيد التنفيذ. ضمن المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ عدد (60) حاجز وسد وعدد (4) كرفانات و (17) خزان وبركة بالإضافة إلى عدد (5) قنوات وعبارات. تمثلت مساهمة الوحدة في هذه المشاريع بتوفير مادتي الأسمنت والديزل بالإضافة إلى توفير معدات القطع أو الحفر في بعض الحالات الخاصة ومساهمة الوحدة في إنشاء عدد (43) مشروع من المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ بينما اقتصرت المساهمة في باقي المشاريع في أعمال معالجة وترميم وتنظيف المشاريع من الرسوبيات.



مساهمة الوحدة عبر البرنامج



تعمل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة **كمساهم مع المجتمع**، كون المجتمع هو المنفذ الحقيقي للمشاريع، من خلال توفير جزء من الموارد الغير متوفرة داخل المجتمع المحلي، حيث تتمثل مساهمة الوحدة بالآتي:

مساهمة مادية

- توفير معدات ثقيلة للحفر والنقل ومعدات قطع الأحجار
- توفير اللوحات المعدنية التعريفية الخاصة بالمشاريع



مساهمة عينية

- أسمنت
- محروقات (ديزل)



نوع المساهمة



مساهمة مالية

- توفير نفقات التشغيل والصيانة للمعدات المملوكة للسلطة المحلية أو المجتمع
- توفير بدل النقل لكميات مساهمة الوحدة الى مواقع المبادرات
- توفير نفقات الاشراف للمهندس المشرف (في بعض الحالات) الاستثنائية.



مساهمة فنية

- إعداد الدراسات والمسوحات
- الإشراف والمتابعة على التنفيذ للمبادرات

شروط

دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)

- يشترط في المبادرات التي تدعمها الوحدة بالمحافظة أن تمثل أولويةً ناشئةً عن خطة مجتمعية
- موثقة تم التوصل إليها من خلال جهد جماعي متفق عليه وليس مقترحات فردية.



- أن تمثل المبادرة احتياجاً مجتمعياً يحقق منفعة أو خدمة عامة للمجتمع المستهدف.
- أن تمثل المبادرة اولوية ناشئة عن خطة مجتمعية موقعة تم التوصل إليها من خلال جهد جماعي متفق عليه وليس مقترحات فردية.
- وجود مساحات زراعية أو صالحة للزراعة مستفيدة من تنفيذ المشروع تُكافئ السعة التخزينية للمشروع.
- أن يحقق المشروع المطلوب المساهمة فيه تنمية مستدامة في المجال الزراعي.
- أن تسود زراعة الفواكه والحبوب والبقوليات في المناطق المستفيدة وليس شجرة القات.
- وجود دراسات متكاملة للمشروع تم إعدادها واعتمادها من جهة معتمدة لدى وحدة التدخلات.
- وجود مهندس مشرف من قطاع الري على تنفيذ مشاريع الحواجز والسدود والكرفانات.
- وجود جدوى إقتصادية فعلية من تنفيذ المشروع.
- البدء بتشكيل اللجان المجتمعية وفقاً للنموذج المعتمد والمعمول لدى الوحدة.
- تتطلب المبادرة المساندة من خارج المجتمع، والمجتمع قادر على توفير مساهمته.
- ان يتم التنفيذ بالشراكة مع السلطات المحلية لضمان نجاح المشروع والاسهام في حل أي إشكالات قد تعترض التنفيذ.
- عدم وجود ممول آخر بنفس نوعية المساهمة التي تقدمها الوحدة.
- إذا تساوت نتائج المفاضلة للمبادرات تكون الأولوية للمبادرات في النطاق الأكثر سكاناً.
- تجهيز مالا يقل عن 30% من مساهمة المجتمع لتنفيذ المبادرة، والتي سيخرجها الى حيز التنفيذ بتوفير مساهمة الوحدة.
- المجتمع المتفاعل والمنجز للمبادرات في فترة اقل من البرنامج الزمني المعتمد مع جودة التنفيذ يعطي الأولوية في اعتماد المبادرات الأخرى ضمن الخطط القادمة.



مؤشرات القياس

في متابعة وتقييم مشاريع البرنامج



طبيعة التنفيذ لمشاريع البرنامج

التخطيط

1 تحديد الأهداف والمستفيدين من المشروع، ودراسة الموقع المناسب لإنشاء المشروع المقترح (حاجز - سد - كرفان...الخ)

التصاميم

2 إعداد التصاميم الهندسية اللازمة، بما في ذلك الرسومات والمخططات التفصيلية والمواصفات الفنية لبنود الأعمال.

تنفيذ الأعمال

3 بدء عمليات إنشاء الحواجز والسدود باستخدام معدات ومواد مناسبة، وفقاً للمواصفات المحونة في الدراسات المعتمدة من قبل الجهة المختصة.

التوثيق والتقارير

4 الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل بدء التنفيذ (محضر تسليم موقع... الخ) وتنازلات عن أراضي الموقع.

تقييم الأثر

5 الرفع بالتقارير الدورية من قبل الجهات المختصة لمراقبة سير تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التوثيق الفوتوغرافي لجميع مراحل المشروع.

الدراسات الفنية

6 مراقبة تقدم العمل وتقييم النتائج بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف.

التراخيص

7 تسليم المشروع للسلطة المحلية والمستفيدين بعد إجراءات التسليم النهائي والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للأعمال المعتمدة في الدراسة، وكذا تقديم خطط ومقترحات أولية لصيانة المنشأة بشكل دوري.

المتابعة والتقييم

8 تسليم المشروع للسلطة المحلية والمستفيدين بعد إجراءات التسليم النهائي والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للأعمال المعتمدة في الدراسة، وكذا تقديم خطط ومقترحات أولية لصيانة المنشأة بشكل دوري.

تسليم المشروع

9 بعد التنفيذ من حيث الاستفادة من المشروع ونسبة زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومقارنتها بما قبل تنفيذ المشروع.

الجودة الفنية

1 نسبة المشاريع المنجزة مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.

معدل الإنجاز

2 تقييم جودة الإنشاءات من خلال معايير فنية محددة.

تقييم الأثر البيئي

3 قياس التحسينات في جودة البيئة بعد تنفيذ المشاريع.

عدد المستفيدين

4 عدد الأسر أو الأفراد الذين استفادوا من المشروع سواء من خلال الإسكان أو الحماية من الفيضانات.

مساحة الأراضي الزراعية المستفيدة

5 قياس مساحة الأراضي التي تستفيد من تنفيذ المشروع.

تحسين الأمن المائي

6 قياس كمية المياه المحفوظة أو المخزنة نتيجة إنشاء السدود والحواجز.

الرضا المجتمعي

7 قياس مدى رضا المجتمع عن النتائج ومدى تحقيق احتياجاتهم.

التكلفة مقابل الإنجاز

8 التكلفة المنصرفة في المشروع حتى وقت مُعين أثناء التنفيذ إلى نسبة الإنجاز الفني الفعلي في نفس الوقت.



أثناء زيارة معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (في حكومة الانقاذ الوطني) برفقة قائد المنطقة العسكرية الخامسة أبو حسين المدائني ونائب مدير مكتب السيد محافظ محافظة صعدة أبو طه جرفان ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف عادل بادر ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل الحيفي وأعضاء كادر وحدة التدخلات وعدد من الأهالي لمشروع سد نخلة .

مديرية ساقين - م/ صعدة

التوزيع الجغرافي الأمثل حسب المحافظة والمناطق المستحقة وفقاً للمستويات والمؤشرات

3 المستوى الاقتصادي

استهداف المناطق ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى تحسين البنية التحتية المائية والإنتاج الزراعي.

2 تحديد الأولويات

تحديد الأولويات من المشاريع في كل محافظة مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً، وتعاني من مشكلات في الموارد المائية.

1 تحليل البيانات

إستخدام أساليب التحليل الجغرافي (مثل نظم المعلومات الجغرافية GIS) لتحديد المناطق الأكثر إحتياجاً.

6 التوافر اللوجستي

مراعاة سهولة الوصول إلى المواقع لتنفيذ المشاريع بشكل فعال.

5 المخاطر البيئية

تجنب التركيز على المناطق التي لا توجد بها أي مخاطر بيئية من تنفيذ المشاريع، أو آلية تعمل بها المشاريع على إحتواء المخاطر البيئية وتحسين البيئة العامة.

4 الكثافة السكانية

التركيز على المناطق التي يوجد لها كثافة سكانية كبيرة مستفيدة من تنفيذ المشاريع بشكل مباشر.

7 البيانات التاريخية

إستخدام بيانات سابقة حول الفيضانات أو الأزمات المائية لتحديد الأولويات.

7 التنوع الجغرافي

توزيع المشاريع بشكل عادل بين المناطق في كل المحافظات.



المساحة الزراعية المستفيدة من حاجز الزمامات تحت سطحي وتحويللي عذلة نشور - مديرية الصفراء - م/ صعدة

الأمن الغذائي



دعم القطاع الزراعي من خلال تحسين إدارة المياه مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

المعايير الفنية (التصميم)



أن تكون جميع المشاريع مصممه وفق معايير هندسية دقيقة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

الأمن المائي



أن تحقق المشاريع مبادئ الإدارة المتكاملة للمواد المائية من المنطقة.

المشاركة المجتمعية



إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ لضمان تلبية احتياجاتهم.

الإستدامة



التأكيد على أن المشاريع تعزز من التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة وعلى حقوق الأجيال القادمة.

التمويل والموارد



تحديد مصادر التمويل الممكنة وتوزيع الميزانية بشكل عادل لتحقيق الشمولية.

الأثر الناتج



أن يكون للمشاريع أثر إيجابي واضح على المستوى الإقتصادي للمجتمع المحلي.

المحددات العامة

لأعمال المشاريع

في إطار البرنامج



برنامج دعم المساهمات
المجتمعية في إنشاء وتشبيد
(الحواجز والسدود والكرفانات)

بالأرقام

المحافظات المستهدفة





إجمالي المحافظات المستهدفة | إجمالي المديرات المستهدفة

13 محافظة | 91 مديرية

إجمالي عدد المشاريع



486 مشروع

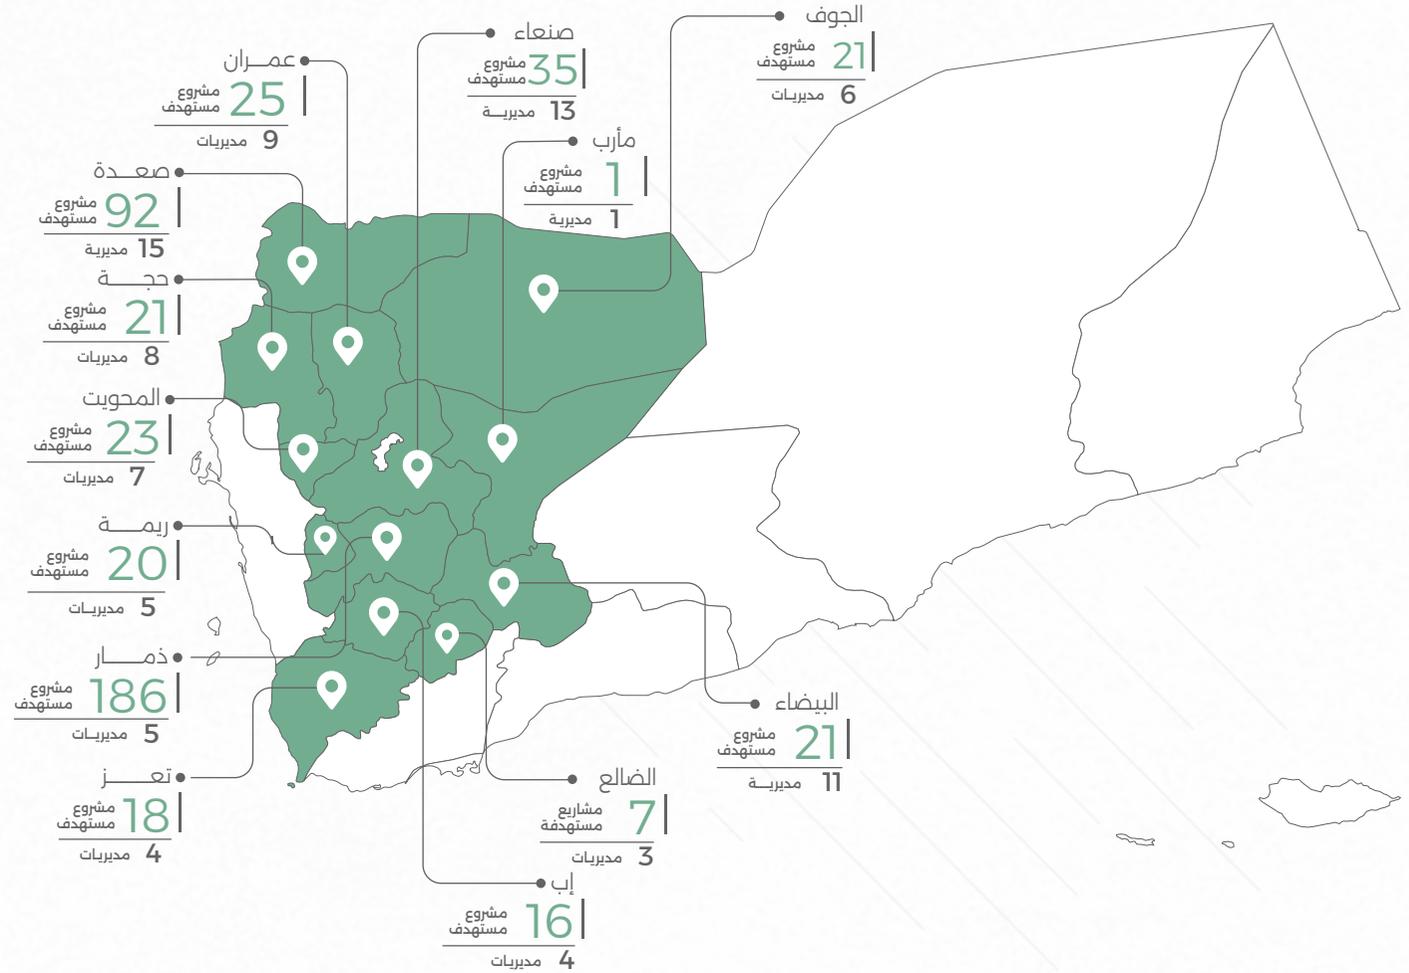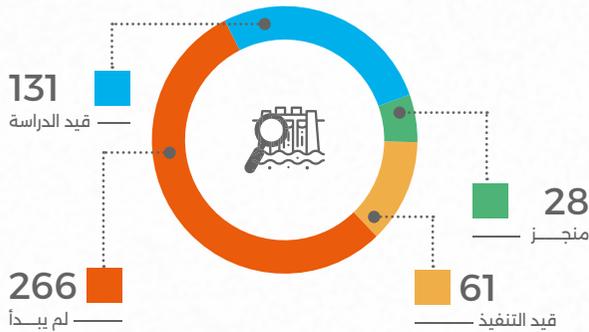

الإستهداف


يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مبادرة من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند إستهداف أي مشروع أو مبادرة مجتمعية وقد أولت الوحدة الكثير من الإهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع من مشاريع المنشآت الزراعية ويبلغ عدد السكان المستفيدين المباشرين من مشاريع برنامج دعم المساهمات المجتمعية أكثر من (916,377) نسمة.



حيث بلغ
عدد المستفيدين

916,377

نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية

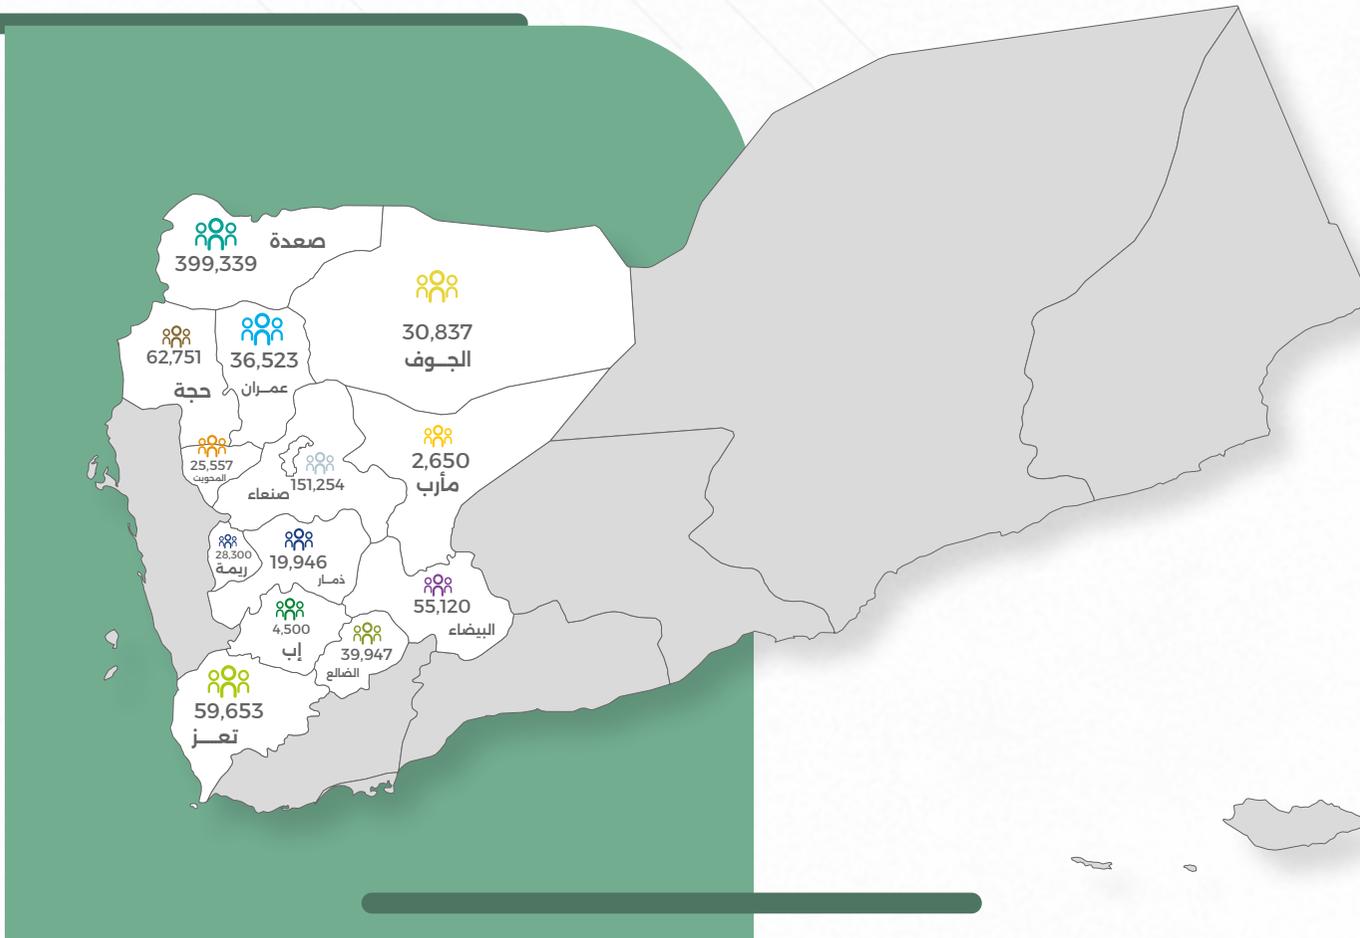

إجمالي عدد المشاريع



إتجهت وحدة التدخلات المركزية ضمن إطار توجه القيادة العليا للبلد في الإهتمام بالجانب الزراعي إلى التركيز على مشاريع المنشآت الزراعية وإعطاءها أولوية كبيرة فقد بلغت المشاريع المستهدفة ضمن برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشيد (الحواجز والسدود والكرفانات) عدد (486) مشروع منها عدد (28) مشروع منجز وعدد (61) مشروع قيد التنفيذ وعدد (266) مشروع لم يبدأ بينما وصل عدد المشاريع قيد الدراسة إلى (131) مشروع توزعت في جميع المحافظات المستهدفة.


13
محافظة



238 91
عزلة مديرية

<p>تعز</p> <p>18 مشروع مستهدف</p> <p>4 مديريات 14 عزلة</p>	<p>المحويت</p> <p>23 مشروع مستهدف</p> <p>7 مديريات 19 عزلة</p>	<p>صعدة</p> <p>92 مشروع مستهدف</p> <p>15 مديرية 67 عزلة</p>
<p>ذمار</p> <p>186 مشروع مستهدف</p> <p>5 مديريات 19 عزلة</p>	<p>الضالع</p> <p>7 مشاريع مستهدفة</p> <p>3 مديريات 3 عزل</p>	<p>عمران</p> <p>25 مشروع مستهدف</p> <p>9 مديريات 21 عزلة</p>
<p>إب</p> <p>16 مشروع مستهدف</p> <p>4 مديريات 13 عزلة</p>	<p>البيضاء</p> <p>21 مشروع مستهدف</p> <p>11 مديرية 19 عزلة</p>	<p>ريمة</p> <p>20 مشروع مستهدف</p> <p>5 مديريات 10 عزل</p>
<p>حجة</p> <p>21 مشروع مستهدف</p> <p>8 مديريات 21 عزلة</p>	<p>الجوف</p> <p>21 مشروع مستهدف</p> <p>6 مديرية 13 عزلة</p>	<p>صنعاء</p> <p>35 مشروع مستهدف</p> <p>12 مديرية 27 عزلة</p>
		<p>مأرب</p> <p>1 مشروع مستهدف</p> <p>1 مديرية 1 عزلة</p>

متوسط نسبة الإنجاز

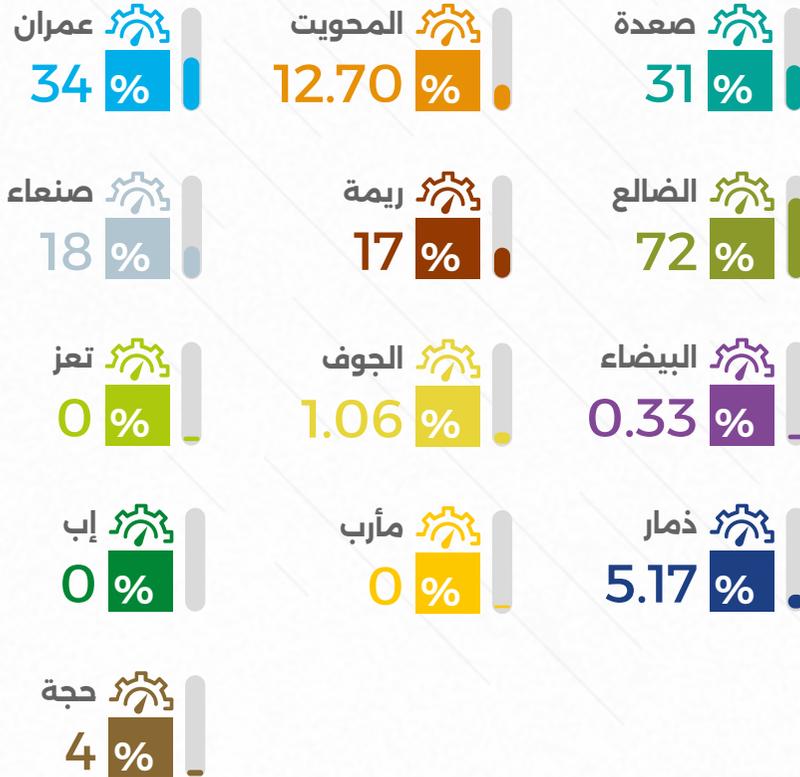

يعتمد مستوى إنجاز مشاريع برنامج دعم المساهمات المجتمعية على مدى تفاعل المجتمع وتوجهه إلى الإهتمام بالمشاريع بإسناد وحدة التدخلات وقد سجل المجتمع في بعض المحافظات تفاعل كبير حيث تحرك المجتمع في بعض المحافظات بشكل كبير وسجلت المشاريع نسب إنجاز مرتفعة كما هو ظاهر في محافظات الضالع وعمران وصعدة، بينما كان تفاعل المجتمع في بعض المحافظات منخفض أو معدوم مما سجل متوسط نسب إنجاز منخفضة جداً فيها ووصلت إلى الصفر في المحافظات التي لم تبدأ بها أعمال تنفيذ المشاريع، لكن بشكل عام فإن متوسط نسبة الإنجاز في مشاريع برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشيد (الحواجز والسدود والكرفانات) التي تستهدفها الوحدة % 22.13.




22.13 %


إجمالي قيمة المساهمات حسب المحافظات



إجمالي مساهمة وحدة التدخلات المركزية | إجمالي مساهمة المجتمع | إجمالي مساهمة الجهات الأخرى

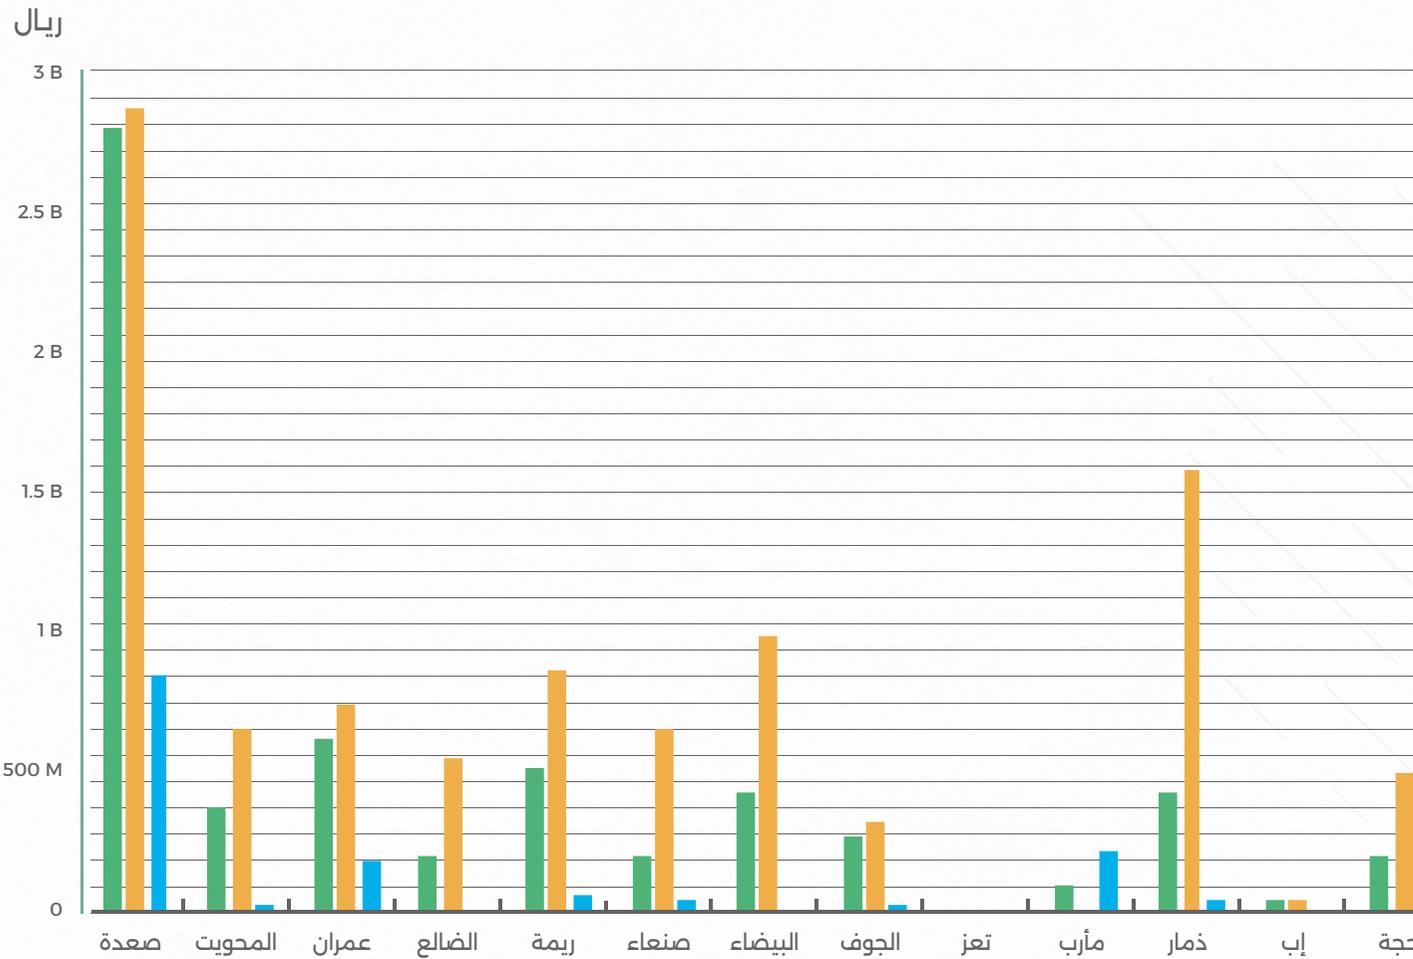

16.5
مليار ريال

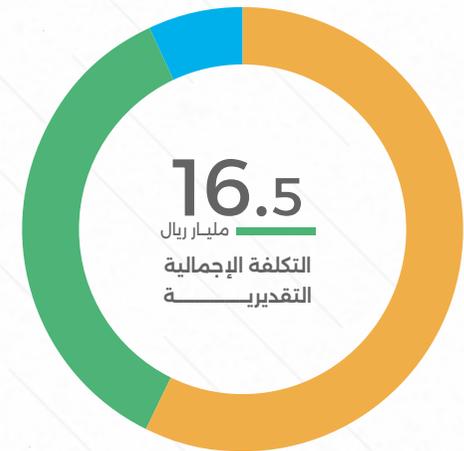

1.3
مليار ريال

5.8
مليار ريال

9.4
مليار ريال

An aerial photograph of a large dam in a desert canyon. The dam is a long, low structure made of concrete and stone, spanning across a deep, rocky gorge. Behind the dam is a large reservoir of water, which is a vibrant green color. The surrounding landscape is arid and rocky, with some sparse vegetation. The sky is clear and blue. The text is overlaid on the bottom left of the image.

خلاصة وضع
الإنجاز للمبادرات
في مختلف المحافظات



1

محافظة
صعدة



خلاصة الوضع العام لمحافظة صعدة

عدد المشاريع

2	غمر
5	الحشوة
3	كتاف
1	رازح
1	الظاهر
5	حيدان
4	منبه

عدد المشاريع

9	باقم
8	مجز
7	قطابر
19	الصفراء
16	بني بحر
8	ساقين
2	آل سالم
2	سحار

399,339 مستفيد

92 مشروع

15 مديرية



6.475 مليار ريال



15	منجز
19	قيد التنفيذ
29	لم يبدأ
29	قيد الدراسة

حالة الإنجاز العامة لمشاريع



إجمالي السعة التخزينية

9.956 مليون متر مكعب



حاجز - سد	خزان حصاد / بركة	كرفان	قناة / ساقية
عدد 86	عدد 3	عدد 2	عدد 1



إنشاء سد الشهيد القائد
مديرية الظاهر - م/ صعدة



ترميم وصيانة حاجز أمدار
عزلة نشور - مديرية الصفراء - م/ صعدة



إنشاء سد القمام
عزلة آل عمار - مديرية الصفراء - م/ صعدة




إنشاء حاجز الرزيمات تحت سطحي وتحويل
عزلة نشور - مديرية الصفراء - م/ صعدة



إنشاء سد عويرة
عزلة الأبقور - مديرية سحر - م/ صعدة



من واقع
الميدان

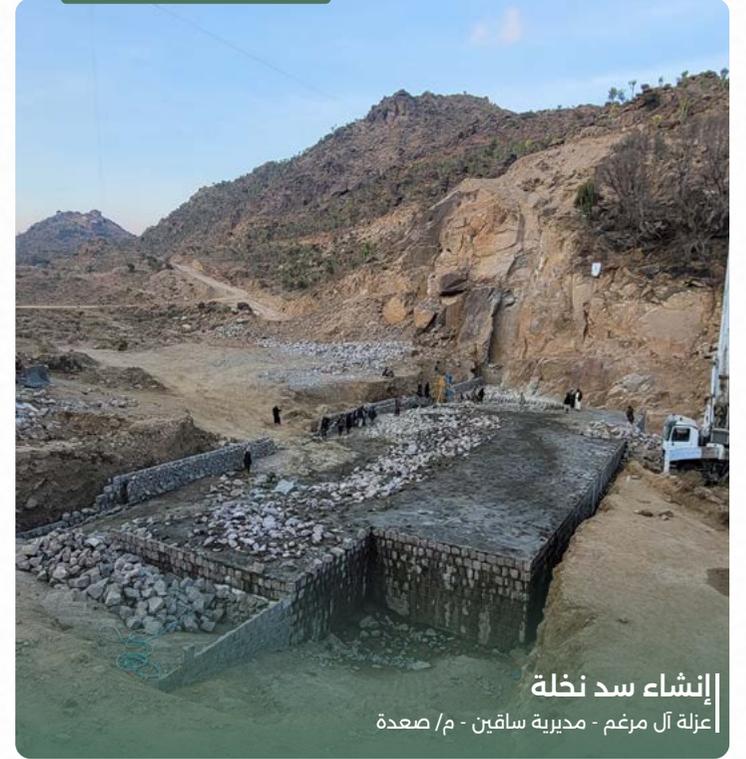




إستكمال حاجز السبطة
عزلة يسنم - مديرية باقم - م/ صعدة



إستكمال كريف فلة
عزلة وادي فلة - مديرية مجز - م/ صعدة

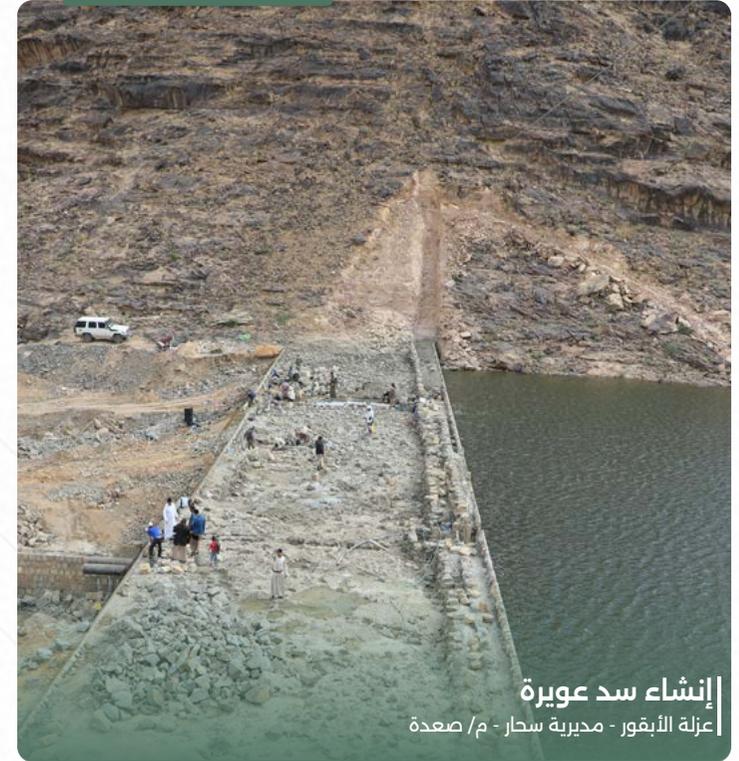

إنشاء سد عويرة
عزلة الأبقور - مديرية سحار - م/ صعدة



إنشاء سد عويرة
عزلة الأبقور - مديرية سحار - م/ صعدة



إنشاء سد نخلة
عزلة آل مرغم - مديرية ساقين - م/ صعدة





جانب من تدشين
تسليم آليات
ومعدات إضافية
لأسطول وحدة
التدخلات المركزية
بمحافظة صعدة





2

محافظة
المحويت



خلاصة الوضع العام لمحافظة المحويت



عدد المشاريع

- 4
- 4
- 3
- 9
- 1
- 1
- 1

الطويلة

بني سعد

الخبث

شبام

الرجم

ملحان

المدينة



حالة الإنجاز
العامة لمشاريع

25,557 مستفيد

23 مشروع

7 مديريات



982.9 مليون ريال



إجمالي السعة التخزينية

263,422 متر مكعب

قناة / ساقية
عدد 1



خزان حصاد / بركة
عدد 15



حاجز - سد
عدد 7





إترميم خزان الأطلا
عزلة بني علي - مديرية الرجم - م/ المحويت




إترميم خزان الأطلا
عزلة بني علي - مديرية الرجم - م/ المحويت



إنشاء خزان البركة
عزلة الأهرج - مديرية الطويلة - م/ المحويت



من واقع
الميدان

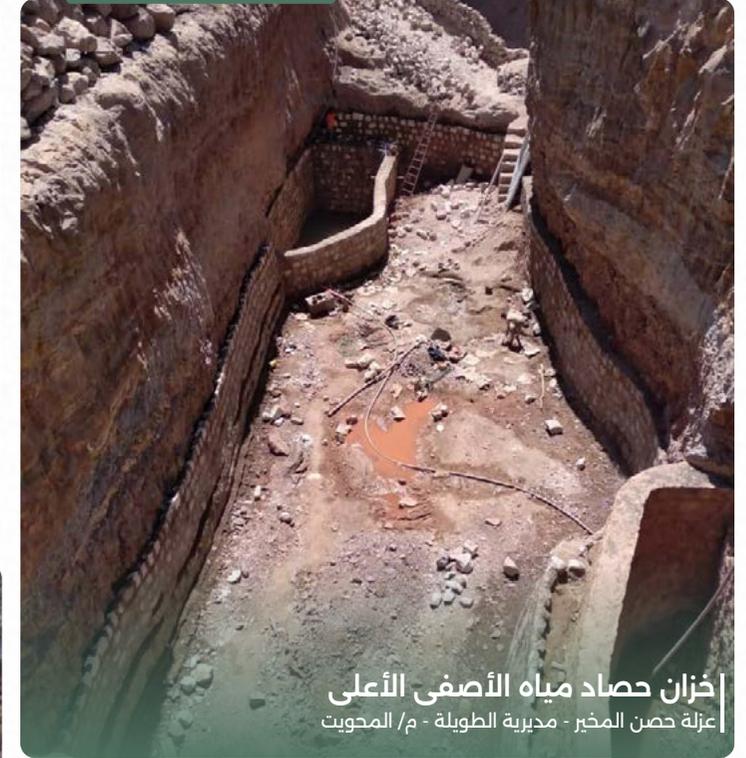



3

محافضة
عمران



خلاصة الوضع العام لمحافظة عمران



عدد المشاريع

- 6
- 2
- 1
- 3
- 4
- 2
- 3
- 1
- 3

العشة
السود
جبل عيال يزيد
حبور ظليمة
شهارة
خارف
القفلة
حرف سفيان
المدان

2 منجز
12 قيد التنفيذ
4 لم يبدأ
7 قيد الدراسة

حالة الإنجاز
العامة لمشاريع



36,523 مستفيد

25 مشروع

9 مديريات




162,551,320 مساهمة الجهات الأخرى

681,298,395 إجمالي مساهمة المجتمع

585,841,509 إجمالي مساهمة الوحدة

1.429 مليار ريال

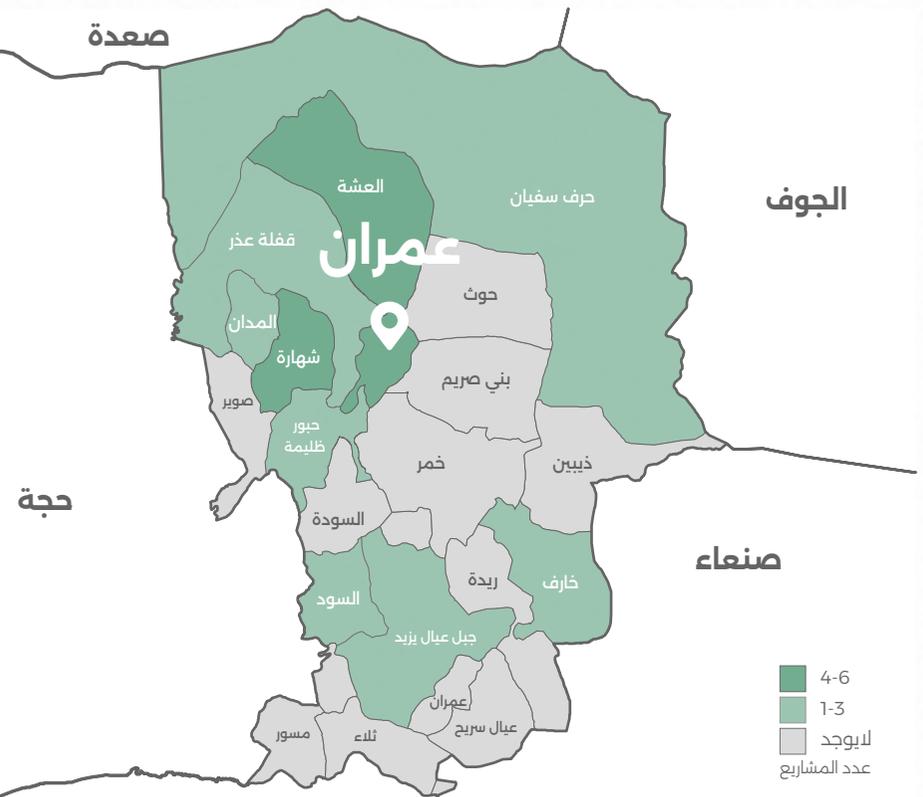


إجمالي السعة التخزينية

1.370 مليون متر مكعب



قناة / ساقية	كرفان	خزان حصاد / بركة	حاجز - سد
عدد 1	عدد 1	عدد 1	عدد 22

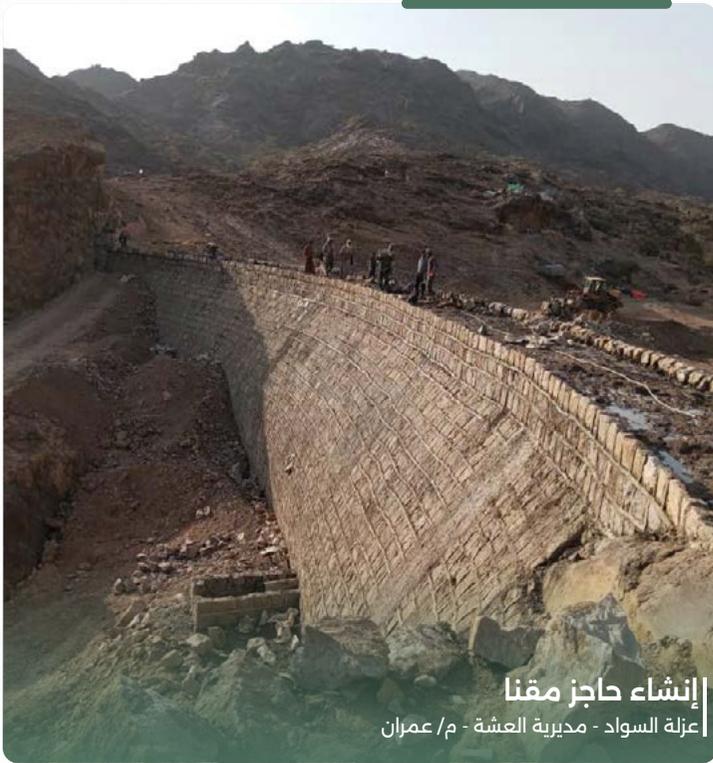

إنشاء حاجز مقنا
عزلة السود - مديرية العشة - م/ عمران



إنشاء عبارة وساقية سد القليعات
عزلة ثلث الزودي - مديرية خارف - م/ عمران



إنشاء حاجز الشهيد القائد
عزلة المشهد - مديرية القفلة - م/ عمران




إنشاء حاجز الشهيد الصماد (وادي المغلاة)
عزلة ذو غيثان - مديرية القفلة - م/ عمران



إنشاء حاجز بين الحديدين
عزلة سيران الغربي - مديرية شهارة - م/ عمران



من واقع
الميدان

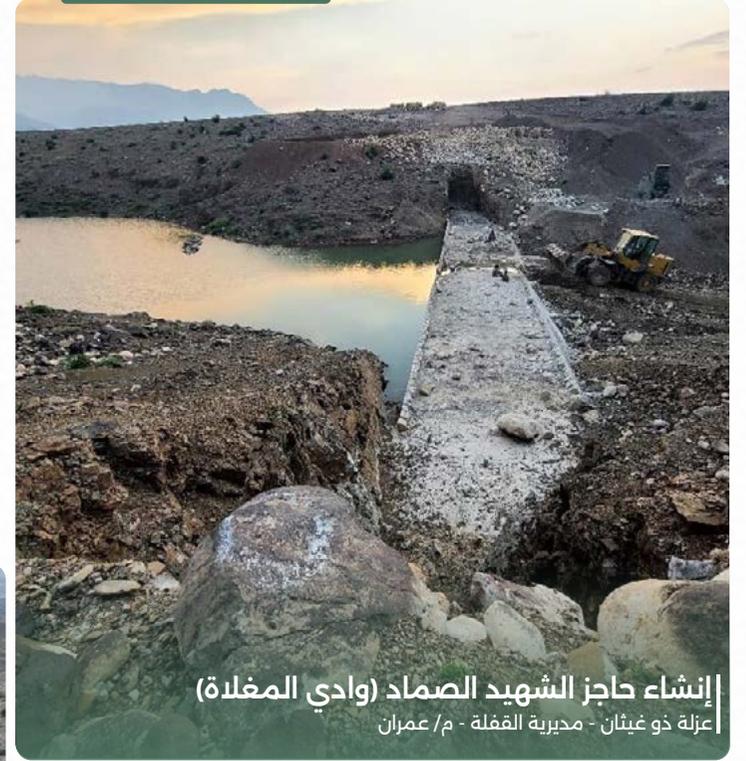



4

محافظة
الضالع



إنشاء حاجز السيلتين
عزلة حجاج - مديرية جُن - م/ الضالع



إنشاء حاجز السيلتين
عزلة حجاج - مديرية جُن - م/ الضالع



إنشاء حاجز الضيق
عزلة حجاج - مديرية جُن - م/ الضالع



إنشاء حاجز السيلتين
عزلة حجاج - مديرية جُن - م/ الضالع



إزالة الرسوبيات من حاجز اللحجين
عزلة كنة - مديرية دمت - م/ الضالع



من واقع
الميدان






5

محافظة
ريمة



خلاصة الوضع العام لمحافظة ريمة



عدد المشاريع

1
10
6
2
1

السلفية
الجبين
الجعفرية
كسمة
مزهر



28,300 مستفيد

20 مشروع

5 مديريات



1.354 مليار ريال



إجمالي السعة التخزينية

252,816

متر مكعب



خزان حصاد / بركة	عدد الآبار	مساحة الأراضي الزراعية المستفيدة	حاجز - سد
عدد 6	عدد 16	هكتار 458	عدد 14

6-10
1-2
لا يوجد
عدد المشاريع



إنشاء حاجز الحجار البيضاء
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إنشاء حاجز الحسوة
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إنشاء حاجز الحجار البيضاء
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إنشاء حاجز القصور
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إزالة الرسوبيات من حاجز الخربة
عزلة النوبة - مديرية السلفية - م/ ريمة




من واقع
الميدان



إنشاء حاجز الحجار البيضاء
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إزالة الرسوبيات من حاجز الخربة
عزلة النوبة - مديرية السلفية - م/ ريمة

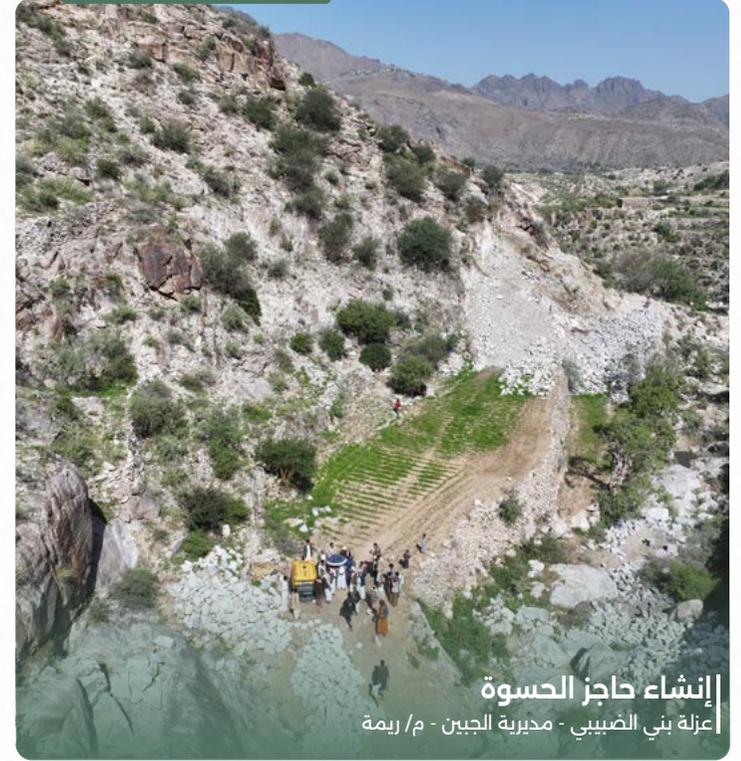

إنشاء حاجز الحسوة
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إنشاء حاجز الحجار البيضاء
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



إنشاء حاجز الضلوع
عزلة بني الضبيبي - مديرية الجبين - م/ ريمة



6

محافظة
صنعاء



خلاصة الوضع العام لمحافظة صنعاء



عدد المشاريع

8	بني مطر
1	بلاد الروس
1	الحصن
2	أرحب
1	نهم
3	مناخة

عدد المشاريع

2	همدان
3	جحانة
1	خولان
6	سنحان وبني بهلول
4	الحيمة الداخلية
2	الحيمة الخارجية

151,254 مستفيد

35 مشروع

12 مديريات



19,145,400 مساهمة الجهات الأخرى

613,287,663 إجمالي مساهمة المجتمع

178,861,302 إجمالي مساهمة الوحدة

811.2 مليون ريال



7	منجز
7	قيد التنفيذ
6	لم يبدأ
15	قيد الدراسة



إجمالي السعة التخزينية

1.990 مليون متر مكعب



قناة / ساقية	كرفان	خزان حصاد / بركة	حاجز - سد
عدد 2	عدد 6	عدد 13	عدد 13



إخزان قرية المنار
عزلة المخلاف - مديرية الحيمة الخارجية - م/ صنعاء



إنشاء خزان حصاد مياه أمطار البيرين
عزلة بالأحبوب - مديرية الحيمة الداخلية - م/ صنعاء



إزالة الرسوبيات لسد بيت مجرز
عزلة الربيع - مديرية همدان - م/ صنعاء



إصلاح وتأهيل الجدار الساند لمسقى (قناة) قوب
عزلة بني سحام - مديرية خولان - م/ صنعاء



كريف الغيماني
عزلة وادي الأحبار - مديرية سنحان وبني بهلول - م/ صنعاء



من واقع
الميدان



إنشاء خزان رحبة
عزلة الحدب - مديرية بني مطر - م / صنعاء



خزان مياه شرب وطوي غيل قرية الصلولة
عزلة بني قيس - مديرية بني مطر - م / صنعاء



كريف الغيماني
عزلة وادي الأبحار - مديرية سحان وبني بهلول - م / صنعاء



حفر سد محل بيت الحجري بيت معوضة
عزلة بني حسن - مديرية مناخة - م / صنعاء



حفر وترميم خزان بهكه
عزلة بني النمري - مديرية الحيمة الداخلية - م / صنعاء



7

محافظة
الجوف



خلاصة الوضع العام لمحافظة الجوف




عدد المشاريع

2
1
4
8
2
4

الحزم
الزاهر
خب والشعف
برط العنان
المراشي
المطمة

30,837
مستفيد

21 مشاريع
6 مديريات



546.6
مليون ريال




0 منجز
3 قيد التنفيذ
9 لم يبدأ
9 قيد الدراسة

حالة الإنجاز
العامة لمشاريع

إجمالي السعة التخزينية

1.558
مليون متر مكعب

حاجز - سد	خزان حصاد / بركة	كرفان	قناة / ساقية
16 عدد	1 عدد	3 عدد	1 عدد

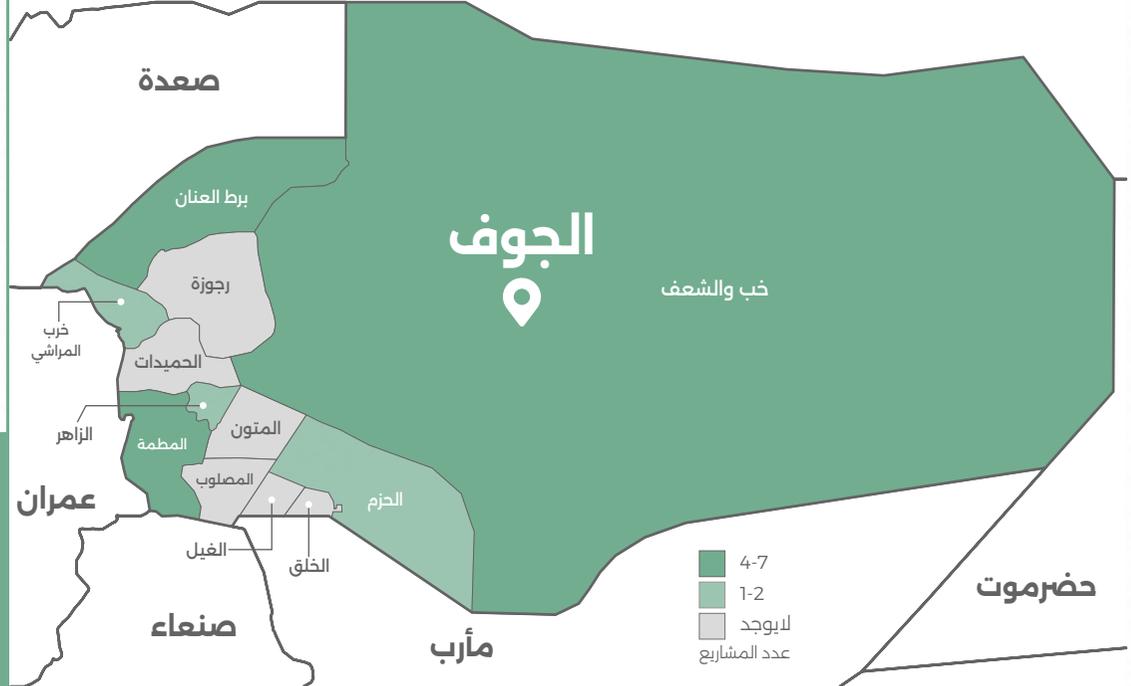



إنشاء قناة قاع الراشد
عزلة الراشد - مديرية بربط العنان - م/ الجوف



إنشاء قناة قاع الراشد
عزلة الراشد - مديرية بربط العنان - م/ الجوف



إستكمال حاجز ملاطع
عزلة رحوب - مديرية بربط العنان - م/ الجوف



صيانة حاجز رونة الفرج
عزلة الخراب - مديرية خراب المراشي - م/ الجوف



من واقع
الميدان



صيانة حاجز رونة الفرغ
عزلة الخراب - مديرية خراب المراشي - م / الجوف




صيانة حاجز رونة الفرغ
عزلة الخراب - مديرية خراب المراشي - م / الجوف



صيانة حاجز رونة الفرغ
عزلة الخراب - مديرية خراب المراشي - م / الجوف



إستكمال حاجز ملاطع
عزلة رحوب - مديرية برط العنان - م / الجوف





8

محافظة
ذمار

خلاصة الوضع العام لمحافظة ذمار



عدد المشاريع

1
1
1
179
4

وصاب السافل
عتمة
المنار
مغرب عنس
الحذاء



0 منجز
1 قيد التنفيذ
178 لم يبدأ
7 قيد الدراسة

حالة الإنجاز
العامّة لمشاريع

19,946 مستفيد

186 مشروع

5 مديريات



1.929 مليار ريال




إجمالي السعة التخزينية

281.917
متر مكعب



حاجز - سد	خزان حصاد / بركة	قناة / ساقية
عدد 7	عدد 172	عدد 7



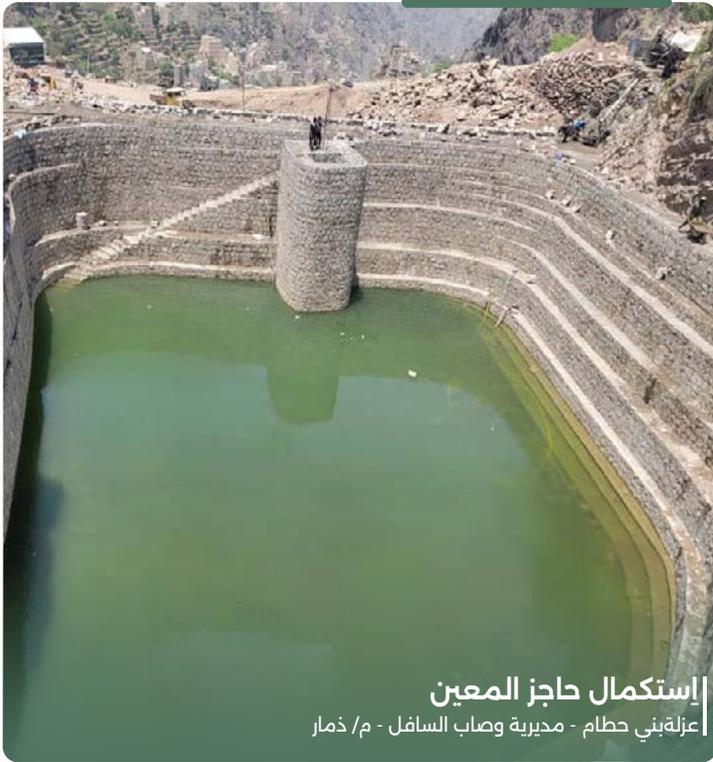

إستكمال حاجز المعين
عزلة بني حطام - مديرية وصاب السافل - م/ ذمار



إستكمال حاجز المعين
عزلة بني حطام - مديرية وصاب السافل - م/ ذمار



إستكمال حاجز المعين
عزلة بني حطام - مديرية وصاب السافل - م/ ذمار



إستكمال حاجز المعين
عزلة بني حطام - مديرية وصاب السافل - م/ ذمار




من واقع
الميدان



9

محافظات

البيضاء - تعز - مأرب - إب - حجة





خلاصة الوضع العام لمحافظة (البيضاء، تعز، مأرب، إب، حجة)

المستفيدين	عدد المشاريع	عدد المديريات	
55,120	21	11	البيضاء
59,653	18	4	تعز
2,650	1	1	مأرب
4,500	16	4	إب
62,751	21	8	حجة

184,674
مستفيد

77 مشروع
28 مديريات




2.282
مليار ريال



0 منجز
1 قيد التنفيذ
23 لم يبدأ
53 قيد الدراسة

حالة الإنجاز
العامة لمشاريع

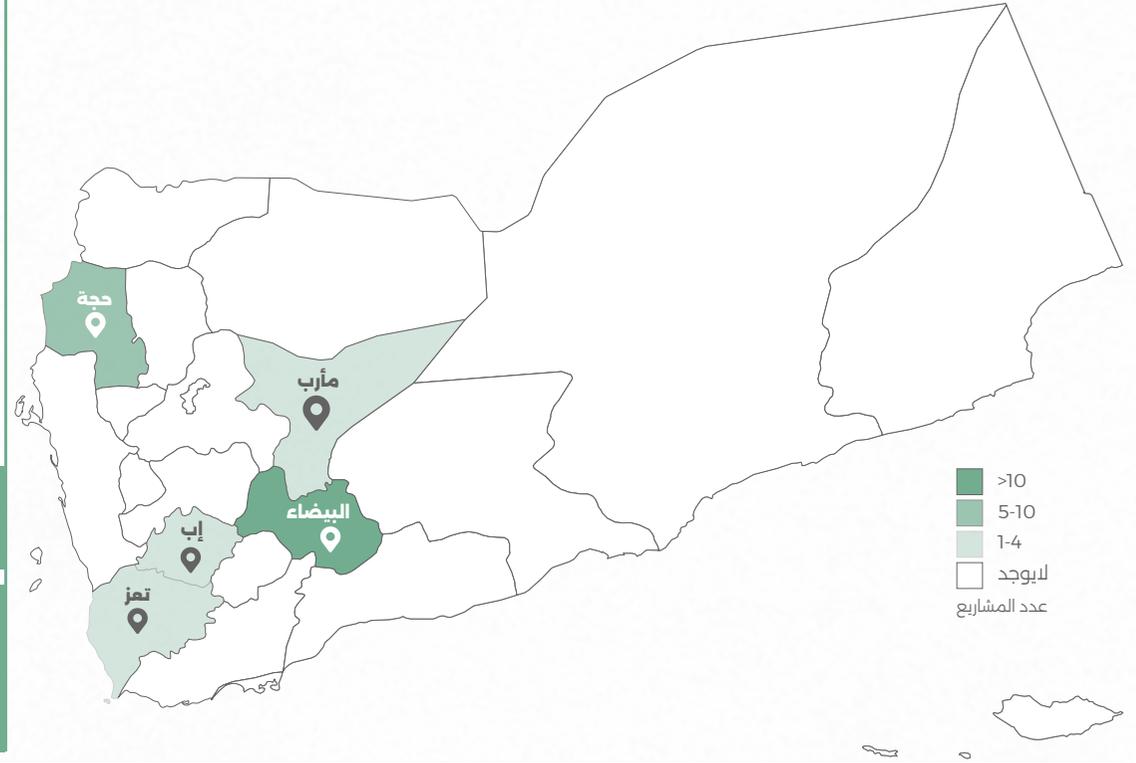

9.915
مليون متر مكعب

إجمالي السعة التخزينية

حماية أراضي زراعية	عدد الآبار	خزان حصاد / بركة	الأراضي الزراعية المستفيدة	حاجز سد
عدد 19	عدد 19	عدد 19	2,499 هكتار	عدد 19



ملحق
المصفوفات

م	المحافظة	المدرسة	العزلة	القرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين			البيانات الفنية للمشروع		نوع التدخل	نوع المشروع	الإجمالي العام للكلفة للمشروع	قيمة المساهمة			البيانات المالية			حالة المشروع				
						نسبة	م	م	إجمالي مساهمة وحدة التدخل	إجمالي مساهمة المجتمع				إجمالي مساهمة الجهات الأخرى	إجمالي مساهمة وحدة التدخل	إجمالي مساهمة المجتمع	إجمالي مساهمة الجهات الأخرى	إجمالي مساهمة وحدة التدخل	إجمالي مساهمة المجتمع		إجمالي مساهمة الجهات الأخرى	نسبة المصاريف	نسبة المصاريف	نسبة المصاريف
1	محافظة				حاجز الميمنية	2,000	4	7,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	4,109,700	1,153,509	2,832,900	123,291	1,120,000	0	100.00%	✓	✓	✓				
2	محافظة				حاجز المعين	2,100	10	10,549,260	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	10,549,260	2,458,080	7,774,702	316,478	2,230,100	0	100.00%	✓	✓	✓				
3	محافظة				حاجز قبيلش	1,000	13	28,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	39,263,085	7,203,397	30,879,795	1,777,893	6,938,100	0	100.00%	✓	✓	✓				
4	محافظة				حاجز خاشنة	750	10	30,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	14,806,250	2,719,312	11,644,750	444,188	2,674,500	0	100.00%	✓	✓	✓				
5	محافظة				حاجز الخنة	6,000	17	120,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	46,039,000	18,833,680	25,382,150	22,848,423	22,848,423	0	100.00%	✓	✓	✓				
6	محافظة				حاجز السطحة	4,500	17	94,966	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	74,850,347	15,295,512	51,395,275	1,659,600	8,468,900	13,336,432	67.47%	✓	✓	✓				
7	محافظة				حاجز فيران	5,000	13	149,290,500	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	149,290,500	29,257,175	115,554,630	4,478,715	21,336,925	8,120,250	39.00%	✓	✓	✓				
8	محافظة				حاجز الشبيخة - أم لبلى	1,000	11	80,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	8,977,740	7,875,525	474,683	6,919,522	956,000	56.62%	✓	✓	✓					
9	محافظة				حاجز أم حنجر	3,000	21	116,675,210	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	116,675,210	86,463,130	30,000,000	0	86,463,130	0.00%	✓	✓	✓					
10	محافظة				حاجز طين	5,400	11	40,461	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	148,244,295	28,680,500	115,116,466	4,447,329	26,929,500	100.00%	✓	✓	✓					
11	محافظة	مجنز			حاجز العديدين - بني شيف	10,000	16	24,664,000	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	24,664,000	11,472,550	10,788,255	2,403,195	11,472,550	91.00%	✓	✓	✓					
12	محافظة				حاجز كريف فلة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	18.00%	✓	✓	✓					
13	محافظة				حاجز الحق والتم	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
14	محافظة				حاجز الشبيخة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
15	محافظة	مجنز			حاجز التيزر	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
16	محافظة				حاجز نوع الحجد	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
17	محافظة				بحيرة المشنة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
18	محافظة				حاجز شوكان	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
19	محافظة				حاجز البطة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
20	محافظة				حاجز الموصة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
21	محافظة	قطنا			حاجز المشهور	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
22	محافظة				حاجز فيران	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
23	محافظة				حاجز كريف فلة	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
24	محافظة				حاجز الممثل	-	-	-	توزيع واكتفاء	حاجز زكائي	-	-	-	-	-	0.00%	✓	✓	✓					
25	محافظة	الصفراء			حاجز كتي	7,000	15	240,000	حاجز زكائي	حاجز زكائي	65,069,066	17,319,490	32,854,360	14,895,216	13,373,500	100.00%	✓	✓	✓					
26	محافظة				حاجز صليحة حاجر امدار	7,000	10	4,964,175	حاجز زكائي	حاجز زكائي	14,314,760	4,964,175	9,127,825	422,760	2,665,000	100.00%	✓	✓	✓					
27	محافظة				حاجز الازمات تحت سطحي وتحتوي	1,500	9	13,583,285	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	168,363,285	13,583,285	37,000,000	19,317,300	11,204,598.5	18.50%	✓	✓	✓					
28	محافظة				حاجز سطحي	2,000	4	4,401,870	توزيع واكتفاء	حاجز سطحي	13,539,000	4,401,870	8,536,960	400,170	4,244,000	100.00%	✓	✓	✓					
29	محافظة				حاجز تحت سطحي	5	5	8,361,100	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	3,260,829	8,361,100	4,849,438	250,833	3,100,000	100.00%	✓	✓	✓					
30	محافظة				حاجز التمام	1,800	9	21,419,880	حاجز التمام	حاجز التمام	21,419,880	7,316,870	13,440,634	642,596	6,414,000	54.00%	✓	✓	✓					
31	محافظة				حاجز غزوة وادي عكاوي	-	-	-	حاجز غزوة وادي عكاوي	حاجز غزوة وادي عكاوي	5,459,080	1,112,000	3,457,080	112,000	1,112,000	100.00%	✓	✓	✓					
32	محافظة				حاجز الازمات ١٧	-	-	-	حاجز الازمات ١٧	حاجز الازمات ١٧	4,270,249	1,520,261	2,749,989	0	1,520,261	0.00%	✓	✓	✓					
33	محافظة				حاجز العارضة السفلى رقم ١٩	-	-	-	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	7,291,623	2,656,869	4,634,755	0	2,656,869	0.00%	✓	✓	✓					
34	محافظة				حاجز أم حنجر - حوض صليحة عكاوي	1,500	12	17,500	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	35,232,180	11,668,350	23,563,500	6,743,350	4,925,000	28.00%	✓	✓	✓					
35	محافظة	الصفراء			حاجز كريف فلة	35,000	15	45,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	45,000	15,000	30,000	0	0	0.00%	✓	✓	✓					
36	محافظة				حاجز كريف فلة	7	7	81,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	47,425,049	14,787,377	32,637,672	0	14,787,377	0.00%	✓	✓	✓					
37	محافظة				حاجز الازمات الأعلى	-	-	-	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	774,244,585	174,244,585	174,244,585	0	174,244,585	0.00%	✓	✓	✓					
38	محافظة				حاجز وادي التمام	200	11	25,500	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	348,489,170	72,379,636	48,801,687	0	23,577,949	0.00%	✓	✓	✓					
39	محافظة				حاجز وادي حصصين	200	7	95,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	56,795,122	26,821,490	29,973,632	0	26,821,490	0.00%	✓	✓	✓					
40	محافظة				حاجز أم حنجر	8,000	18	92,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	97,799,000	37,668,379	53,689,249	35,703,500	1,964,879	85.00%	✓	✓	✓					
41	محافظة				حاجز أم حنجر	30,000	14	160,422,215	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	77,940,430	82,481,786	0	0	77,940,430	0.00%	✓	✓	✓					
42	محافظة				حاجز أم حنجر	5,000	6	47,208,927	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	13,440,673	31,868,254	0	0	13,440,673	0.00%	✓	✓	✓					
43	محافظة				حاجز أم حنجر	8,000	20	250,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	68,440,000	13,845,440	52,479,764	2,114,796	10,919,000	100.00%	✓	✓	✓					
44	محافظة				حاجز أم حنجر	4,500	16	36,633,495	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	11,668,307	36,633,495	24,066,183	1,099,005	6,365,500	36.00%	✓	✓	✓					
45	محافظة				حاجز أم حنجر	2,500	19	9,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	76,940,019	30,424,125	43,234,527	2,851,367	28,999,125	13.33%	✓	✓	✓					
46	محافظة				حاجز أم حنجر	1,400	6	2,888	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	2,888	6	2,888	0	0	0.00%	✓	✓	✓					
47	محافظة				حاجز أم حنجر	800	6	1,593	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	1,593	6	1,593	0	0	0.00%	✓	✓	✓					
48	محافظة				حاجز وادي حنجر	2,500	12	47,662	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	105,014,299	46,869,437	58,144,861	0	46,869,437	0.00%	✓	✓	✓					
49	محافظة				حاجز وادي حنجر	2,000	12	110,298	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	12,229,817	56,849,217	6,849,217	0	56,849,217	0.00%	✓	✓	✓					
50	محافظة				حاجز وادي حنجر	2,000	11	43,186	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	50,779,442	17,309,043	33,470,399	0	17,309,043	0.00%	✓	✓	✓					
51	محافظة				حاجز وادي حنجر	500	6	6,465	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	18,602,216	6,483,278	12,118,938	0	6,483,278	0.00%	✓	✓	✓					
52	محافظة				حاجز وادي حنجر	3,000	9	5,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	25,839,114	8,385,626	17,453,488	0	8,385,626	0.00%	✓	✓	✓					
53	محافظة				حاجز وادي حنجر	12	12	9,841	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	52,900,371	17,770,519	34,729,852	0	17,770,519	0.00%	✓	✓	✓					
54	محافظة				حاجز وادي حنجر	9	9	23,183	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	32,677,406	11,136,422	21,146,784	0	11,136,422	0.00%	✓	✓	✓					
55	محافظة				حاجز وادي حنجر	6,000	15	24,977,435	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	24,977,435	5,092,074	19,885,380	0	5,092,074	0.00%	✓	✓	✓					
56	محافظة				حاجز وادي حنجر	15,000	15	33,320	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	88,470,266	30,082,480	58,387,786	0	58,387,786	0.00%	✓	✓	✓					
57	محافظة				حاجز وادي حنجر	800	-	-	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	11,600,018	2,682,754	8,925,264	0	2,682,754	0.00%	✓	✓	✓					
58	محافظة				حاجز وادي حنجر	2,000	-	-	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	17,386,648	4,301,558	13,085,089	0	4,301,558	0.00%	✓	✓	✓					
59	محافظة				حاجز وادي حنجر	5,439	28	500,000	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	14,495,754	4,500,000	38,034,464	45,000,000	0	100.00%	✓	✓	✓					
60	محافظة	سبأ			حاجز وادي حنجر	1,000	21	49,652	حاجز تحت سطحي	حاجز تحت سطحي	1													

م	المحافظة	المديرية	البلدية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	مبلغ	نسبة التغطية	البيانات الفنية للمشروع		نوع التدخل	نوع المشروع	نوع الترخيص		نوع التمويل		نوع الترخيص		نوع التمويل		
								نوع الترخيص	نوع التمويل			نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل			
								نوع الترخيص	نوع التمويل			نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل			
المساهمة		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		
م	المحافظة	المديرية	البلدية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	مبلغ	نسبة التغطية	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	نوع الترخيص	نوع التمويل	
74				زنان المصنعة	25	6.631.376	13.26.275	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	758	8	25	13.26.275	0	0
75				زنان قسم السحب	22	2.159.701	431.940	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	194	7	22	431.940	0	0
76				زنان قسم السوق	40	16.007.936	3.201.587	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	819	6	40	3.201.587	0	0
77				زنان المصطل	35	5.518.379	1.103.676	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	176	6	35	1.103.676	0	0
78				زنان الحديقة	20	11.533.193	2.270.639	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	470	8	20	2.270.639	0	0
79				زنان الصلابة بنى حفر	25	4.337.786	1.084.444	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	178	6	25	1.084.444	0	0
80				زنان الميراث	170	10.722.744	2.034.549	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	1.502	7	170	2.034.549	0	0
81				زنان الحديقة	130	27.142.867	5.428.573	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	910	8	130	5.428.573	0	0
82				زنان الصلابة	20	20.074.802	4.014.960	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	779	7	20	4.014.960	0	0
83				زنان الصلابة	143	29.591.546	5.918.309	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	1.047	8	143	5.918.309	0	0
84				زنان نيتة مياس	170	20.751.081	4.150.212	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	743	7	170	4.150.212	0	0
85				زنان الحماض	170	15.206.674	3.041.375	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	643	7	170	3.041.375	0	0
86				زنان القرض السافل	147	3.700.489	740.098	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	286	6	147	740.098	0	0
87				زنان الصلابة	135	11.958.633	2.391.767	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	187	6	135	2.391.767	0	0
88				زنان سلة الجوز	185	2.550.026	510.026	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	98	5	185	510.026	0	0
89				زنان الهدى	28	24.002.243	4.820.444	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	571	8	28	4.820.444	0	0
90				زنان الهدى	160	19.922.543	3.988.509	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	476	8	160	3.988.509	0	0
91				زنان الهدى ٢	145	23.685.673	4.737.135	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	653	8	145	4.737.135	0	0
92				زنان الهدى	110	9.566.852	1.913.370	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	1.775	9	110	1.913.370	0	0
93				زنان الهدى	23	412	628.615	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	412	8	23	628.615	0	0
94				زنان باهل	21	3.698.479	739.696	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	339	5	21	739.696	0	0
95				زنان الهدى	25	22.249.586	4.449.917	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	891	8	25	4.449.917	0	0
96				زنان الهدى	23	15.790.296	3.947.374	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	798	8	23	3.947.374	0	0
97				زنان الهدى	22	19.695.347	3.939.077	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	833	7	22	3.939.077	0	0
98				زنان الهدى	27	6.580.369	1.316.074	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	151	6	27	1.316.074	0	0
99				زنان الهدى	27	3.403.887	680.777	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	182	8	27	680.777	0	0
100				زنان الهدى	21	2.033.316	406.663	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	138	4	21	406.663	0	0
101				زنان الهدى	26	4.399.111	879.822	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	468	8	26	879.822	0	0
102				زنان الهدى	25	5.484.299	1.096.860	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	619	8	25	1.096.860	0	0
103				زنان الهدى	37	15.283.936	3.056.787	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	555	3	37	3.056.787	0	0
104				زنان الهدى	29	5.279.840	1.055.968	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	232	9	29	1.055.968	0	0
105				زنان الهدى	23	6.857.361	1.374.341	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	744	4	23	1.374.341	0	0
106				زنان الهدى	30	8.526.995	1.785.399	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	627	7	30	1.785.399	0	0
107				زنان الهدى	23	16.509.693	3.301.939	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	378	7	23	3.301.939	0	0
108				زنان الهدى	300	3.132.784	626.557	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	31	3	300	626.557	0	0
109				زنان الهدى	18	7.070.672	1.414.134	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	862	10	18	1.414.134	0	0
110				زنان الهدى	15	5.258.029	1.051.606	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	704	8	15	1.051.606	0	0
111				زنان الهدى	22	6.835.835	1.367.167	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	1.001	8	22	1.367.167	0	0
112				زنان الهدى	288	6.648.700	1.329.740	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	659	6	288	1.329.740	0	0
113				زنان الهدى	27	4.591.819	918.364	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	515	7	27	918.364	0	0
114				زنان الهدى	22	2.075.379	518.379	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	162	6	22	518.379	0	0
115				زنان الهدى	20	4.825.237	965.047	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	447	7	20	965.047	0	0
116				زنان الهدى	24	5.138.161	1.027.632	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	323	5	24	1.027.632	0	0
117				زنان الهدى	20	4.440.268	888.054	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	379	6	20	888.054	0	0
118				زنان الهدى	18	5.137.337	1.027.467	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	343	6	18	1.027.467	0	0
119				زنان الهدى	40	3.980.941	796.188	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	704	6	40	796.188	0	0
120				زنان الهدى	24	3.392.045	678.409	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	38	4	24	678.409	0	0
121				زنان الهدى	19	1.562.554	312.511	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	53	5	19	312.511	0	0
122				زنان الهدى	29	6.759.496	1.351.899	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	284	7	29	1.351.899	0	0
123				زنان الهدى	28	5.984.630	1.196.966	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	665	10	28	1.196.966	0	0
124				زنان الهدى	27	5.120.580	1.024.116	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	450	8	27	1.024.116	0	0
125				زنان الهدى	26	2.756.198	551.240	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	54	4	26	551.240	0	0
126				زنان الهدى	18	6.302.780	1.260.556	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	383	5	18	1.260.556	0	0
127				زنان الهدى	29	2.587.925	517.585	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	70	7	29	517.585	0	0
128				زنان الهدى	22	1.096.648	219.330	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	53	3	22	219.330	0	0
129				زنان الهدى	20	5.242.931	1.048.586	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	603	5	20	1.048.586	0	0
130				زنان الهدى	18	10.364.947	2.072.909	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	764	11	18	2.072.909	0	0
131				زنان الهدى	21	1.320.976	264.195	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	474	8	21	264.195	0	0
132				زنان الهدى	19	5.320.143	1.064.029	0	0	استكمال	استكمال	زنان	حصص مياه	المنظر	101	7	19	1.064.029	0	0
133				زنان الهدى	220	61.688.903	12.297.781	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	3.773	11	220	12.297.781	0	0
134				زنان الهدى	26	1.229.847	245.969	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	115	7	26	245.969	0	0
135				زنان الهدى	25	2.004.652	400.930	0	0	توزيع	تأهيل	زنان	حصص مياه	المنظر	279	7				

م	المحافظة	المدينة	المنطقة	الطريق	اسم المشروع	عدد المستفيدين	البيانات الفنية للمشروع		نوع التدخل	نوع المشروع	الإجمالي العام للتكلفة للمشروع	قيمة المساهمة			البيانات المالية			تاريخ الإنجاز	نسبة الإنجاز %
							تسعة الخريف	تسعة الربيع				إجمالي مساهمة وحدة التدخلات	إجمالي مساهمة المجتمع	إجمالي مساهمة وحدة التدخلات	إجمالي مساهمة وحدة التدخلات	إجمالي مساهمة وحدة التدخلات	إجمالي مساهمة وحدة التدخلات		
164	خمارة	مغرب عنس	بنى طيبة	بنى طيبة	خزان العذبة	23	7	803	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	11,500,199	2,300,040	9,200,159	2,300,040	0	0	2,300,040	0.00%	
165			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان قسم البرك	33	7	915	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	6,584,890	5,267,912	1,316,978	0	0	1,316,978	0.00%		
166			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان شعب القرني	26	6	403	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	9,019,896	1,803,979	7,215,917	0	0	1,803,979	0.00%		
167			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان التلسة 1	28	5	95	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	4,754,041	946,808	3,797,233	0	0	946,808	0.00%		
168			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان المجرارة	24	7	509	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	10,109,890	8,087,912	2,021,978	0	0	2,021,978	0.00%		
169			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان الترسبة	26	9	451	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	10,288,531	8,236,665	2,051,866	0	0	2,051,866	0.00%		
170			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان شعب الولي	41	9	1,407	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	7,298,625	1,459,725	5,838,900	0	0	1,459,725	0.00%		
171			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان ضم الفيل	26	8	1,138	توزيع وتأهيل	استكمال	6,210,996	1,242,199	4,968,796	0	0	1,242,199	0.00%		
172			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان راس الاتعاع	23	9	1,232	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	5,486,015	1,097,203	4,388,812	0	0	1,097,203	0.00%		
173			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان التلسة 2	26	8	738	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	19,923,306	3,984,661	15,938,645	0	0	3,984,661	0.00%		
174			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان راس الاتعاع 2	20	9	1,018	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	4,249,591	849,918	3,399,672	0	0	849,918	0.00%		
175			بنى طيبة	بنى طيبة	خزان الخارية 2	42	8	800	خزان تصدق مياه الأمطار	توزيع وتأهيل	7,343,596	1,468,719	5,874,877	0	0	1,468,719	0.00%		
176			عزقة بيت نصر	عزقة بيت نصر	بركة الشعب	50	6	521	بركة	استكمال	7,451,231	1,486,231	5,964,925	0	0	1,486,231	0.00%		
177			عزقة بيت نصر	عزقة بيت نصر	خزان طرف المناس	20	10	827	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	18,893,985	3,778,797	15,115,188	0	0	3,778,797	0.00%		
178			عزقة بيت نصر	عزقة بيت نصر	بركة الهادي	4	4	502	بركة	استكمال	15,923,502	3,184,700	12,738,802	0	0	3,184,700	0.00%		
179			عزقة بيت نصر	عزقة بيت نصر	خزان غير المسطحة	200	3	141	توزيع وتأهيل	استكمال	7,592,715	1,478,543	5,914,171	0	0	1,478,543	0.00%		
180			موشك	موشك	خزان البرجة الحيمة	19	6	315	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	8,190,397	1,638,079	6,552,318	0	0	1,638,079	0.00%		
181			موشك	موشك	خزان جرف محرق	21	4	247	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	4,727,763	945,553	3,782,210	0	0	945,553	0.00%		
182			موشك	موشك	خزان المجدل	26	6	166	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	6,946,012	1,389,202	5,556,809	0	0	1,389,202	0.00%		
183	خمارة	مغرب عنس	موشك	موشك	خزان النسي للكتبة	25	6	183	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	7,129,834	1,425,967	5,703,868	0	0	1,425,967	0.00%		
184			موشك	موشك	خزان المجران للكتبة	50	6	203	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	8,572,519	1,714,504	6,858,016	0	0	1,714,504	0.00%		
185			موشك	موشك	خزان مسجد الكتبة	200	4	1,971	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	4,075,616	815,123	3,260,493	0	0	815,123	0.00%		
186			موشك	موشك	الخزان الكبير عام	200	6	1,527	خزان تصدق مياه الأمطار	استكمال	9,286,251	1,857,250	7,429,001	0	0	1,857,250	0.00%		
الإجمالي الكلي لمحافظة خمارة																			
5.17%	7	178	1	0	388,128,697	9,500,000	22,288,200	1,510,034,907	397,628,697	1,929,951,803	-	281,917	-	19,946	186				
0.00%					12,172,015	0	0	19,647,260	12,172,015	31,819,275		3,109	11	1,900	إشباع حاجر ذي مشرف	ذي مشرف	الانعام		
0.00%					7,412,956	-	0	14,599,448	7,412,956	22,012,404		4,480	5	3,000	إشباع حاجر الخيرة	الخيرة	جبل الحياي		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	-	خزان مياه في منطقة المعاني	-	المعاني		
0.00%					-	-	0	-	-	-		39,811	16.5	-	تصليح حاجر التجهيز	-	نجد الجمالي		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة الحفجار	الحفجار - ميم الظاهر	رعاش			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة الصخرة حدقات	الصخرة حدقات	صخر			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة بني عامر	بني عامر	الخال			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة اللخمين	اللخمين	الغصان			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة طائف	طائف	وادي ضياء			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة الدمن	الدمن	العالي			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة ذي النود	ذي النود	ذي النود			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة ريدة	ريدة	ريدة وريد			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي في غربة السيف	السيف	السيف			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة السبد	السبد	السبد			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	إشباع حاجر مالي لغربة عمال	عمال	خوة			
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	صيانة وتوزيع خزان العبر بمدينة القعدة	جبل العبر	صيانة وتوزيع			
الإجمالي الكلي لمحافظة إب																			
0.00%	14	2	0	0	19,584,971	0	0	34,246,708	19,584,971	53,831,679	-	47,400	-	4,500	16				
15.00%					66,679,150	0	0	177,528,307	66,679,150	186,205,357		104,900	22	6,000	إشباع حاجر زمكان	مكمان	جبل المسدق		
0.00%					101,452,875	0	0	300,650,885	101,452,875	402,103,760		1,570,000	0	20,000	إشباع حاجر التمسدة	الزنج	المطبقسة		
0.00%					-	-	0	-	-	-		223,080	19	2,882	حاجر وادي جبل - نواجيل	المناجيل	أسلم الشام		
0.00%					-	-	0	-	-	-		894,855	18	1,600	حاجر وادي النوق - حاجون	الصفا	أسلم		
0.00%					-	-	0	-	-	-		400,000	16	2,549	حاجر الشبق - المرازق - بني عامر	المرازق - بني عامر	أسلم الوسط		
0.00%					-	-	0	-	-	-		35,456	15	970	حاجر المعاوله - وادي العين	المعاوله	أسلم		
0.00%					10,986,100	0	0	43,298,175	10,986,100	54,284,275		-	-	-	حماية الأراضي الزراعية بوادي نرس	-	نرس		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	5	-	حاجر تحت سطحي	الرفقة	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	5	-	حاجر تحت سطحي	الرفقة	بني مسعود		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	5	-	حاجر تحت سطحي وادي شهر رقم (1)	الرفقة	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	6	-	حاجر تحت سطحي المصراوت رقم (7)	المخيل	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	5	-	حاجر تحت سطحي الداجر	الداجر	السمرى		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	6	-	حاجر تحت سطحي الخشامة (1)	الخشامة	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	6	-	حاجر تحت سطحي بني عبد رقم (9)	هقق	هقق		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	5	-	حاجر تحت سطحي بني عبد رقم (8)	بني عبد	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	-	معالجة انجرار السوسل وحماية الأراضي الزراعية في وادي نثار	-	-		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	-	-	معالجة انجرار السوسل وحماية الأراضي الزراعية في وادي بني العزيز	ليادة	بني نثار		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	23	1,300	حاجر غارب زاهر	ضاعتن	سبت الضاه		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	18	1,800	حاجر المصور	المصور	بني حنن		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	14	650	حاجر الخشامة	الخشامة	الاشارة		
0.00%					-	-	0	-	-	-		-	24	25,000	حاجر وادي زيد - التوفلة	مضاب	أعد اليمن		
4.35%	18	3	0	0	181,116,125	0	0	461,477,267	181,116,125	642,593,392	-	3,235,240	-	62,751	21				
الإجمالي الكلي لجميع المحافظات																			
22.13%	131	266	61	28	4,653,513,504	1,101,989,567	1,261,536,391	9,388,401,793	5,856,027,551	16,513,834,026	-	26,213,225	-	916,377	486				

خارطة برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م





الجمهورية العربية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفيّة
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U



الجمهورية العربية
وزارة المالية
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U



الجمهورية اليمنية

وَدَارَةُ الْمُنَايَسَةِ | وِدَارَةُ الْإِدَارَةِ وَالتَّنْمِيَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالرَّشِيدِ

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U

781010777

@cediuye

@cediu_ye

info@cediu.gov.ye



جميع الحقوق محفوظة © وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية | هاتف: +967 781010777

فاكس: +967 (1) 470960
