

2
عاما
من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit



C E D I U
الجمهورية اليمنية

برنامج دعم المساهمات في توسعة
وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر
2024

وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

عَامًا من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U



الجمهورية العربية الفلسطينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

وَلَا تَلْمِزْهُمَا
وَلَا تُنَادِيَهُمَا
بِأَسْمَاءٍ
مَّا سَمِعْتَهُمَا
يَاكْفُرُ
بِاللَّهِ
فَمَنْ يَكْفُرْ
بِاللَّهِ
فَبِئْسَ مَا يَكْفُرُ
بِهِ



حرية واستقلال

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit



C E D I U الجمهورية اليمنية

وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
— للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

مديرية معين - شارع الرباط - خلف مكتبة القلم الذهبي

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية

تلفون: 781010777

فاكس: 01 470960

البريد الإلكتروني: info@cediu.gov.ye

الموقع على شبكة الانترنت: @cediu_ye

جميع حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة © وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة



بسم الله الرحمن الرحيم،

“إن تطوير البنية التحتية وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في كافة المناطق بما في ذلك المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً، هو واجبنا الأول، حيث نحرص على أن يكون لجميع أبناء الوطن نصيب من التنمية والتقدم وكذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية وتيسير الحركة والتنقل هو أساس الازدهار في المجتمعات، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ذلك. نشكر كل من يساهم في هذه المشاريع ويدعم نجاحها، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة شعبنا وبلدنا.”



السيد العلم/

عبدالمك بدر الدين الحوثي

— "يحفظه الله"



**فخامة الأخ الرئيس/
مهدي محمد المشاط**
رئيس المجلس السياسي الأعلى

“في إطار حرصنا على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة لكافة المناطق، وخاصة الريفية المحرومة من خلال تنفيذ مشاريع الطرق ، حيث تعد هذه المشاريع خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حياة المواطنين
لقد حرصنا على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لضمان تنفيذ المشاريع لإغلاق فجوة التنمية بهذه المناطق، ونسعى دائماً لتحقيق الأهداف المرجوة. ونعاهد الله وأبناء وطننا أن نظل على درب البناء والتطوير، متطلعين إلى غدٍ مشرقٍ يضمن لجميع مواطنينا حياةً كريمةً ومزدهرةً.”

◀ **إن برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية ليس فقط مشروعاً لتحسين وتوسعة الطرق، بل هو أداة لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، وهو يمثل تحدياً وفرصةً لنا جميعاً للعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سبل العيش للمجتمعات الريفية. نعمل في البرنامج على التنسيق المستمر مع السلطات المحلية لتحديد أولويات المشاريع وتنفيذها بأفضل الطرق الممكنة، مع الالتزام بالجودة والاستدامة.**

إدارة الحركة وتنفيذ
مشاريع الطرق





برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية في سطور.....

نتيجةً لتوسع أعمال الوحدة، ظهر هذا البرنامج كإسهام من الوحدة في تفعيل مبدأ المشاركة والمساهمة بين كلٍ من وحدة التدخلات والسلطة المحلية والمجتمع، بحيث يتم المشاركة بين جميع الأطراف لرفع كفاءة تشغيل معدات السلطة المحلية.

فالبرنامج يعني بدعم ومساندة الجهات الحكومية (السلطة المحلية وغيرها) ذات الاختصاص من خلال المساهمة في تمويل وتشغيل وصيانة معداتها المملوكة لها لتنفيذ مشاريع تُسهم في تقليل الفجوة التنموية عبر توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية وتعزيز البنية التحتية في مجال الطرق للمناطق المحرومة الأكثر فقراً في مختلف المديريات والمحافظات، وبما يضمن التخفيف من معاناة المجتمع في المناطق الريفية والذي يغلب على طبيعتها الطبوغرافية الوعرة وصعوبة الوصول بين القرى بمراكز المديريات.



أهمية برنامج

دعم المساهمات في توسعة
وتحسين جودة خدمة الطرق
الريفية

يمثل برنامج دعم المساهمات في توسعة
وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة
والشاملة، حيث تتجلى أهميته في النقاط
التالية:

1 تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الريفية: يعد الوصول السهل والتمن إلى الطرق أحد أهم العوامل التي تؤثر على جودة الحياة، حيث يساعد على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الضرورية، مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، بشكل أسرع وأكثر أماناً.

2 تعزيز التنمية الاقتصادية: الطرق هي شريان النقل الذي يساهم في نقل المنتجات الزراعية والمحاصيل والبضائع، مما يدعم التجارة المحلية ويساهم في نمو الاقتصاد الريفي. تحسين الطرق الريفية يفتح فرصاً جديدة للمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة لتوسيع أعمالهم والتواصل مع الأسواق بسهولة.

3 تقليل تكاليف النقل: من خلال تحسين جودة الطرق وتوسعتها، يقلل البرنامج من تكاليف التنقل والنقل على السكان المحليين، مما يوفر وقتاً وجهذاً وموارد يمكن توجيهها نحو أنشطة أخرى تعود بالنفع على المجتمع.


4 دعم الاستقرار الاجتماعي: توفير بنية تحتية ملائمة يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال ربط المجتمعات الريفية بالمراكز الحضرية، وخلق بيئة تشجع الشباب والأسر على الاستقرار في مناطقهم، ما يساعد في الحد من الهجرة نحو المدن.

5 رفع مستوى السلامة والأمان على الطرق: تساهم الطرق المحسنة في تقليل الحوادث المرورية التي غالباً ما تحدث في الطرق الوعرة أو غير المؤهلة، مما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل من الحوادث والإصابات.

6 دعم التنمية المستدامة: تعتمد التنمية المستدامة على التوازن بين تنمية المدن وتطوير المناطق الريفية، والطرق الريفية هي عنصر أساسي لتحقيق هذا التوازن من خلال توفير البنية التحتية التي تعزز من قدرة المجتمعات الريفية على النمو المستدام.

7 تعزيز قدرة المؤسسات المحلية: يهدف البرنامج إلى بناء قدرات السلطات المحلية من خلال توفير المعدات والدعم اللازمين، ما يساعد على تحقيق اكتفاء ذاتي في صيانة الطرق، ويؤهل الكوادر المحلية لإدارة وتحسين البنية التحتية في المستقبل.

أهداف البرنامج



2

رفع مستوى البنية التحتية:
إنشاء وصيانة الطرق وفقاً لأعلى المعايير، بما يعزز من جودة الحياة ويسهم في التنمية الاقتصادية.

4

تخفيف التكاليف وزيادة الكفاءة:
توفير المعدات والدعم الفني المطلوب للجهات المحلية، مما يساهم في تقليل تكاليف الصيانة ويزيد من كفاءة المشاريع.

6

تحسين الحركة والتنقل:
تقليل الوقت والجهد للوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يحسن من ظروف العيش.

8

التنمية الاجتماعية:
توفير بيئة مناسبة تساهم في استقرار الأسر وتقديم فرص جديدة للشباب.

1

تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية:
المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية للمناطق المحرومة والمعزولة في مجال الطرق.

3

تعزيز الشراكات المحلية:
العمل مع السلطات المحلية لضمان أن المشاريع تتماشى مع احتياجات وأولويات المجتمعات المستهدفة.

5

تحقيق التنمية المتوازنة:
تعزيز التوازن التنموي بين المناطق الريفية والحضرية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

7

توفير فرص اقتصادية جديدة:
تسهيل نقل المنتجات الزراعية والبضائع، مما يعزز من اقتصاد المناطق الريفية.

9

رفع مستوى السلامة:
توفير طرق آمنة للمواطنين، مما يقلل من حوادث الطرق ويحسن من مستوى الأمان.

رؤية البرنامج

الإسهام في تحسين وضع المجتمعات المعزولة والأكثر فقراً وأشد احتياجاً من خلال تسيير الوصول إلى الخدمات الأساسية والأسواق لسكان المناطق الريفية والنائية والقرى المعزولة بأقل تكلفة وأقل زمن ممكن.



يسعى البرنامج إلى تقليل الفجوة التنموية المجتمعية في مجال خدمة الطرق الريفية من خلال دعم ومساندة السلطة المحلية في عمليات شق، مسح، تسوية، رصف، وتأهيل الطرق في المناطق المحرومة والأكثر حرماناً في مختلف المديرية والمحافظات.



رسالة البرنامج

المعايير الفنية

الإلتزام بمعايير تصميم وبناء الطرق، مثل العرض، والسماكة، واستخدام المواد المناسبة.



التقييم والمتابعة

وضع آليات لتقييم المشاريع بعد التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.



التمويل

تحديد مصادر التمويل المتاحة وشروطها.



الأهداف العامة

تحسين جودة الطرق الريفية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.



الإستدامة

ضمان أن تكون المشاريع مستدامة بيئياً واقتصادياً، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.



المشاركة المجتمعية

إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ لضمان تلبية احتياجاتهم.



المحددات العامة

لأعمال المشاريع في إطار البرنامج



مؤشرات القياس في إعتاد مشاريع البرنامج

1 معدل تحسين جودة الطرق

نسبة الطرق التي تم تحسينها أو إنشاؤها مقارنة بالطرق القائمة.

2 الوقت المستغرق للوصول

تقليل الوقت المستغرق للوصول للخدمات الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية.

4 مستوى السلامة المرورية

عدد الحوادث المرورية المسجلة قبل وبعد تنفيذ المشروع.

3 الإستخدام اليومي للطرق

قياس عدد المركبات أو الأفراد الذين يستخدمون الطرق المحسنة يوميا.

5 رضا المجتمع

إجراء استطلاعات رأي لقياس رضا السكان المحليين عن جودة الطرق والخدمة المرتبطة بها.

6 نسبة المشاركة المجتمعية

عدد المشاريع التي تم تنفيذها بمشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ.

7 التدريب والتأهيل

عدد الأفراد الذين تم تدريبهم في مجالات صيانة الطرق وإدارة المشاريع.

8 الإستدامة المالية

تقييم مدى قدرة المجتمعات المحلية على صيانة الطرق بعد انتهاء التمويل.

1 التخطيط والدراسة

- إجراء دراسات إحتياجات المجتمع لتحديد المشاريع ذات الأولوية.
- تحديد أولويات المشاريع بناء على المعايير الإقتصادية والإجتماعية.

4 التنفيذ الفعلي

5 المراقبة والتقييم

6 الصيانة المستدامة

7 التوثيق والتقارير

2 التصميم

- إعداد تصاميم هندسية للطرق بما يتناسب مع المعايير الفنية والهندسية.
- مراعاة الظروف المناخية والجغرافية للمناطق.

3 المشاركة المجتمعية

- جلسات أولية مع المجتمع لرسم صورة المشروع.
- تشكيل لجان محلية.

طبيعة التنفيذ لمشاريع البرنامج

حالات مساهمة الوحدة في البرنامج:

تنقسم مساهمة الوحدة في البرنامج إلى حالتين،
موضحة كما يلي:

الحالة الأولى (بحال
تسليم المعدة
للوحدة)، تتمثل
المساهمة بالتالي:

الحالة الثانية (بحال
كانت المعدة
بإشراف السلطة
المحلية)، تتمثل
المساهمة بالتالي:

1. توفير المواد العينية من المحروقات (وقود - زيوت - شحوم) اللازمة لتشغيل المعدات وفقاً للمصفوفات والخطط المعتمدة.
 2. توفير النفقات التشغيلية للمعدات وتشمل (مستحقات سائق المعدة - مستحقات المهندس المشرف على المعدة).
 3. التكفل بصيانة المعدات قبل أو بعد التشغيل بما يضمن رفع كفاءتها وإنتاجيتها.
1. إما بتوفير المواد العينية من المحروقات (وقود وزيوت، أو أحدهما) اللازمة لتشغيل المعدات وفقاً للمصفوفات والخطط المعتمدة.
 2. أو التكفل بصيانة المعدات قبل التشغيل بما يضمن رفع كفاءتها وإنتاجيتها.

مهام وإختصاصات البرنامج:

- إجراءات التدخلات التي يوجّه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى في مجال المساهمات في دعم توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية.
- استخدام الآلات والمعدات المتوفرة لدى السلطات المحلية بالمحافظات مقابل تحمّل تكاليف التشغيل والصيانة لتنفيذ وصيانة شبكة الطرق في المناطق المحرومة الأكثر إحتياجاً.
- إجراءات الدراسات والإحصاءات وتنفيذ المسوحات الخاصة بتحديد الأولويات حسب موجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبحسب طلبات الإحتياج المرفوعة من قبل السلطات المحلية في المديريات أو المحافظات.
- تقييم المساهمات العينية للشركاء وحثّ السلطة المحلية على العمل مع المجتمع.
- التنسيق مع الوحدات التنفيذية والجهات الحكومية في المجالات والأنشطة ذات العلاقات باختصاصها في مجال الطرق والتنمية الريفية.
- ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى والتي تقتضيها طبيعة نشاط البرنامج أو التي يتم التكليف بها وتدخل ضمن أهداف البرنامج.



شروط ومعايير تدخلات البرنامج:

1. التدخلات في المناطق والمساهمة في مشاريع الطرق التي يوجّه بها الأخ الرئيس تكون لها الأولوية.
2. أن يكون المشروع ضمن الأولويات التي تقرها الوحدة في مجال دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية وعلى مستوى كل محافظة أو جهة حكومية أو خدمية.
3. أن يمثل المشروع أولوية ناشئة عن خطة إحتياجه مرفوعة من قبل الجهات المعنية ممثلة بالسلطة المحلية في المديرية أو المحافظة لمنطقة من المناطق المحرومة والأكثر حرماناً والتي تفتقد لخدمات الطرق.
4. المناطق والمديريات ذات التضاريس شديدة الوعورة والتي بحاجة إلى تحسين وتوسعة شبكات الطرق فيها مع إمتلاك السلطة المحلية فيها لمعدات شق وإيراداتها لا تكفي لتغطية إحتياجات التشغيل (وقود - زيوت - شحوم... إلخ) فتتكفل الوحدة بنفقات تشغيل تلك المعدات.
5. المشاريع والطرق الرئيسية في المديريات والمحافظات التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، تقوم السلطة المحلية بالمساهمة في تكاليف الصيانة والتأهيل.
6. التدخلات والمشاريع التي تقرها الوحدة من خلال خطط تشغيل معدات السلطة المحلية التي تقوم الوحدة بتشغيلها وتمويلها وتعمل ضمن أسطولها.
7. أن يمثل الإحتياج المجتمعي تحقيق منفعة أو خدمة عامة للمجتمع والمنطقة المستهدفة من خلال توسعة الطريق القائم لمنع الحوادث أو تسيير الحصول على الخدمات الأساسية بأقل تكلفة وزمن ممكن.
8. تدهور وتعطل الطرق الريفية نتيجة حدوث كوارث أو ظروف خاصة.

التوزيع الجغرافي الأمثل حسب المحافظات والمناطق المستحقة وفقاً للمستويات والمؤشرات

1

تحليل البيانات الاقتصادية

تحديد المحافظات ذات المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، مثل الدخل المنخفض والبطالة.

2

تقييم مستوى الفقر

إستخدام مؤشرات الفقر لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً، مثل المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

3

الكثافة السكانية

التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان إستفادة سكان أكبر.

4

الأثر البيئي

مراعاة المناطق التي قد تتأثر سلباً من المشاريع لضمان الإستدامة البيئية.

5

تحليل البنية التحتية الحالية

دراسة حالة الطرق القائمة، وتحديد المناطق التي تعاني من انعدام أو ضعف البنية التحتية.



برنامج دعم المساهمات

في توسعة وتحسين جودة
خدمة الطرق الريفية

بالأرقام

المحافظات المستهدفة



إجمالي المحافظات المستهدفة | إجمالي المديريات المستهدفة





11 محافظة | 51 مديرية

إجمالي عدد المشاريع



194 مشروع

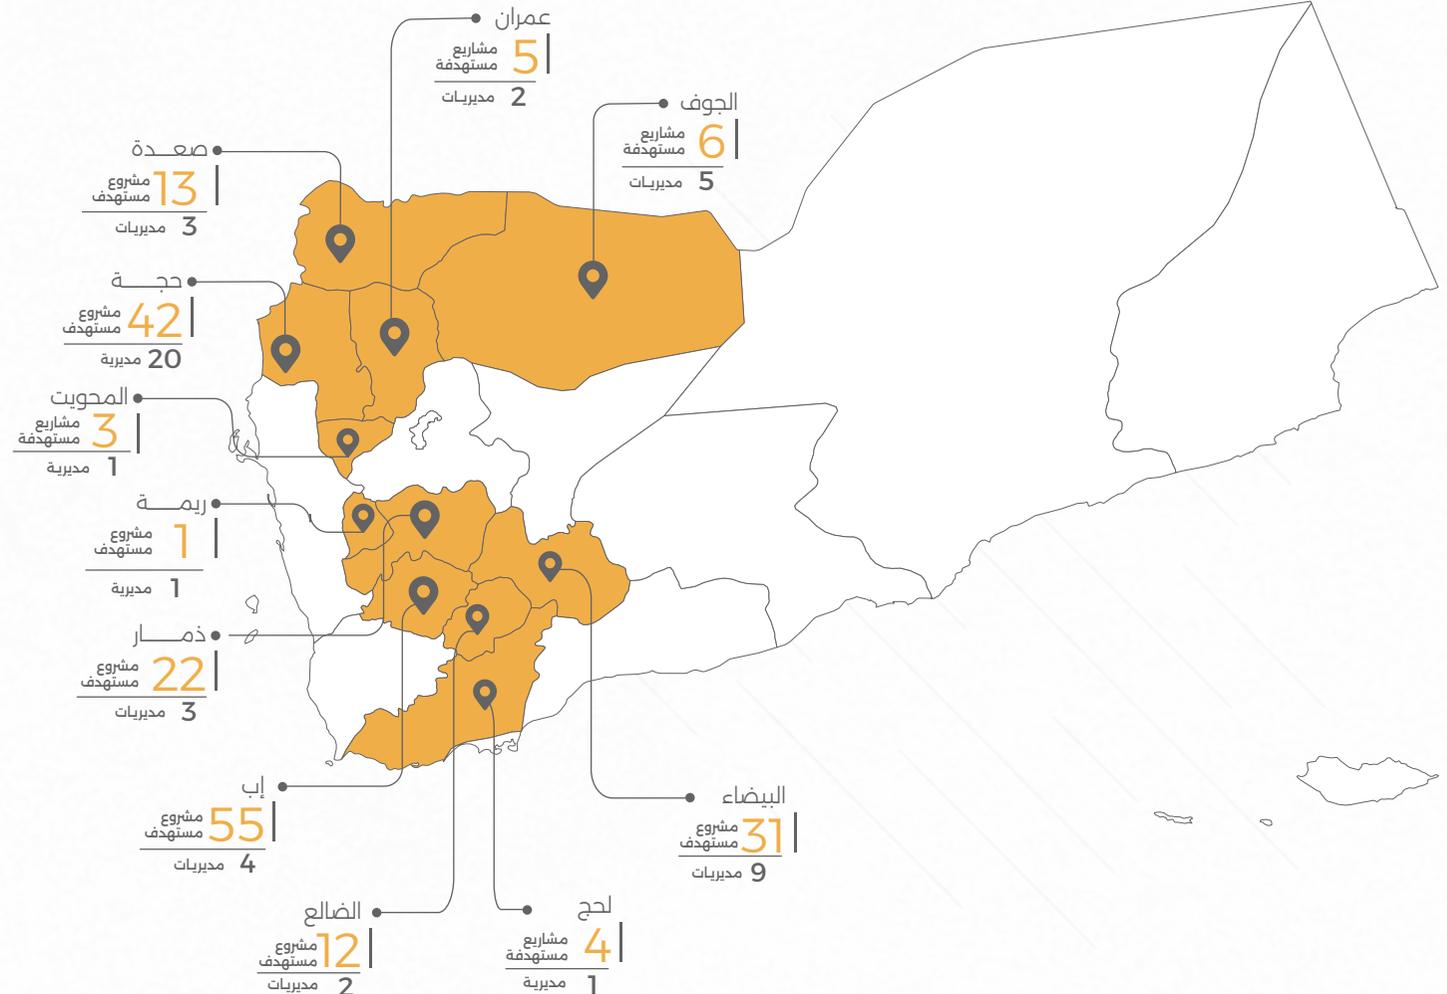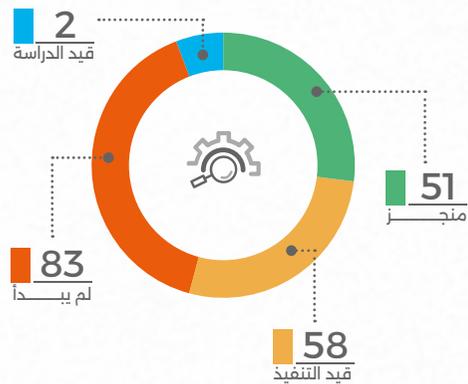



الإستهداف

يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مشروع من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند إستهداف أي مشروع أو مبادرة مجتمعية وقد أولت الوحدة الكثير من الإهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع من مشاريع مسح وتوسعة خدمة الطرق الريفية حيث بلغ عدد السكان المستفيدين المباشرين من المشاريع أكثر من (1,051,971) نسمة.



حيث بلغ
عدد المستفيدين

1,051,971
نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية

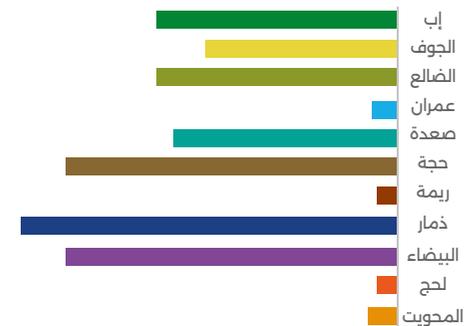


إجمالي تكلفة المشاريع



8,479,791,109

ريال

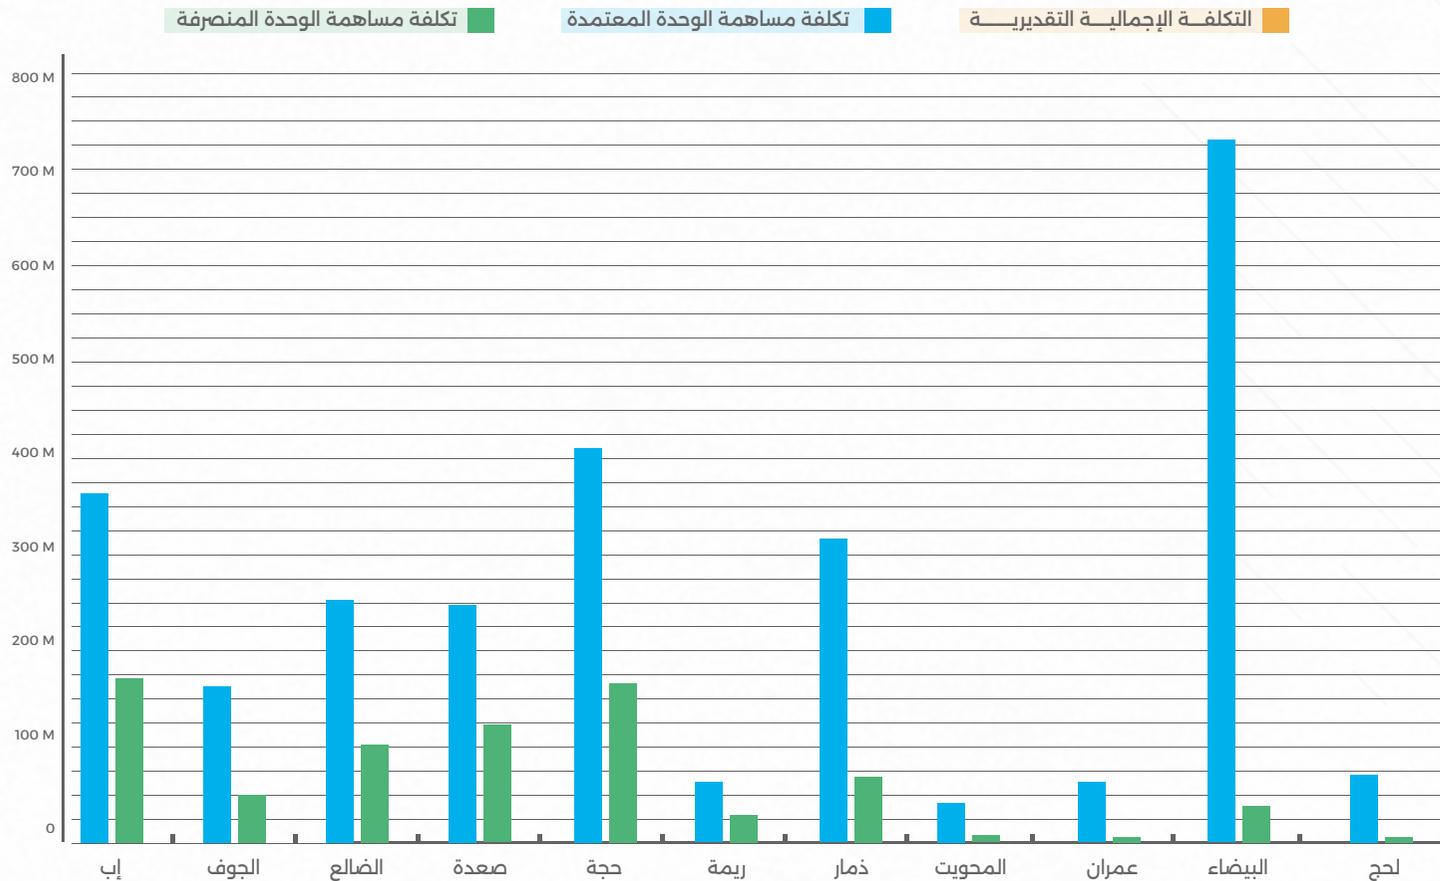

574.2

مليون ريال

إجمالي تكلفة مساهمة الوحدة المنصرفة

2.582

مليار ريال

إجمالي تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برعاية
فخامة المشير الركن / **بَهْدِي مُحَمَّدُ الشَّاطِط**
رئيس المجلس السياسي الأعلى

قام معالي الدكتور / **رشيد عبود أبو لحوم**
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية
واللواء / **هلال الصوفي** - محافظ محافظة حجة

بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في محافظة حجة بتكلفة تقديرية إجمالية (2,681,614,258) ريال

على أن يمولها من ميزانية حكومة الريف (الوطني) برفقة محافظ محافظة حجة اللواء/ هلال

أثناء قيام معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (في حكومة الريف الوطني) برفقة محافظ محافظة حجة اللواء/ هلال الصوفي والسلطة المحلية بالمحافظة والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المهندس شهاب الشامي بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بالمحافظة.

م	المجال	اسم المشروع	إجمالي عدد المشاريع	عدد المستفيدين	التكلفة التقديرية الإجمالية	مصدر التمويل		
						وحدة التدخلات المركزية السنوية	السلطة المحلية	
		الطارئة	المجتمع	ريال		ريال	ريال	
		(خلع ومسح وتوسعة) عدد (17) مشروع (مبادرة) في مجال الطرق بإجمالي طول (136.4) كم ضمن برنامج دعم مشاريع لتفعيل السلطة المحلية للترجمة الفعلية (شور) عدد (44) مشروع (مبادرة) في مجال الطرق بإجمالي طول (123) كم	17	138,335	691,678,242	263,005,058	0	421,673,184

محافظة حجة



خلاصة وضع الإنجاز

للمشاريع

في مختلف المحافظات



1

محافظة
إب

خلاصة الوضع العام لمحافظة إب



عدد المشاريع	عدد المستفيدين
52	72,157
1	30,000
1	-
1	-

المحافظة	عدد المشاريع
القفر	52
العدين	1
المشنة	1
ريف إب	1


102,157 مستفيد

55 مشروع

4 مديريات



563.3 مليون ريال

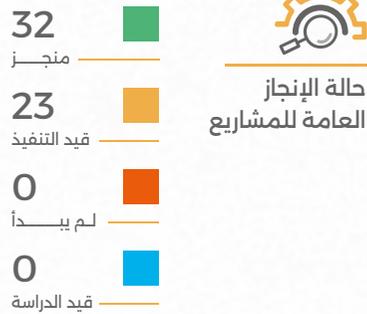

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

63.85%

أبعاد المشاريع المنجزة

97,800 إجمالي الطول المنجز متر

4 متوسط العرض المنجز متر



شق ومسح وتوسعة طريق الدميم حوار
مديرية القفر - م/إب



شق وتوسعة ومسح طريق الهباري
مديرية القفر - م/إب



مسح و توسعة طريق القابس الصبرة
مديرية القفر - م/إب



طريق القابس الحديدة روحاني
مديرية القفر - م/إب




رصيف خرساني طريق ثقيل بعدان
مديرية المشنة - م/إب



من واقع
الميدان



شق وتوسعة ومسح ورصف طريق الهباري
مديرية القفر - م/إب

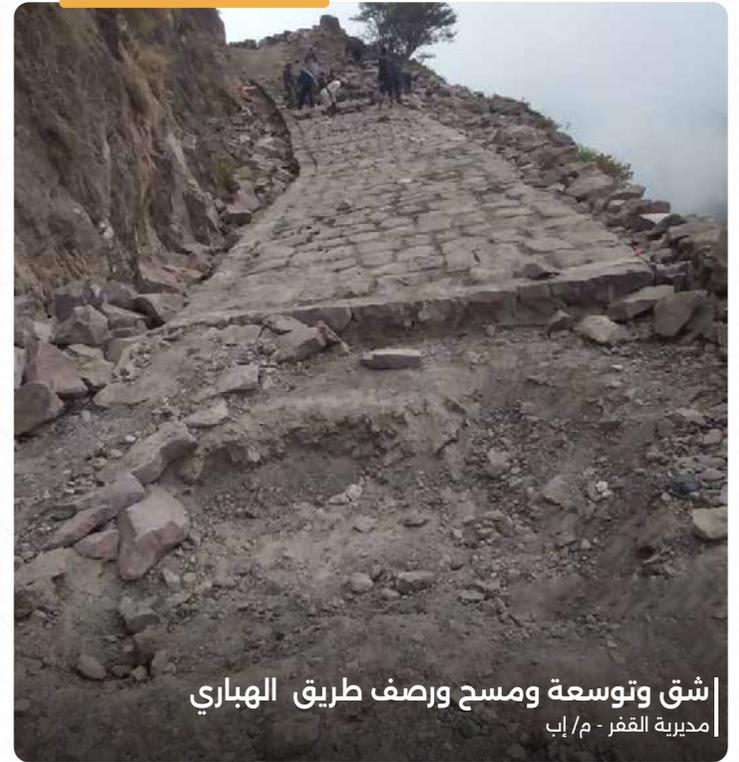

شق وتوسعة ومسح ورصف طريق الهباري
مديرية القفر - م/إب



شق وتوسعة ومسح وتصريف مياه قرية الصناعي الميهال جبل الروضة القمراء صمعيين
مديرية القفر - م/إب



شق وتوسعة ومسح طريق الهباري
مديرية القفر - م/إب





مشروع مسح و توسعة طريق المذاري الخربة الظهر الصنع


عزلة / بني سبأ - مديرية القفر - م / إب

مسارات مشاريع مديرية القفر



مسارات مشاريع دعم المساهمات في توسعة
و تحسين جودة خدمة الطرق الريفية

محافظة إب

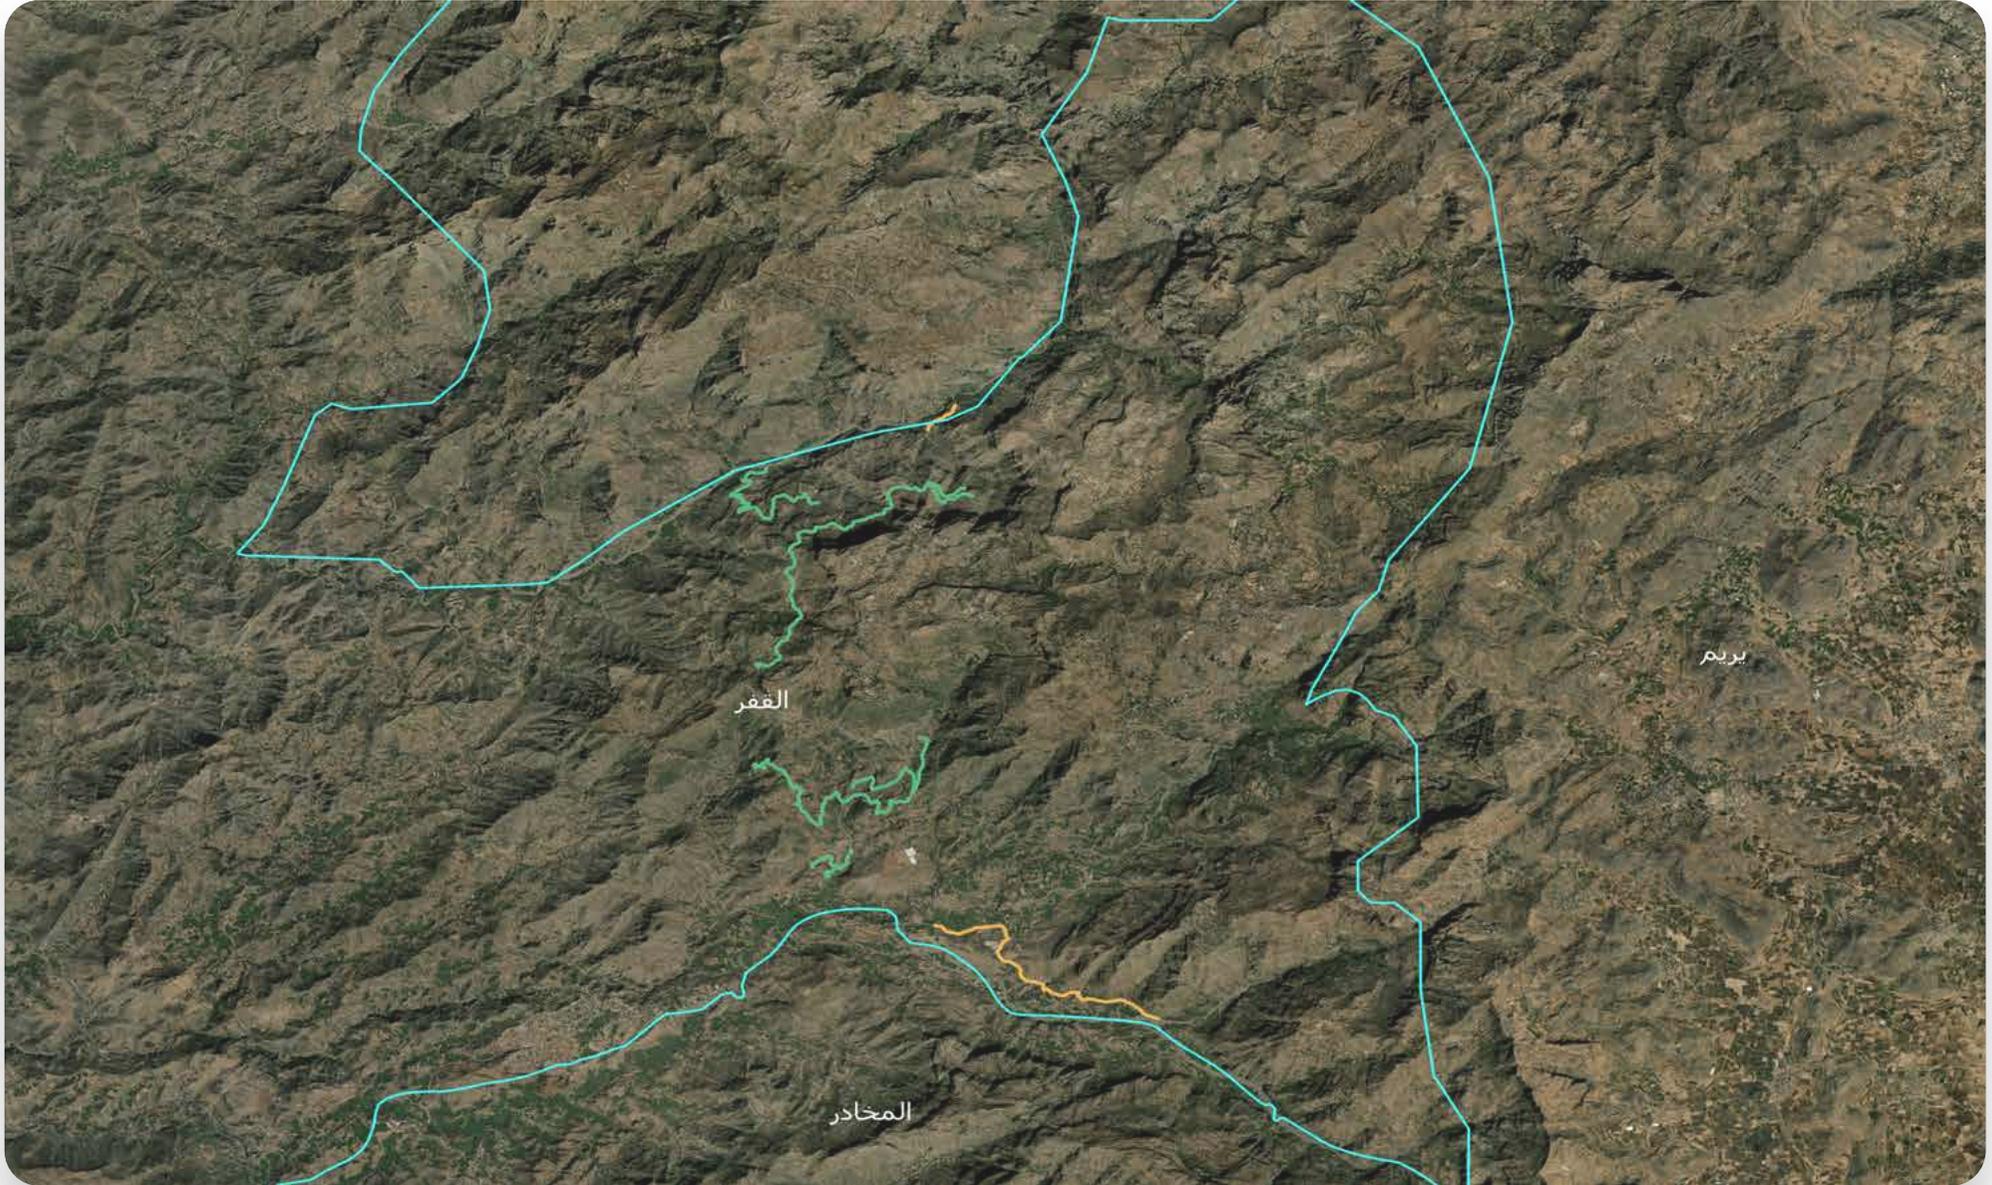

مسارات المشاريع

برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م




2

محافظة
الجوف



خلاصة الوضع العام لمحافظة الجوف

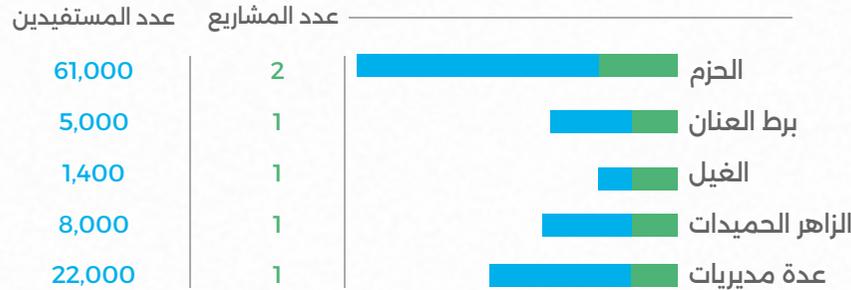


97,400 مستفيد

6 مشاريع

5 مديريات



1.728 مليار ريال

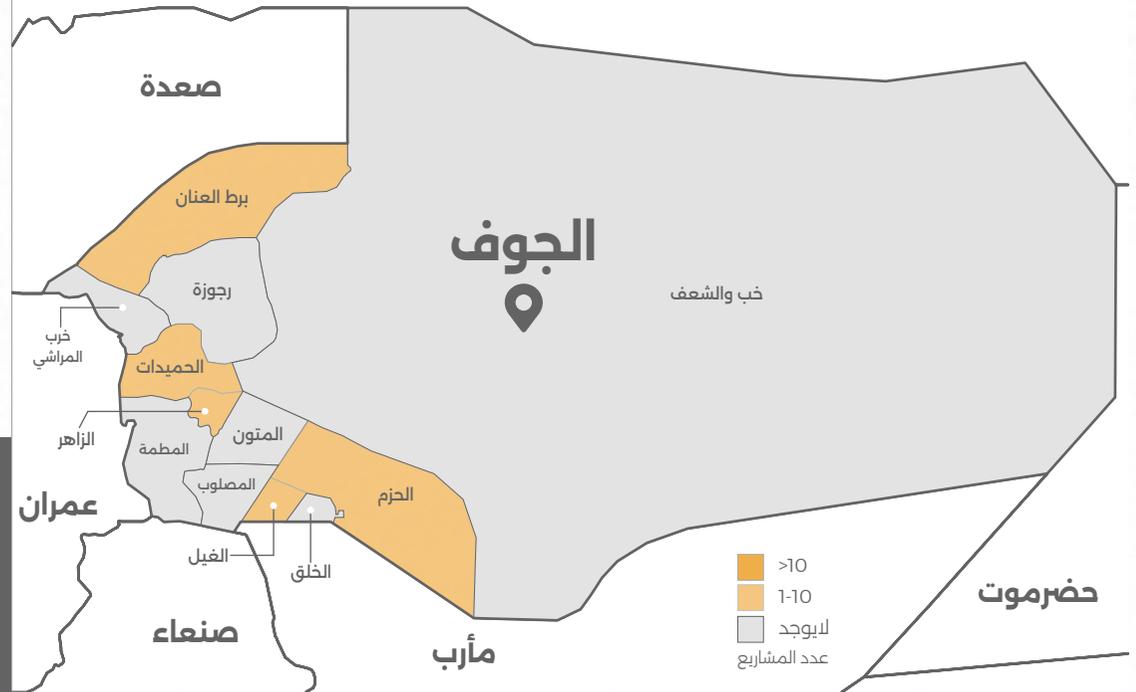

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

39.30 %

أبعاد المشاريع المنجزة

4,755 إجمالي الطول المنجز
متر

6 إجمالي متوسط العرض المنجز
متر



من واقع
الميدان

مشروع سفلة طريق الزاهر - حميدات
مديرية الزاهر - م/ الجوف



جانب من أعمال مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في مواجهة أضرار السيول وفتح مجرى السوائل وإزالة الأشجار من السوائل ورمد المستنقعات
مديرية الحزم - م/ الجوف



3

محافظة
الضالع



مسح و توسعة طريق القلاع حوشب
مديرية الحشاء - م/ الضالع



مسح و توسعة خط الرئيسي - يراخ
مديرية الحشاء - م/ الضالع



مسح و توسعة خط الرئيسي - يراخ
مديرية الحشاء - م/ الضالع



مسح و توسعة خط الرئيسي - يراخ
مديرية الحشاء - م/ الضالع



مسح و توسعة طريق القلاع حوشب
مديرية الحشاء - م/ الضالع



من واقع
الميدان


4



محافظة
عمران



خلاصة الوضع العام لمحافظة عمران

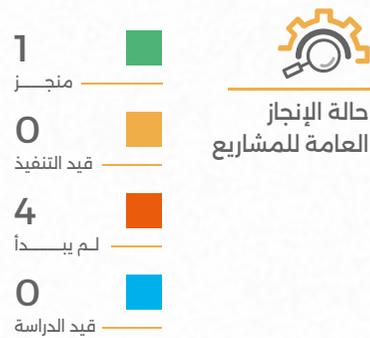

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

20.00%

أبعاد المشاريع المنجزة

2,200 إجمالي الطول المنجز
متر

4 إجمالي متوسط العرض المنجز
متر




5

محافظة
صعدة



خلاصة الوضع العام لمحافظة صعدة



92,579 مستفيد

13 مشروع

3 مديريات



346.7 مليون ريال



إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

28.15%

أبعاد المشاريع المنجزة

1,000 إجمالي الطول المنجز متر

7 إجمالي متوسط العرض المنجز متر



من واقع
الميدان



6

محافظة
حجة



خلاصة الوضع العام لمحافظة حجة



عدد المشاريع	عدد المستفيدين	عدد المشاريع	عدد المستفيدين
2	2,007	3	18,752
1	1,202	2	600
1	787	1	255
2	20,857	2	1,104
1	564	3	1,546
2	1,323	3	2,660
1	1,200	2	1,331
1	563	3	2,220
1	563	4	58,425
1	24,500	6	3,116



حالة الإنجاز
العامة للمشاريع


143,575 مستفيد

42 مشروع

20 مديرية



1.761 مليار ريال

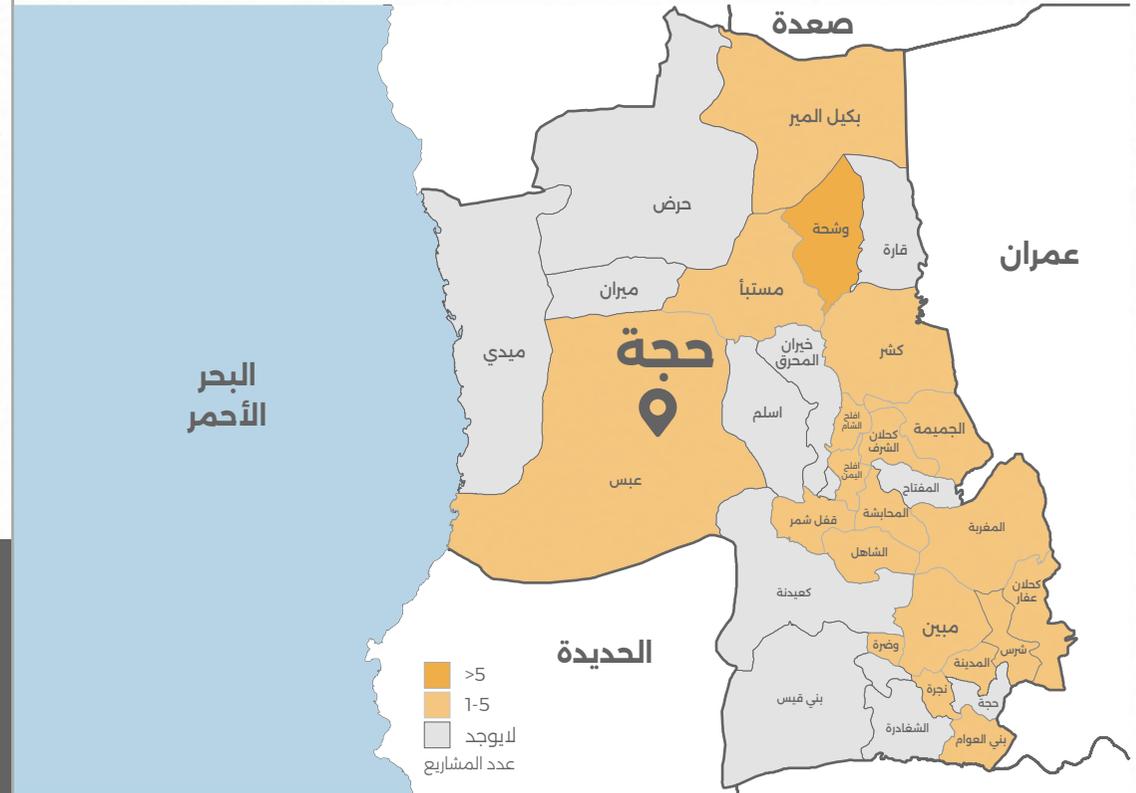

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

24.86%

أبعاد المشاريع المنجزة

58,530 إجمالي الطول المنجز متر

5 إجمالي متوسط العرض المنجز متر



من واقع
الميدان





من واقع
الميدان


جانب من أعمال وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول وفتح الطرقات المغلقة وحماية الأراضي الزراعية في عدد من المديريات. محافظة حجة

7



محافظة
ريمة

خلاصة الوضع العام لمحافظة ريمة



إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

0%

أبعاد المشاريع المنجزة

إجمالي
الطول المنجز
متر
إجمالي
متوسط العرض المنجز
متر



8


محافظة
البيضاء



خلاصة الوضع العام لمحافظة البيضاء



عدد المشاريع عدد المستفيدين

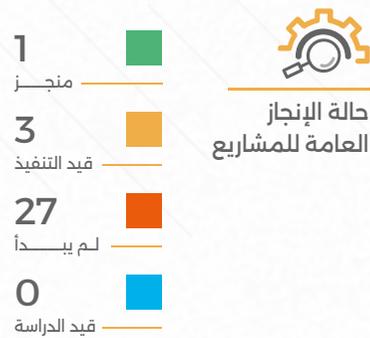


201,475 مستفيد

31 مشروع

9 مديريات



1.461 مليار ريال

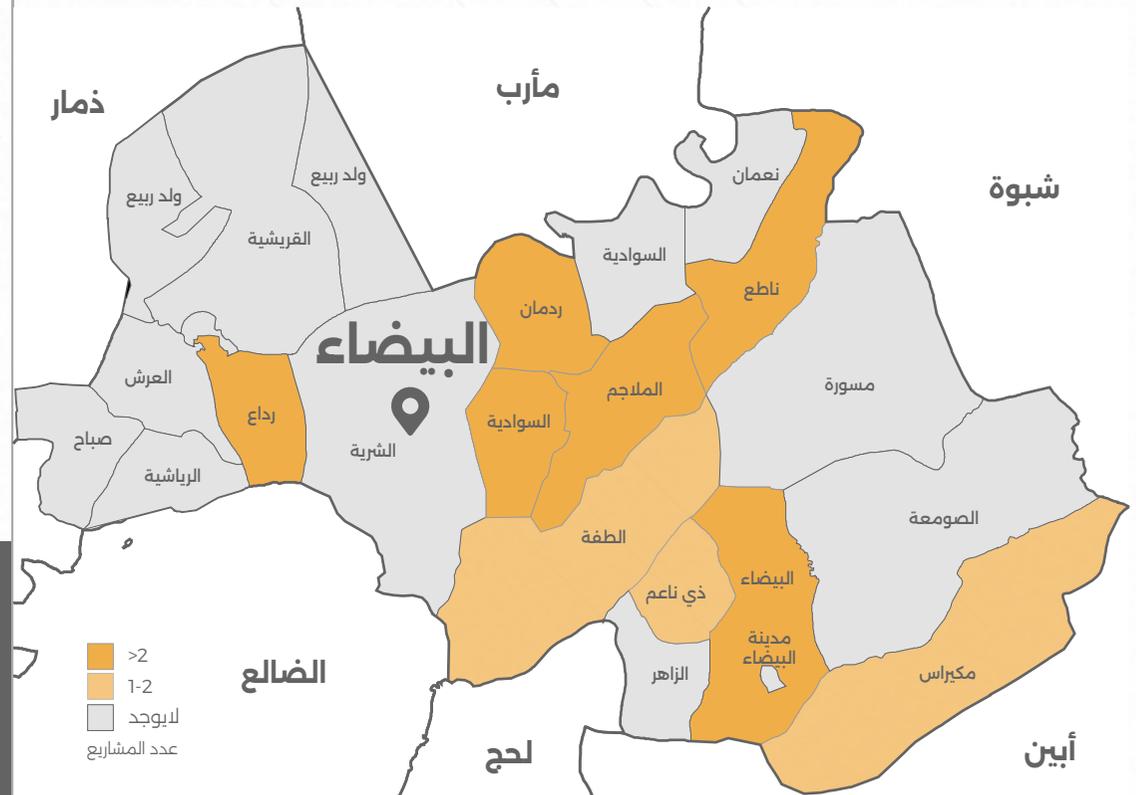

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

5.42%

أبعاد المشاريع المنجزة

8,701 إجمالي الطول المنجز
متر

8 إجمالي متوسط العرض المنجز
متر




مشروع شق ومسح و تسوية وردم ودك طريق رزيقة ال غشام الرابط بين خط بيحان وخط مأرب مديرية الملاجم - م/ البيضاء



9

محافظة
ذمار

خلاصة الوضع العام لمحافظة ذمار




255,755 مستفيد

22 مشروع

3 مديريات



1.935 مليار ريال

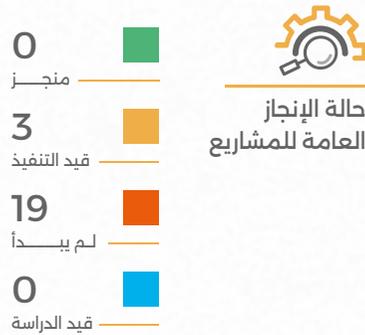


إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

9.86%

أبعاد المشاريع المنجزة

14,175 إجمالي الطول المنجز متر

7 متوسط العرض المنجز متر

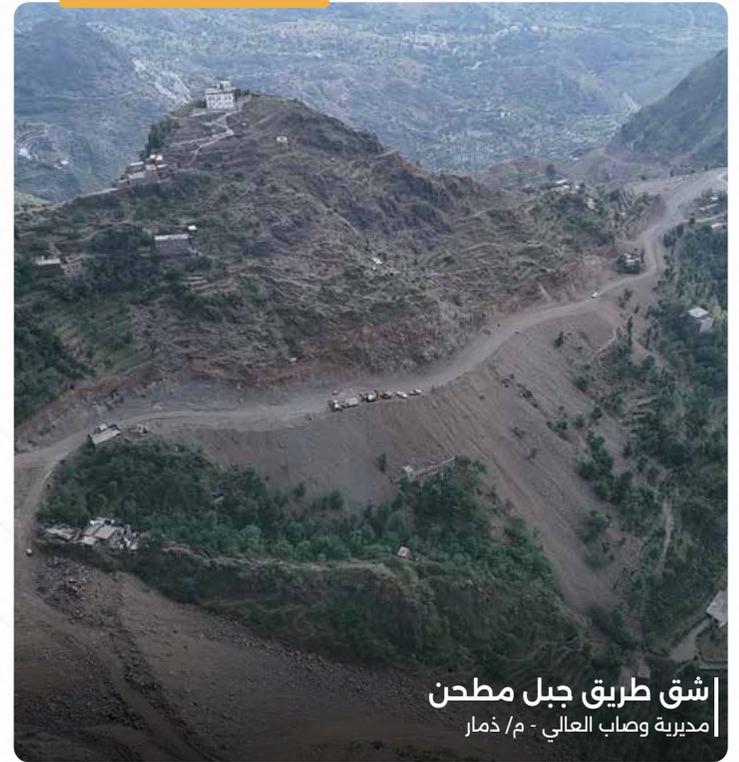



مشروع توسعة طريق الجمعة مغربة العنب المتصل بطريق الحيمة صنعاء


مديرية جبل الشرق - م/ ذمار

مسارات مشاريع مديرية جبل الشرق



مسارات مشاريع دعم المساهمات في توسعة
و تحسين جودة خدمة الطرق الريفية

محافظة ذمار

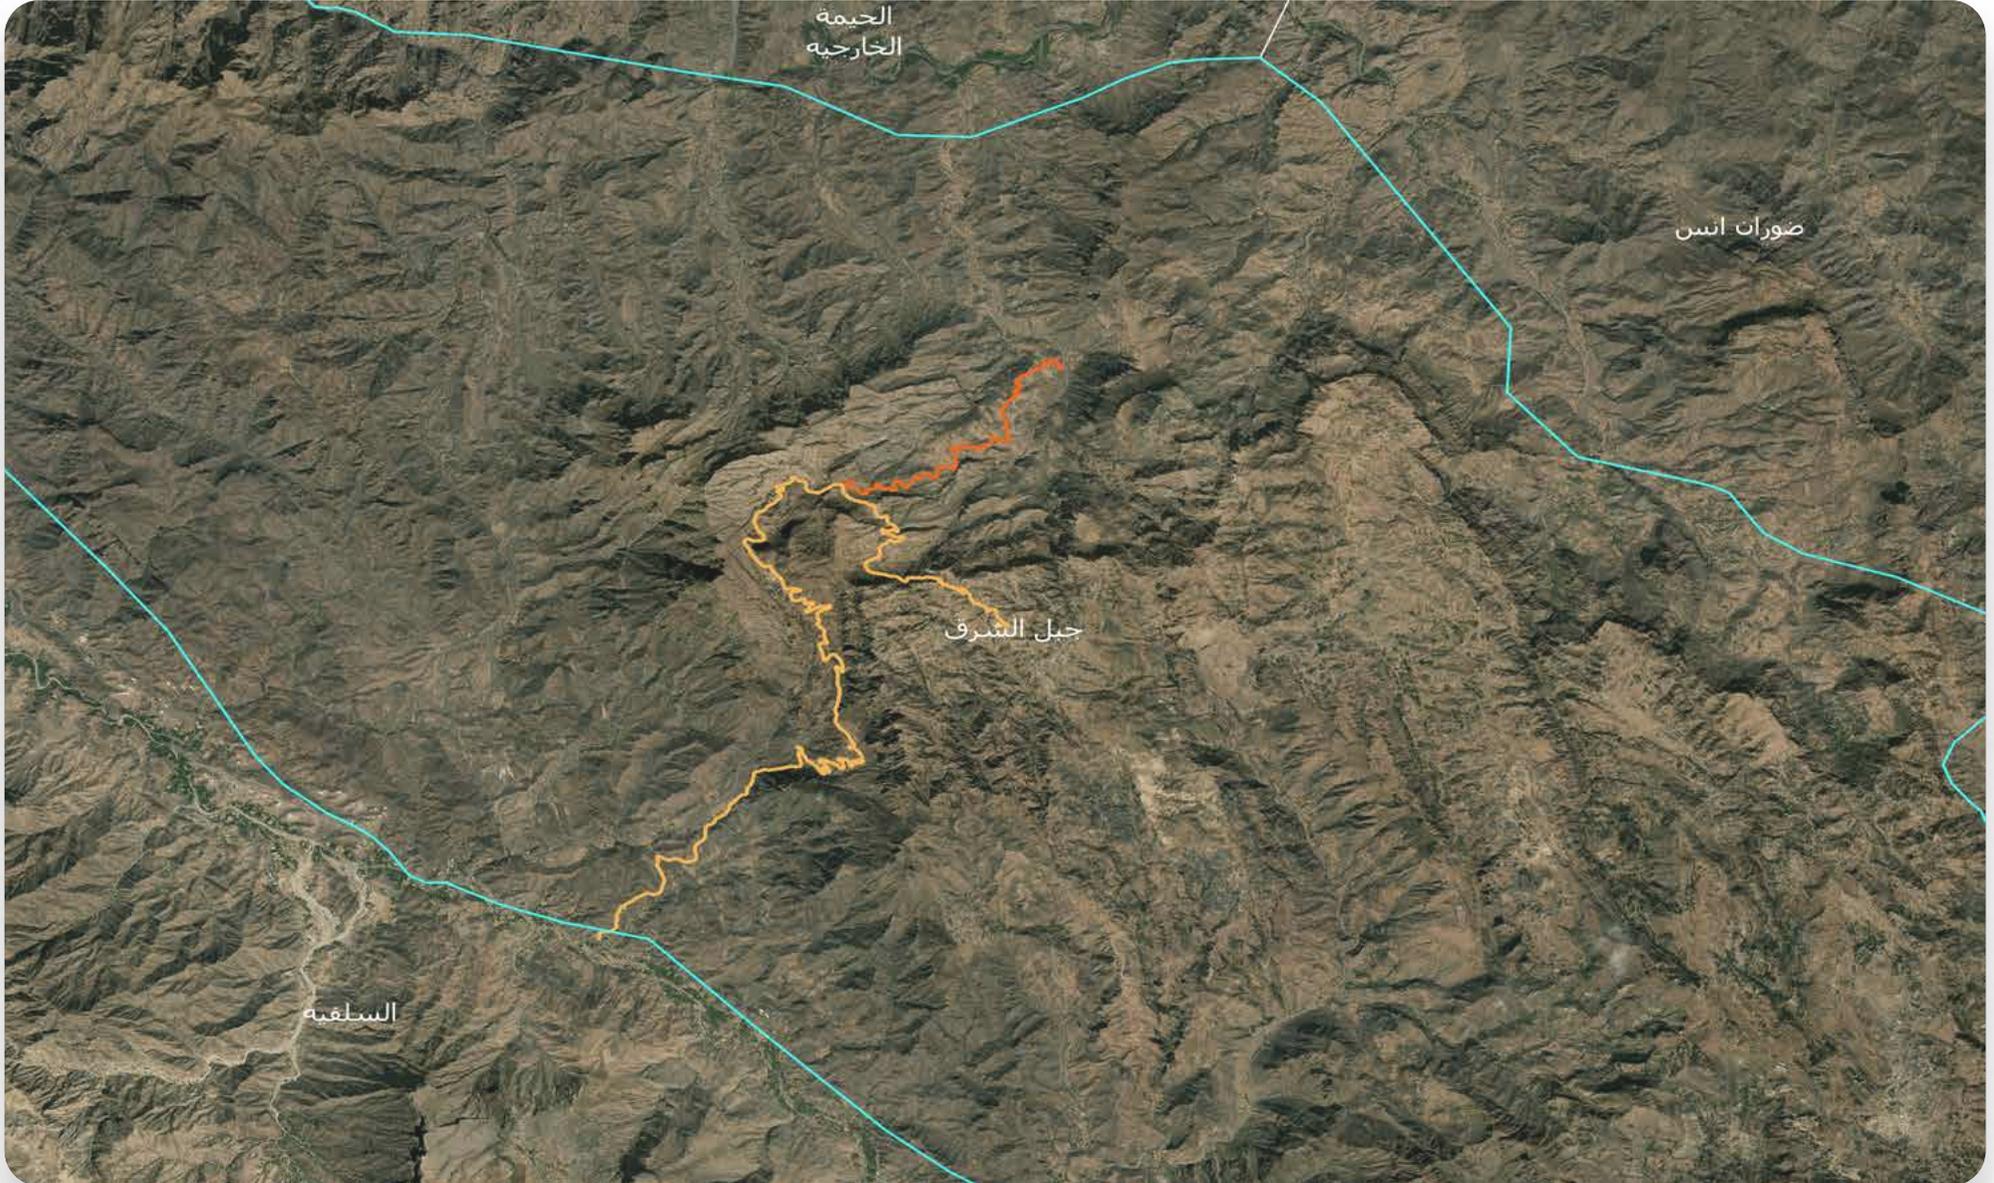

مسارات المشاريع

برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

10

محافظة الحج



خلاصة الوضع العام لمحافظة لحج

عدد المستفيدين 10,760 | عدد المشاريع 4 | القبيطة

10,760 مستفيد

4 مشاريع

1 مديرية

0 % 100 %
0 التكلفة التنفيذية | 45,471,328 التكلفة المعتمدة

45.47 مليون ريال

4 مشاريع

0 منجز | 0 قيد التنفيذ | 4 لم يبدأ | 0 قيد الدراسة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

0 %

أبعاد المشاريع المنجزة

إجمالي الطول المنجز - متر | متوسط العرض المنجز 7 متر






11

محافظه
المحويت



خلاصة الوضع العام لمحافظة المحويت

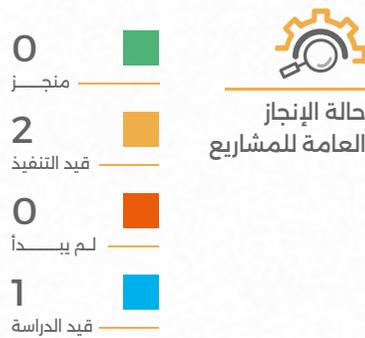

إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع

2.33%

أبعاد المشاريع المنجزة

840 إجمالي الطول المنجز متر

5 إجمالي متوسط العرض المنجز متر



من واقع
الميدان

جانب من أعمال وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول وفتح الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل مصاريف المياه في عزلي همدان و القبله مديرية ملحان.
مديرية ملحان - م/ المحويت



الملحقات - ملخص المصفوفات

مشروعات برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية (الشراكة مع الجهات الحكومية)

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	طبيعة الأعمال تص. شق. مسج. توسعة. قطع صخري ..	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة	أبعاد المشروع المنجزه		الكميات المنجزة				حالة المشروع		
								العرض (م)	الطول (م)	توسعة/شق ذات طبيعة صخرية (م ³)	توسعة/شق لبرية مختلطة (م ³)	توسعة/شق لبرية طبيعية (م ³)	مسح وتوسيع لمساحة (م ²)	التنفيذية (ريال)	نسبة الإنجاز (%)	
1			مسح وتوسعة طريق الفايص الجديدة - ريف مدينة رحاب	مسح وتوسعة	1,235	1,480,192	1,480,192	5	1,850	49	406	328	0	1,275,346	100%	
2			شق طريق إدارة الامن المحيابة الصرة - عبدان	شق	3,170	1,868,914	1,868,914	5	1,750	99	1,322	408	0	2,813,052	100%	
3			شق طريق قرية الخرابة - ممسى الشترى الاسفل	شق	281	907,131	907,131	5	1,360	51	938	863	0	2,284,480	100%	
4			شق وتوسعة ومسح وتصريف مياه قرية الصناعي المهبال جمل الروضة القراء صمعين	شق ومسح وتوسعة	874	6,334,793	2,199,009	5	7,020	32	112	19	0	405,656	100%	
5			مسح وتوسعة طريق عشق الحمراء الحرقفة السهلة - الضبر - ممسى الشترى	شق ومسح وتوسعة	840	2,226,620	1,657,481	5	3,500	43	365	205	0	1,703,583	100%	
6			مسح وتوسعة وتنسوية طريق قرية خزل	مسح وتوسعة	205	586,884	586,884	5	1,280	32	112	19	0	560,306	100%	
7			مسح وتوسعة وتنسوية طريق شعب الحنا جربة عيمان - زره - ممسى الشترى	مسح وتوسعة	1,545	3,549,325	3,549,325	5	1,250	12	80	68	0	581,765	100%	
8			مسح وتوسعة وتنسوية طريق مقاب نفايات مدينة رحاب - مركز مديرية القفر	مسح وتوسعة	4,800	1,734,270	1,734,270	5	1,250	68	587	340	0	1,656,006	100%	
9			شق وتوسعة ومسح طريق الهباري	شق وتوسعة	2,000	9,032,078	2,094,032	5	1,150	138	468	459	1,150	1,387,100	88%	
10			مسح وتوسعة وتنسوية طريق المذارى الضهرة الخربة الصنع	مسح وتوسعة وتنسوية	6,330	2,094,032	2,094,032	6	1,300	0	369	190	20	1,076,320	57%	
11			شق طريق قرية الدار - ممسى الشترى	شق	270	896,813	896,813	5	300	0	423	25	0	679,620	100%	
12			إصلاح وتأهيل عبارة الصالوة ومسح وتوسعة وتصفية مخلفات قطاع طريق قرية عساليم - خط الإسفلت الرئيسي .	مسح وتوسعة	11,599	1,735,543	1,735,543	8	880	0	595	490	0	1,366,850	100%	
13			الدميم حوار دراسة شق ومسح وتوسعة طريق الدميم حوار	مسح وتوسعة	784	3,607,083	3,607,083	5	2,750	242	1,460	444	0	3,937,026	100%	
14			البريض دراسة فنية :توسعة ومسح طريق قرية اليربيخ بني سيف العالي	مسح وتوسعة	81	1,452,719	1,452,719	5	1,430	150	437	179	0	1,527,454	100%	
15			شق وتوسعة ومسح طريق سطات الساتي العريشة الحناري	شق ومسح وتوسعة	1,348	2,395,820	2,395,820	5	3,985	64	339	730	0	2,462,556	100%	
16			مسح وتوسعة طريق(بني مفتاح) بني سيف السافل	مسح وتوسعة	401	8,429,322	8,429,322								0%	
17			شق وتوسعة ومسح طريق القلعة عدن تلكه جزار الضفير السلقفة العليا الروزوم مسيفره	شق وتوسعة	2,370	6,382,159	6,382,159								0%	
18			توسعة وتنسوية طريق البركة نجد الحمر العالي جبانة الياصق - بيت الأدب	شق وتنسوية	693	3,361,672	3,361,672								0%	
19			شق طريق قرية الحمرة	شق	152	2,579,792	2,579,792								0%	
20			مسح وتوسعة طريق شيهان	مسح وتوسعة	2,600	7,460,966	7,460,966	5	2,600	0	804	4,335	0	6,052,606	85%	
21			مسح وتوسعة طريق الخط الرئيسي الموسامة بني جبران	مسح وتوسعة	2,450	13,756,417	13,756,417								0%	
22			مسح وتوسعة طريق الرذب وفروعها	مسح وتوسعة	552	5,752,043	5,752,043								0%	
23			مسح وتوسعة طريق بني شعيب وفروعها	مسح وتوسعة	1,136	5,937,776	5,937,776								0%	
24			مسح وتوسعة نجد البرج وفروعها	مسح وتوسعة	4,200	5,837,008	5,837,008								0%	
25			مسح وتوسعة طريق الضيق	مسح وتوسعة	1,411	7,030,829	7,030,829								0%	
26	أب	القفر	مسح وتوسعة طريق بيت العلاف	مسح وتوسعة	1,000	2,236,897	2,236,897								0%	
27			مسح وتوسعة طريق الكسر- عزلة النخلة	مسح وتوسعة	411	1,562,041	1,562,041								0%	
28			شق وتوسعة طريق النمار- نخلة- القفر - مرحله اولي	شق	1,074	5,778,655	5,778,655								0%	
29			مسح وتوسعة طريق حصن عوضه	مسح وتوسعة	500	3,510,404	3,510,404								0%	
30			مسح وتوسعة طريق قيدان	مسح وتوسعة	1,500	2,262,623	2,262,623								0%	
31			مسح وتوسعة طريق (سمنان، الكوال، المظل فضعها) عزلة بن، ميانا	مسح وتوسعة	6,000	10,150,600	10,150,600								0%	
32			مسح وتوسعة طريق نسفان وادي الحفنة- عزلة النخلة	مسح وتوسعة	200	2,245,299	2,245,299								0%	
33			مسح وتوسعة طريق بني حيران الى السيل	مسح وتوسعة	3,250	10,723,774	10,723,774								0%	
34			مسح وتوسعة طريق (السيل - وحتى خط الاسفلت خط القفر الاسفل) بني سيف السافل	مسح وتوسعة	2,185	12,989,698	12,989,698								0%	
35			مسح وتوسعة وشق طريق رابطة - الظفر - الشبكة - مقعد - الهيف - البرج بني مهدي	مسح وتوسعة	1,000	6,315,020	2,285,558	4	10,530	300	790	1,210	2,000	9,100	5,981,840	100%
36			مسح وتوسعة طريق باب الشعب - المرابغ - وجيس	مسح وتوسعة	350	887,902	2,274,638	3	3,060	0	630	0	3,060	3,060	2,058,570	100%
37			مسح وتوسعة طريق وجيس - بيت المبداء حمير	مسح وتوسعة	220	629,740	1,528,336	3	4,160	0	826	0	4,160	4,160	1,333,864	100%
38			مسح وتوسعة طريق وجيس - بيت الوادعي	مسح وتوسعة	170	1,052,161	465,020	3	5,000	0	50	0	5,000	872,050	100%	
39			مسح وتوسعة طريق المبدأ - حدعين	مسح وتوسعة	150	603,607	309,856	3	2,710	0	0	0	2,710	436,310	100%	
40			مسح وتوسعة طريق حدعين - ظهي	مسح وتوسعة	170	487,601	269,727	3	2,010	0	0	0	2,010	323,610	100%	
41			مسح وتوسعة طريق حدعين - حدش	مسح وتوسعة	100	786,769	373,216	3	3,470	10	20	0	3,470	614,220	100%	
42			مسح وتوسعة طريق المبدأ - الشارجية	مسح وتوسعة	100	353,366	223,292	3	1,200	0	0	0	1,200	193,200	100%	
43			مسح وتوسعة طريق الشارجية - وجيس (خط اجر)	مسح وتوسعة	70	436,227	251,956	3	1,700	0	0	0	1,700	273,700	100%	
44			مسح وتوسعة طريق الظهار حمير - المعلق ربوع السائلة	مسح وتوسعة	70	744,471	358,584	3	2,500	0	90	120	2,210	572,980	100%	
45			شق طريق مصولة حمير	شق	600	3,972,026	1,475,065	3	600	450	1,125	1,125	0	3,705,975	100%	
46			مسح وتوسعة طريق وجيس - مخدجين	مسح وتوسعة	300	1,397,415	584,451	3	7,500	0	0	0	7,500	1,207,500	100%	
47			شق ومسح وتوسعة طريق باب الشعب - معينة	شق وتوسعة	430	659,400	329,156	3	3,500	0	80	0	2,380	490,460	100%	

مشروعات برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية (الشراكة مع الجهات الحكومية)

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة	أبعاد المشروع المنجزه		الكميات المنجزة				حالة المشروع	
							الطول (١)	العرض (٢)	توسعة/شق ذات طبيعة صخرية (٣م)	توسعة/شق لينة مختلطة (٣م)	توسعة/شق لينة طبيعية (٣م)	مسح وتسوية اجسام الطرق (م.خا)	التنفيذية (ريال)	نسبة الإنجاز (%)
48			مسح وتوسعة طريق السهلة بني مهدي	100	732,870	354,571	2,240	3	0	90	100	201,090	2,240	100%
49			مسح وتوسعة طريق المعين - نبي - نجد الحبل الجاحج - بيت الوادعي	570	4,285,714	1,583,577	3,500	3	1,200	0	0	4,011,100	3,500	100%
50			شق وتوسعة طريق نجد الحبل - مثلث الوشة - بيت الوادعي	90	651,666	326,481	3,000	3	0	0	0	483,000	3,000	100%
51			مسح وتوسعة طريق فرع قرية محازر المههم	150	912,678	416,770	4,000	3	0	115	0	736,460	4,000	100%
52			شق وتوسعة طريق فرع قرية الحيرة	90	568,805	297,817	2,500	3	0	0	0	402,500	2,500	100%
53		ريف اب	المساهمة في رفع مخلفات شارع الثلاثين جوله السحول لتتقاطع		24,394,575	24,394,575						24,394,575		100%
54	اب	المعين	رصف خرساني لطريق المعين	30,000	198,901,334	92,215,443	965	6		798		42,961,540	965	32%
55		المشنة	رصف خرساني لطريق نغيل بعدان - المشنة		154,443,960	85,140,000						40,614,000		50%
55		4	إجمالي محافظة اب	102,157	563,392,833	359,419,979	97,800		2,920	13,062	14,026	161,638,270	61,875	64%
56		الجزم	شق وسفلتة الشارع العام الجزم	40,000	1,276,421,290	48,961,336								0%
57		الزاهر الحميدات	سفلتة طريق الزاهر الحميدات	8,000	288,262,783	15,188,226	2,200	6		3,021		13,243,475		100%
58		ربط العنان	تحسين ورصف سوق ربط العنان	5,000	124,151,970	74,174,502	55					4,097,750	55	8%
59	الجوف	الجزم	مواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث السيول لمحينة الجزم	21,000	4,599,750	2,949,750						2,949,750		100%
60		الغفل	مبادرة حماية الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة	1,400	35,122,692	-	2,500	6						28%
61		عدة محبريات	إزالة أشجار السيول والأمطار في عدد من مديريات المحافظة	22,000	-	-								0%
6		5	إجمالي محافظة الجوف	97,400	1,728,558,484	141,273,814	4,755		0	0	3,021	20,290,975	55	39%
62		الضالع	شق وسفلتة طريق الشارع العام	30,000	265,588,000	95,543,000	980	15				69,527,200		100%
63			طريق مركز المديرية - ماويه	35,000	2,142,369	2,142,369	21,000	7	144	8,265	6,323	17,030,820	18,171	100%
64			مسح وتوسعة طريق القلاع براخ السجين	4,000	21,980,023	21,980,023	11,714	7	0	6,344	8,950	9,634,469	11,289	100%
65			مسح وتوسعة طريق الصيرة نجد الملكة الحمراء	-	16,766,527	16,766,527	3,062	7	0	751	2,562	2,273		50%
66			مسح وتوسعة طريق براخ شان	-	9,766,622	9,766,622	2,590	6	0	0	0	2,396,904	0	26%
67		الحساء	مسح وتوسعة طريق السجين المرظامة	1,000	7,015,099	7,015,099								0%
68			مسح وتوسعة طريق الطاجون حوشب	5,000	22,534,578	22,534,578								0%
69			مسح وتوسعة طريق القلاع حوشب	1,500	4,999,467	4,999,467	3,931	6	0	390	5,484	1,259		100%
70			مسح وتوسعة طريق المشهد غول الأريب	5,000	16,176,538	16,176,538								0%
71			شق طريق حوشب سوق الليل	10,000	13,028,954	13,028,954								0%
72			مسح وتوسعة طريق الحجره اكمات الماغل بني عباد	6,000	11,286,049	11,286,049								0%
73			مسح وتوسعة طريق حبل جبي الحفة اللتوب	6,000	19,792,325	19,792,325								0%
12		2	إجمالي محافظة الضالع	103,500	430,363,551	260,318,551	43,277		144	15,750	26,439	98,589,393	32,992	40%
74		مسور	إعادة تأهيل خط طريق لدمه - بني حور	600	7,480,000	750,000	2,200	4	8,710	528	6,660			100%
75			شق وتوسعة طريق العرضي المصايه المربع	4,500	38,533,204	13,602,811								0%
76		شهارة	شق وتوسعة طريق قرن الفهره - بيت اللاحع	3,860	27,861,969	13,413,898								0%
77			شق وتوسعة طريق الفصيب	1,260	34,010,110	7,622,677								0%
78			شق وتوسعة وتأهيل طريق بين الدوب الشحنة	2,500	11,842,001	4,390,425								0%
5			2	إجمالي محافظة عمران	12,720	119,727,285	39,779,811	2,200		8,710	528	6,660	0	0
79			مسح وتوسعة طريق الشقف الى بني بحر المرحلة الأولى	10,000	14,785,138									0%
80			بناء جدران سائده طريق الشقف-بني بحر	75,524	13,688,296									0%
81			رصف طريق ضحيان	920	4,640,132									0%
82			رصف طريق الشبحة	800	2,644,746									0%

مشروعات برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية (الشراكة مع الجهات الحكومية)


م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	طبيعة الأعمال	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة	أبعاد المشروع المنجزه		الكميات المنجزه				حالة المشروع				
								العرض (١)	الطول (١)	توسعة/شق ذات طبيعة صخرية (٣م)	توسعة/شق لينة مختلطة (٣م)	توسعة/شق لينة طبيعية (٣م)	مسح وتسوية	تكلفة المشروع (ريال)	نسبة الإنجاز (%)			
83	صعدة	سبعين	رصيف طريق وهابة	رصيف	950	3,205,753												
84			رصيف طريق الشراف	رصيف	2,185	4,051,716												
85			توسعة وتسوية طريق زنج	توسعة وتسوية	750	4,356,722												
86			رصيف طلعة تمامة سابقين	رصيف	1,450	3,571,069												
87			المساهمة في مشروع طريق ذويب المزاله مديرية حيدان	شق وتأهيل			50,000,000	50,000,000						50,000,000	100%			
88			المساهمة في مشروع طريق المرازم	تأهيل وتحسين			18,000,000	18,000,000						18,000,000	100%			
89			المساهمة في استكمال سفلة طريق حيدان - الجمعة	تأهيل وتحسين			45,000,000	45,000,000						45,000,000	100%			
90			المساهمة في مشروع طريق عقبه المجرم مديرية الظاهر	تأهيل وتحسين			25,620,460	25,620,460		4	1,000	275		16,940,900	66%			
91			رصيف طريق الجوة				157,234,871	93,776,218						1,854,400	0%			
13		3	اجمالي محافظة صعدة		92,579	346,798,903	232,396,678	4	1,000	275		104,295,300	28%	0	0	8	2	3
92	حجة	بني العوام	مساهمة الوحدة في صيانة طرق المحابشة - عيس - مغمش	المساهمة بتكلفة	1,500	100,000,000	100,000,000						50,000,000	0%				
93			المساهمة برفع اضرار السبول لعدد (5) طرق بالمحيرية	إزالة مخلفات	15,600	950,000	-						950,000	85%				
94			المساهمة برفع اضرار السبول لعدد (7) طرق بالمحيرية	إزالة مخلفات	24,500	3,800,000	-						3,800,000	50%				
95			صيانة وإزالة المخلفات والنساقطات في الطريق الرئيسي من مدينة المحابشة الى بيت السعدي بطول (٩) كم	اعمال شق	8,505,887	3,540,601	8,505,887		8_10	9,000	12,000	0	0	9,337,014	100%			
96			شق ومسح ووصف وتحسين طريق وعرة - بدهن - سبلة - الشعبة - جبل حرام عزلة المراحبة والامور الرابط بين مديرتي الشاهل ومين سادة	اعمال توسعة + اعمال رصف وجدران	600	46,338,613	137,773,403		4	7,800	200	9,360	2,340	0	89%			
97			مشروع شق طريق شوع المرفق بطول (٨٠٠٤) كم	اعمال شق	255	5,924,208	14,384,749		4	4,080	1,304	5,068	3,009	8,544,572	75%			
98			شق طريق احكم الغربي البراز بطول (٣) كم وعرض ٤ م	اعمال شق	252	8,875,118	21,891,494		4	3,000	3,071	4,360	2,155	14,037,315	62%			
99			توسعة الطريق الرئيسي للمحيرية مرحلة أولى (جبل عولي الى قلعة الشرفي) بطول ١٥ كم من العرض الحالي (٣,٥٠٢,٥) م وصولاً الى احدى عرض ٤ م	اعمال توسعة	852	9,621,410	24,611,142		3.5-5	15,000	0	3,500	1,615	13,408	35%			
100			شق طريق أحكم الغربي- بيت الوادي - بطول (١٣٠٠) م وعرض ٥ م	اعمال شق	965	8,375,118	21,391,494		5	1,300	5,252	2,544	1,016	2,631,211	76%			
101			شق طريق التايغة الحزام الشرفي - نجرة بطول ٢ كم وعرض ٥م	اعمال شق	324	9,946,797	25,451,740				0	0	0	0	0%			
102	شق طريق بيت حسين علي وبيت الفرض - الشواهل - نجرة بطول ٩٥٠م وعرض ٥م محيرية/ نجرة	اعمال شق	257	5,590,209	14,275,155				0	0	0	0	0%					
103	شق طريق اللطواف -الراحة-عريف-القرية السوداء- محيرية الجيمعة بربط المحيرية بمحيرية الممتد	اعمال شق - اعمال جدران	852	65,602,595	147,737,372		6	8,850	3,939	2,353	150	12,214,007	8%					
104	توسعة ووصف وتحسين طريق قاعة - ذو محمد وحسين - الجابية - صبران	اعمال توسعة- اعمال رصف وجدران	756	9,147,496	34,733,346		5	9,500	700	0	0	9,500	11%					
105	توسعة ووصف وتحسين طريق الجازعة- غارب نقيبة - ذو محمد وحسين	اعمال توسعة- اعمال رصف وجدران	575	6,643,061	26,447,062					5,715		4,742,811	18%					
106	كثار	كحلان الشرف	شق طريق ضلع غروره مور	اعمال شق	895	13,455,457	37,523,906						0	0%				
107			شق طريق عمد المعارض - كحلان الشرف بطول (١,٥) كم	اعمال شق	3,500	1,199,391	2,645,851					2,806	2,469,280	100%				
108			المساهمة برفع اضرار السبول لعدد (٩) طرق بالمحيرية	إزالة مخلفات	51,700	712,500	-						712,500	95%				
109			شق مخططات الشوارع العمرانية عيس شفر بطول (٣٨٠٠) م ط وعرض حسب المخطط	اعمال شق	1,520	37,961,815	96,717,522							0	0%			
110	شق الشارع الدائري عيس شفر بطول (٦٠٠) م ط وعرض ٥٠ م محيرية عيس	اعمال شق	487	21,859,561	55,591,028							0	0%					
111	شق خط دائري الجنوبي لسوق الهنجه طول الطريق (٢,٢٢) كم	اعمال شق	1,202	4,399,408	10,275,705							0	0%					
112	مسح صيانة وإزالة المخلفات في الطريق الرئيسي بطول (١٦) كم وعرض (١٠) م - محيرية افلح للشام	اعمال مسح مخلفات	787	4,542,260	10,976,351					1,356	5,785	6,738,568	61%					
113	مشروع شق طريق الهجره عزلة الظهور بطول ١١٧٠ كم	اعمال شق	856	5,658,825	14,371,080							0	0%					
114	مشروع شق طريق قحطان الربي - قحطان الشرفي بطول ١٣٤٥ كم	اعمال شق	952	7,631,763	19,491,475							0	0%					
115	مسح وصيانة عقبة البيضاء جياح بطول ٤٦٠ م ط	مسح وتوسعة	357	2,129,232	4,600,046							0	0%					
116	المساهمة برفع اضرار السبول لعدد (١٢) طرق بالمحيرية	إزالة مخلفات	20,500	95,000	-							95,000	85%					
117	مسح وصيانة بني اسد - الشجعه - الضولع بطول ٦٥٠ م ط	مسح وتوسعة	1,652	4,317,064	9,524,929							0	0%					
118	مسح مشروع طريق (الوسه) مركز المحيرية - الأديعه بطول ١٢ كم	مسح وتوسعة	564	2,979,977	6,514,909							0	0%					
119	كحلان الشرف	كحلان الشرف	شق طريق الجامع الكدمه - كحلان الشرف بطول ١,٨ كم	شق	2,502	4,314,570	10,800,226					1,500	2,746	94%				
120			شق طريق بني الفاروزي بيت جابر - كحلان الشرف بطول ١,٦٥ كم	شق	723	2,815,396	6,914,597						0	0%				
121			شق وفتح طريق الزهمه التنصيريه بطول ١,٩٧٦ كم وعرض ٥م	شق	458	6,369,419	13,067,906						0	0%				
122	المدينة	كحلان الشرف	شق وفتح طريق الحوق سوق السوائل لمدينة حجه بطول ٣٠٠٢ كم	شق	865	1,256,446	3,016,055					0	0%					
123			مسح طريق القطارية - بني شربة	مسح وتوسعة	569	1,741,867	3,727,548						0	0%				
124			مسح طريق بني شهر مقله عاهم	مسح وتوسعة	756	2,791,390	6,090,352						0	0%				
125	المغربية	كحلان الشرف	مسح وصيانة طريق من المخلاف - وادي الور فقل شمر بطول ٢ كم	مسح وتوسعة	1,200	1,260,387	3,519,890					0	0%					
126			مسح وصيانة طريق درين ببولس عزلة نيساء بطول ٥,٥ كم وعرض ٤م	مسح وتوسعة	563	3,907,789	8,216,581						0	0%				

مشاريع برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية (الشراكة مع الجهات الحكومية)

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	طبيعة الأعمال	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة	أبعاد المشروع المنجزه		الكميات المنجزه				تكلفة المشروع التنفيذية (ريال)	حالة المشروع								
								العرض (٠)	الطول (٠)	توسعة/شق ذات طبيعة صخرية (٣م)	توسعة/شق لخرية مختلطة (٣م)	توسعة/شق لخرية طبيعية (٣م)	مسح وتوسيع لحجم الطريق (م.ط)		منجز	تمتد	بدأ	فهد الدراسة	نسبة الإنجاز (%)				
167	البيضاء	ناطع	شق طريق القبليه ناطع	شق	1,107	16,892,853	6,241,853												0%				
168			مسح مفروق وعاله ال دباش	مسح وتوسيع	3,262	5,678,527	2,163,527													0%			
169			طريق التميمس سبيكه الوهييه	مسح وتوسيع	4,560	6,256,926	3,062,869													0%			
170		الملاجم	مسح طريق السيله العليا عيل الوهييه	مسح وتوسيع	5,502	9,302,289	3,481,449													0%			
171			طريق ال غشام رزفه حجازة الذي يربط بين طريق خط ببحان وطريق خط مارب	مسح وتوسيع	5,502	16,927,134	8,530,473													0%			
172			مسح وردم ودك وتوسيع طريق الدائري الشمالي الشرقي - عفار	ردم ودك ومسح وتوسيع	1,000	6,762,005	3,064,095													0%			
173		مسح وردم ودك وتوسيع طريق الدائري الشمالي الغربي - عفار	ردم ودك ومسح وتوسيع	1,000	8,024,410	3,588,943														0%			
174		عمل مصارف مياه ورضف لجانبى الشارع العام	رضف	100,000	99,870,225	47,557,250														0%			
175		البيضاء	البيضاء	رضف السائلة التي تقع جنوب سوق الجملة للخضار حتى تلتقي مع الشارع العام امام مركز الفروي وتبدأ من وسط الشارع الممتد من غرب أمن المحافظة الى مطعم السواي	رضف		290,890,130	145,445,065													0%		
176				رضف الشارع الواصل بين شارع الامن العام مستشفى الحياة والشارع الواصل بين شارع الامن (A09) وشارع الامن السياسي ووحدة جوار (E) شارع رقم	رضف		33,519,759	16,759,880														0%	
177				رضف الشارع الممتد من (شارع الامن - الامن السياسي) شمال سوق الخضرة الى ان يلتقي بطول ١٨٠ متر و عرض ١٠ متر ومساحة (A03) بالاسيلة خلف سوق الخضرة بوحدة جوار رقم (E) شارع رقم ١٨٠٠٠٠٠٠	رضف		26,188,583	13,094,292														0%	
178				رضف الشارع الممتد من امام مكتب التربية حتى شارع الامن مستشفى الحياة بجانب مدرسة الثورة للبنات	رضف		43,630,851	21,815,425														0%	
179				رضف بالحجر المنشور وترميم بالمقاطع الاسفلتية لشارع رقم (E1) بوحدة جوار رقم (I1-E) بحارة الصافية من تقاطع الشارع مع الخط العام وحتى المستشفى القديم بمساحة (٢,٣٣٠) م٢ بمدينة	رضف		103,149,239	51,574,620														0%	
180				ترميم بالرضف بالحجر المنشور لشارع رقم (E1) بوحدة جوار رقم (E) بمساحة (١١٠-E) م٢ بحارة الصافية من التقاطع عند عمارة علي بريق وحتى التقاطع عند عمارة سايقا بمدينة بداع	رضف		19,810,246	9,905,123														0%	
181				بداع	اعمال مشروع رضف وترميم الشارع من نهاية رضف المؤسسة في باب المحجري وحتى مدخل القناع امام منزل التصريحي والعمل يشمل اعمال القطع والاردم مع الدك والارش وطبقة البيس كورس وطبقة خرسانة عادية ٧سم ورضف بالحجر الشامي سماكة ١٥ سم بداع	رضف وترميم		80,795,852	40,397,926														0%
182					اعمال مشروع رضف وترميم شارع رقم ١٢٠٠٠٠٠٠ وحدة جوار رقم ١٢ من تقاطع مدرسة الزهراء وحتى مصلى العيد (المشهد) وبطول كلي ٣٣٠ متر والعمل يشمل اعمال القطع والاردم مع الدك والارش وطبقة البيس كورس وطبقة خرسانة عادية ٧سم ورضف بالحجر الشامي سماكة ١٥ سم بمدينة بداع	رضف وترميم		35,525,956	17,762,978														0%
183					الرضف بالحجر المنشور من تقاطع بداية شارع جين عند الفرزة مع الشارع العام لمحنية بداع وحتى المستشفى المركزي	رضف		461,925,279	240,962,640														0%
184		الرضف بالحجر المنشور للشارع الممتد من مدرسة الزهراء صالة سكران المؤدي الى البنك اليمني للإنشاء والتعمير القديم بمدينة بداع	رضف		47,751,585	23,875,792														0%			
185		مسح وردم وتوسيع طريق ريام:مرحلة ثانية -بداع	ردم ومسح وتوسيع		23,396,627	9,460,716														0%			
186	ناطع	ناطع	طريق وعاله - بادواس - اعشار - هينه - صيغ - المنطق - حذية - حجلان - عغبة صالح - ببحان - م شهم	شق ومسح وردم		14,384,994	14,384,994													0%			
187			مسح وردم ودك وتوسيع طريق الدائري الشرقي - مكراس	ردم ودك ومسح وتوسيع	10,000	7,768,642	3,148,036													26%			
31	9	9	إجمالي محافظة البيضاء		201,475	1,461,700,618	723,171,239	8,701	1,900	0	1,010	0	1,947,310	13,562	0	1,010	0	0	5%				
188	لحج	القبيلة	تسوية ورفع مخلفات طريق (ظمران - الكعبين)	مسح وتوسيع	5,875	15,038,504	15,038,504													0%			
189			توسعة واستكمال شق طريق ظمران الهيجة للجنة	شق وتوسيع	1,385	18,720,925	18,720,925													0%			
190			توسعة ورفع مخلفات طريق الكعبين - وادي الفرض)	مسح وتوسيع	3,000	7,347,260	7,347,260													0%			
191			توسعة واستكمال شق طريق الحجاج جهنم	شق وتوسيع	500	4,364,639	4,364,639														0%		
4	1	1	إجمالي محافظة لحج		10,760	45,471,328	45,471,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
192	المحويت	ملحان	معالجة أضرار السيول في منطقة القبلة - شمال ملحان	شق وتوسعة الطريق ورفع المخلفات		17,000														0%			
193			معالجة أضرار السيول طرق همدان	رفع المخلفات وإعادة فتح الطرق	1,900	7,950,760	7,950,760													0%			
194			معالجة أضرار السيول في منطقة الجرفة جيش	رفع المخلفات وإعادة فتح الطرق	3,150	12,013,967	12,013,967													7%			
3	1	1	إجمالي محافظة المحويت		22,050	19,964,727	19,964,727	840	231,278	0	452	0	840,978	0	0	452	0	0	2%				
			الإجمالي الكلي للمحافظات		1,051,971	8,479,791,109	2,582,912,596	294	231,278	294	231,278	294	574,250,338	134,401	74,793	64,267	47,240	21%	21%				

برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة الطرق الريفية

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

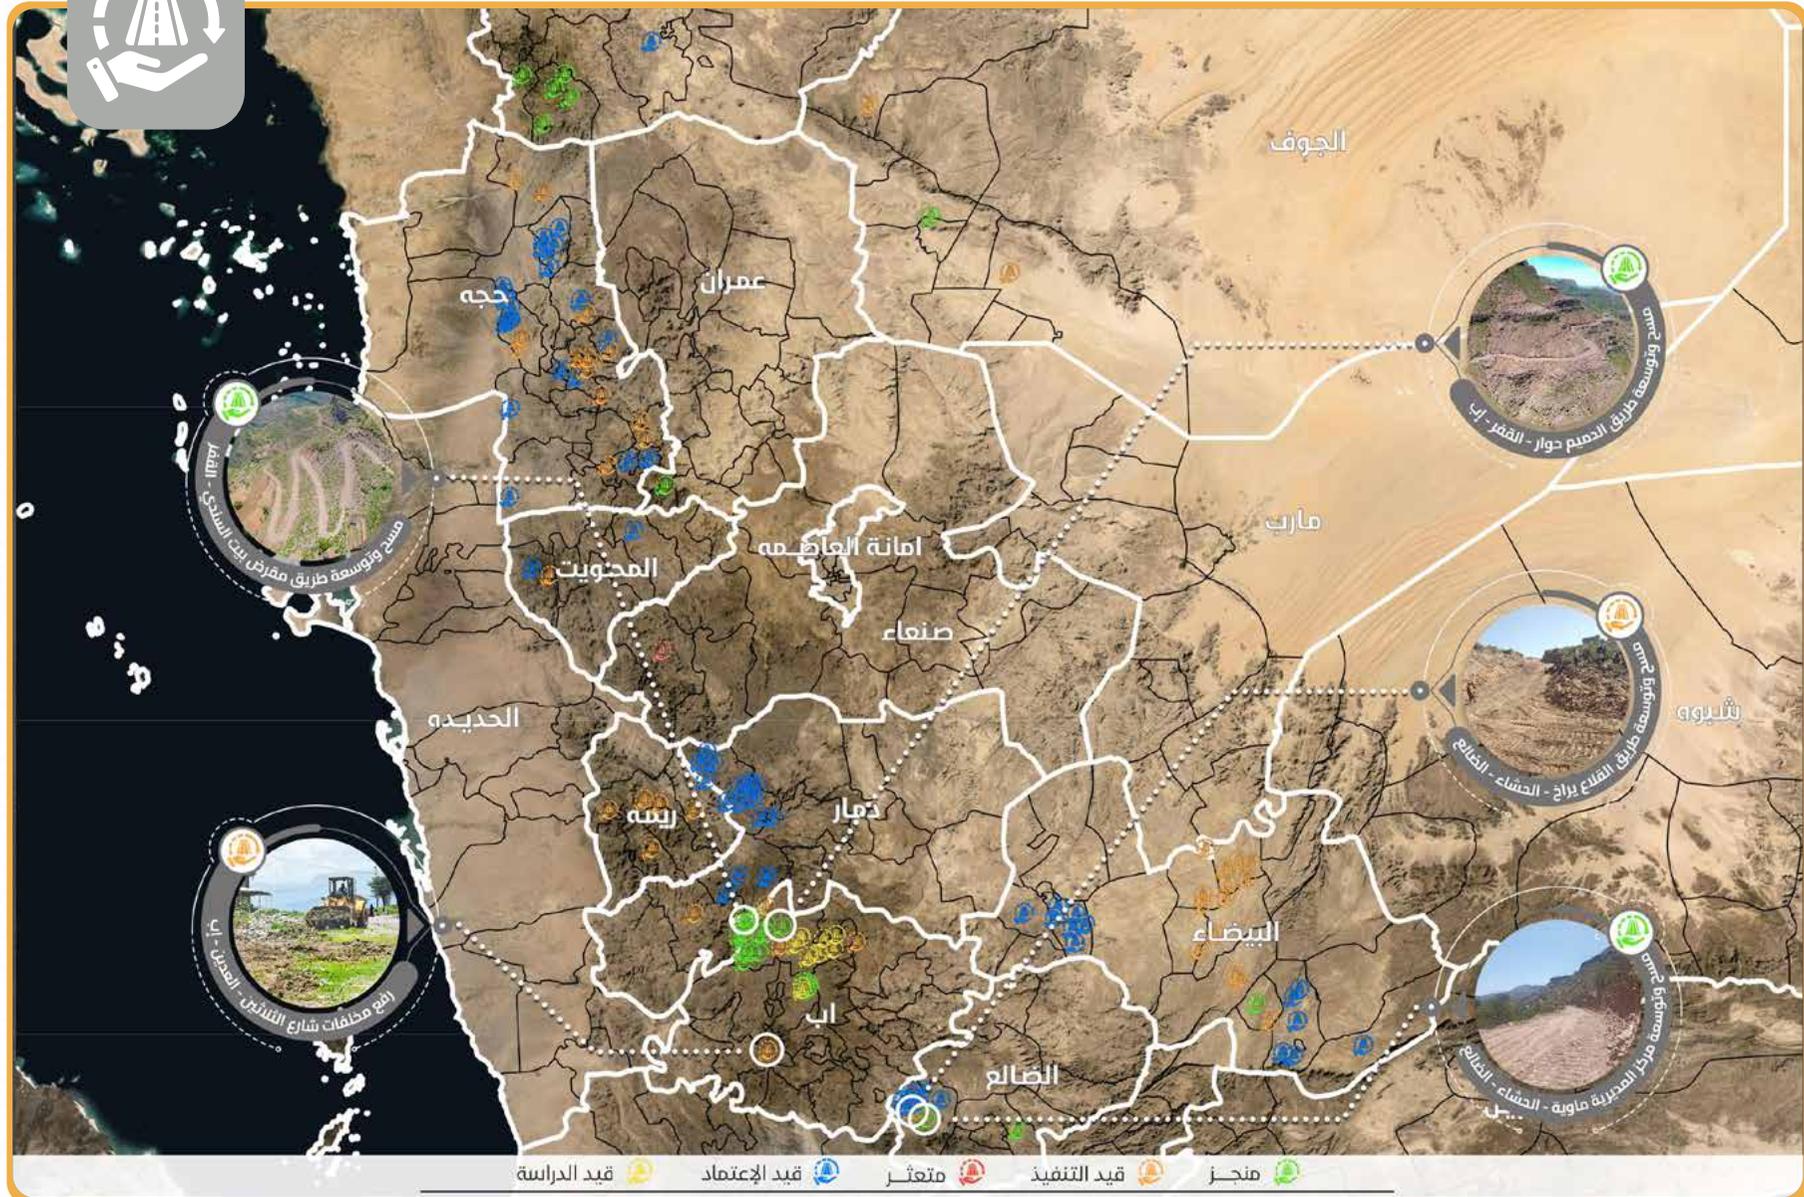



الجمهورية اليمنية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريعي
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U



الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U



الجمهورية اليمنية

وَدَارَةُ الْمُنَالِيسَةِ | وِدَارَةُ الْإِدَارَةِ وَالتَّنْمِيَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالرَّشِيدِ

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U

781010777

@cediuye

@cediu_ye

info@cediu.gov.ye



جميع الحقوق محفوظة © وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية | هاتف: +967 781010777

فاكس: +967 (1) 470960
