



وزارة المـاليــــة وزارة المـاليـــة والريفيـة وزارة الإدارة والتنميــة المحليــة والريفيــة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة Central Emergency Developmental Intrventions Unit





قال تعالــى:



فينسري الله والمعالم ورسولي والمعاون

(التوبة -105)



يجب التركيز على التنمية الريفية للحد من الهجرة إلى المدن، وتعزيز الخدمات الأساسية "**مثل تحسين جودة الطرق الريفية"** والمياه والصحة والتعليم.



السيـــد العلم/ عبدالملك بدر الدين الحوثي

سدفظه الله" —



هذا العام لدينا توجه كبير فيما يتعلق بالأرياف، مجالان مهمان سنركز عليهما هذا العام إن شاء الله تحسين الطـــرقات، ومياه الريف، من خلال هذين الموضوعين أقول لكم، وأقول لكل مدراء المديريات في محافظات الجمهورية اليمنية، وأقــول لـكل أبنـاء المجتمـع اليمني، أن المســؤولية تقـع علـى مدراء المديريات، لدينا الاستعداد في هذا العام لتغطية مشاريع كل العزل بمشاريع الطرق والمياه.

فخامة الأخ الرئيس/ مهـدي محمد المشـــاط

— رئيس المجلس السياسي الأعلى







تخلق وعورة الطرق كوابيس ومأسي حياتيه ومعيشية لعدد كبير جداً من المجتمعات في مختلف محافظات ومديريات وعزل الجمهورية اليمنية وتتفاقم معاناة المجتمعات الريفية النائية للوصول إلى مراكز الخدمات الأساسية (الصحة ، التعليم ، الغذاء) نتيجة إرتفاع تكاليف النقل والمواصلات من وإلى قراهم، ومن القرى إلى مركز المديرية، ومن وإلى الخدمات الصحية داخل وخارج المديريات، فتصبح في أبسط تفاصيلها شاقة، وقياس لهذا الدور والأثر المضاعف فإن قطاع الطرق من القطاعات الأكثر إستجابة لمتطلبات وظروف المرحلة الراهنة، ومن هذا المنطلق ظهر هذا البرنامج كإسهام من الوحدة في تحسين وصول المجتمعات في المناطق النائية والمحرومة والأشد حرماناً إلى مراكز توفر الخدمات الأساسية بأقل التكاليف وذلك عبر تحسين وتوسعة جودة وخدمة الطرق الريفية وتنمية البنية التحتية في مجال الطرق حيث تقوم الوحدة بتوفير وتشغيل معداتها والتكفل بكامل التكاليف اللازمة للتشغيل والتنفيذ.

إن برنامج توسعة وتحسين جودة وخدمة الطرق الريفية ليس مجرد مشروع لتطوير البنية التحتية فقط، بـل هـو إستثمار في مستقبل المجتمعـات الريفيـة المحرومـة، ويعـزز مـن قـدرة الدولـة على تحقيـق الإزدهـار والرخـاء لكافـة مواطنيهـا. الحمــد للــه رب العالــمين و الصلاة والــسلام على سـيدنا محمد و على آلــه الطيبين الطاهريــن .. بالرغم مــن الوضــع الراهــن وصعوبته فــي ظل الحــرب القائمة والحصــار إلا آننا فــي وحدة التــدخلات المركزية التنمويــة الطارئــة وضمــن برنامج توســعة وتحسين جــودة خدمة الطــرق الريفية قد اِســتهدفنا الطرق الريفية ســواءً شــق الطــرق الى القــرى المعزولة والأماكــن الريفية النائيــة والتي لم تصــل إليها الطريق مــن قبــل أو توســعة وتســوية الطــرق المشــقوقة ســابقاً والتي أصبحــت وعرة جــداً بفعــل العوامل الجويــة، حيــث نعتبر ذلك الخطوة الأولــى التي تحقق هدف ربط هــذه القرى والآريــاف النائية والمعزولة بالمــدن والمراكــز الحضريــة، علــى امــل يتــم تعبيدها فــي المراحــل القادمــة إن شــاء الله، إضافة الى التدخــل المبــاشر والفوري للمشــاريع الطارئــة مثل إصلاح أضرار الســيول في مواســم الآمطــار وغيرها

واملنا بالله كبير أن تنتهي الحرب وينتهي الحصار ونتفرغ لبناء وطننا الحبيب وتنميته ونهضته ومنها انشاء شبكات الطرق وتأهيلها ورفع مستوى شبكات الطرق الحالية بما يجعلها قادرة على استيعاب حركة المرور وأيضا تحقيق مســـتوى عالي من الأمان والراحة وتوفير للجهد والوقت والمال لمســـتخدمي الطرق وأيضا إســـتكمال البُنى التحتية لتحقيق الأهداف الإســـتراتيجية والطموحات المستقبلية لشعبنا العزيز والصامد.

إدارة الحركـة و تنفيــذ مشــاريع الطــرق









هو ربط المناطق الريفية النائية و القرى المعزولة بالمدن و المراكز الحضرية.





تيسير الوصول الى الخدمات الأساسية والأسواق لسكان المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة.





تحسين جودة خدمة الطرق الريفية من خلال شق وتوسعة وتسوية ورصف الطرق الريفية في مختلف المديريات والمحافظات في الجمهورية اليمنية، كذلك تقديم حلول مرنة ومستدامة عبر استخدام تقنيات حديثة، ودعم فرق العمل بالمعدات بما يتماشى مع المعايير العالمية لضمان استدامة الطرق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الريفية. و ذلك من خلال تطبيق أفضل معايير الإدارة والتنظيم لضمان جودة العمل، وتقليل التكاليف، مع تعزيز قدرة المعدات والفرق الميدانية على إنجاز المهام في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الكفاءة.



1

تحسين مستوى المعيشة في المناطـق الريفيـة المحرومـة والأشـد حرمانـاً: يعـد الوصـول الآمـن والسـهل إلـى الطـرق أحـد أهـم العوامــل التي تؤثـر علـى جـودة الحيـاة. حيـث يسـاعد علـى تمكـين المجتمعــات مــن الوصــول إلــى الخدمــات الأساسـية والضروريــة. مثــل المستشــفيات والمــدارس والأســواق، بشــكل أسرع وأكــثر أمانـًـا.

تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية المحرومة: الطرق هي الركيزة الأساسية لخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية حيث تساهم في نقــل المنتجــات الزراعيــة والبضائــع المحليــة، إن تحســين الطــرق الريفيــة يفتـح فرصــاً جديــدة للمزارعـين وأصحــاب المشــاريع الصغــيرة مــن خــلال التواصــل مــع الأســواق بســهولة.

تقليل تكاليف النقل والتنقل: من خلال توسعة وتحسين جودة الطرق، يقلل البرنامج من تكاليف النقل والتنقل على المجتمعات الريفية، مما يوفر وقتًا وجهدًا وموارد تعود عليهم بالنفع والفائدة.

دعــم الاســتقرار الاجتماعـي: مــن خــلال ربــط المجتمعــات الريفيــة بمراكــز الخدمـــات الأساســية وتوفــير بنيــة تحتيــة ملائمــه تســهم فــي تعزيــز الإســتقرار المجتمعــى والحــد مــن الهجــرة نحــو المــدن.

رفـع مسـتوى السـلامة والأمـان فـي الطـرق الريفيـة: تخفيـف وعــورة الطـرق الريفيـة مـن خـلال توسـعة وتحسـين جـودة خدمـة الطـرق الغـير مؤهلـة يسـهم فـي تقليـل الحــوادث المروريـة والإصابـات ويحافـظ علـى حيـاة المواطنـين.

دعــم التنميــة المســتدامة للمناطــق المحرومــة: تعتمــد التنميــة المسـتدامة علـى التــوازن بـين تنميــة المــدن وتطويــر المناطــق الريفيــة، إن تحسـين جــودة الطـرق الريفيـة والحـد مــن فجــوة التنميــة الريفيــة هـي عنــاصر أساســية لتحقيــق هــذا التـــوازن لتعزيــز مــن قـــدرة المجتمعــات الريفيــة علــى النمـــو المســتدام.

أهميــة برنامج

توسعة وتحسين جودة خدمة الطـرق الريفية

يمثل برنامج توسعة وتحسين جودة وخدمة الطرق الريفية ركيزة أساسية لسد وإغلاق فجوة التنمية في المناطق المحرومة والأشد حرماناً، حيث تتجلى أهميته في النقاط التالية:



900

تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية:

المساهمة الفاعلـة فـى تحقيـق التنميـة المجتمعيـة للمناطـق المحرومـة والمعزولـة فـي مجـال الطـرق.



تعزيز الشراكات المحلية:

العمل مع السلطات المحلية لضمان أن المشاريع تتماشـــى مـع احتياجـــات وأولويـــات المجتمعـات المستهدفة



تحقيق التنمية المتوازنة:

تعزيز التوازن التنموى بين المناطق الريفية والحضرية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



توفير فرص اقتصادية حديدة:

تسهيل نقل المنتجات الزراعية والبضائع، مما يعزز من اقتصاد المناطق الريفية.



رفع مستوى السلامة:

توفير طرق آمنـة للمواطنين، مما يقلـل مـن حـوادث الطرق ويحسن من مستوى الأمان.

رفع مستوى البنية التحتية:

إنشاء وصيانة الطرق وفقاً لأعلى المعايير، بما يعزز من جودة الحياة ويسهم في التنمية الاقتصادية.



تخفيف التكاليف وزيادة الكفاءة:

توفير المعادات والدعام الفنى المطلوب للجهات المحلية، مما يساهم في تقليل تكاليف الصيانة ويزيد مـن كفـاءة المشـاريع.



تحسن الحركة والتنقل:

تقليــل الوقــت والجهــد للوصــول إلــى الخدمــات الأساسية، ممـا يحسـن مـن ظـروف العيـش.





التنمية الاحتماعية:

توفير بيئـة مناسـبة تسـاهم فـي اسـتقرار الأسر وتقديــم فــرص جديــدة للشــباب.



البرنامـد

آليات وإجراءات التنفيذ لمشاريع البرنامج

(2)

5

4

دراسة إحتياج المشاريع:

- اســــتقبال طلبات الإحتياج لتنفيذ مشـــاريع من قبل الســلطة المحلية.
- ◄ إجـراء دراسـات إحتيــاج المجتمــع لتحديد
 المشــاريع ذات الأولويــة.
- ◄ تحديد أولويات المشاريع بناءً على المعايير الإقتصادية والإجتماعية والتنموية.
- استهداف المناطـق المحرومـة والأشـد حرماناً.

إعــداد التصاميــم والدراســات الفنيـــة للمشــاريع:

- إعــداد تصاميــم هندســية للطــرق بمــا يتناســب مع المعايير الفنية والهندســية.
- إستيعــاب كافـــــة المســـارات والطـــرق (الرئيســية ، الثانويــة ، الفــروع) لضمــان وصول الخدمات لكافة المســتفيدين في المناطــق المحرومة.
- مراعــاة الظــروف المناخيــة والجغرافيــة للمناطــق المســتهدفة.

الإعداد لبدء التنفيذ:

(3)

- إعــداد خطــط ســير لمعــدات الوحــدة العاملــة فــي المناطــق المســتهدفة.
- التأكـد مــن جاهزيــة المعدات للتشــغيل وتحريكهــا لمواقــع التنفيذ.
- ▼ توفــير متطلبات تشــغيل المعدت (وقود ، زيوت ، شــحوم ... الخ).
- تكليـف مهندسـين للإشراف علـى التنفيذ وإختيار سـائقين ذو كفاءة عالية لتشــغيل المعدات.

مرحلة التنفيذ الفعلي:

- مراقبــة ومتابعــة ســير عمليــة تنفيــذ المشــاريع وتقييم جودة الأعمال المنفذة.
 - التأكيد مــن عــدم تعـــثر المشــاريع وحــل الإشــكالات التــي تعـــترض ســير عمليـــة التنفيـــذ.
 - ▼ تجميـع كافــة تقاريــر المشــاريع والتوثيق لمراحــل التنفيذ.

الإنجــاز والإغــلاق للمشــاريع المنفــذة:

- إعداد تقارير الإنجاز للمشاريع المنجزة.
- عمــل محــاضر الإغلاق للمشــاريع التي تم تنفيذها.
- تســليم المشــاريع المنجــزة للســلطة المحليــة.



المعدات المستخدمة في البرنامج









محــــــطات هامة في برنامــج توســعة وتحــسين واستدامة جـودة خدمة الطرق الريفية

1. تأسيس الوحدة :



منذ تأسيس الوحدة في أواخر شهر أغسطس للعام 2022 م كانت الطرق من آهم إهتمامات الوحدة إن لم تكن أهمها حيث وأنه من الأيام الأولى للتأسيس تم التوجه لدعم المبادرات المجتمعية في مجال الطرق في محافظتي حجة والمحويت وبعدها بفترة وجيزة توجهت الوحدة لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية في محافظة صعدة وخلال هذه الفترة كان العمل مقتصر على الجهود البشرية ولم يستخدم أيّ من المعدات الثقيلة التي تعمل في الطرق.

4. **استئجار معدات إضافية لإنجاز المشاريع:** محل نظراً لةاليد طلبات اعتماد مشاريع الطرق في مختلف المدر

نظرا لتزايد طلبات اعتماد مشاريع الطرق في مختلف المديريات في مختلف المحافظات، وبالرغم من أن الوحدة قد وفرت العديد من المعدات بحسب إمكاناتها المتاحة إلا أن الاحتياج الطارئ لتنفيذ بعض المشاريع كان آكثر مما تملكه الوحدة ومما هو متوفر لديها مما استدعى استئجار بعض المعدات لإنجاز بعض المشاريع الهامة والطارئة.

2. استخدام المعدات الثقيلة :



بعد مرور عدة أشهر من تأسيس الوحدة حدثت سيول في منطقة قدم الغبر في محافظة صعدة وتسببت في آضرار كبيرة في الطريـق والتي لا يمكـن إصـلاح هـذه الأضرار إلا بمعـدات ثقيلـة وعندهـا قامـت الوحـدة بتوفـير معـدة بكلـين بشـكل طـارئ لإصـلاح الأضرار وكانـت هـذه بدايـة اسـتخدام المعـدات الثقيلـة.

5. إ**دارة الحركة وتنفيذ المشاريع:** التي وفرتها الوحاد المعدات التي وفرتها الوحاد المعدات التي وفرتها الوحاد التيامية المسلمية التيامية ال


68% 24%


3. شراء الوحدة للمعدات والبدء بالتدخل المباشر:





نتيجة تزايد عدد المعدات التي وفرتها الوحدة للعمل في مشايع الطرق وتبعاً لهذه الزيادة زيادة عدد المشاريع وما تحتاجه هذه المعدات من متطلبات وأيضا لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل هذه المعدات وتنفيذ المشاريع في الميدان والتي شكلت ضغط كبير وأعباء إضافية للوحدة، استدعى هذا كله فصل إدارة الحركة والصيانة الى إدارتين (إدارة الحركة وتنفيذ مشاريع الطرق - إدارة الحركة وتنفيذ مشاريع الطرق مستقل عن الإدارات الأخرى وتسليم إدارة الحركة وتنفيذ مشاريع الطرق الى مهندس ذو خبره طويلة وكفاءة عالية قادر على معالجة الإشكاليات وتخطي العقبات وتجاوز الصعوبات، وفي أواخر شهر إبريل من العام 2024 م تم إستلام مهام الإدارة والبدء في إنجاز المهام المنوطة بها، حيث بدأت الإدارة في حل المشاكل العالقة والإنطلاق بمستوى الإنجاز وزيادة زخم المشاريع ورفع كفاءة وجودة التنفيذ.




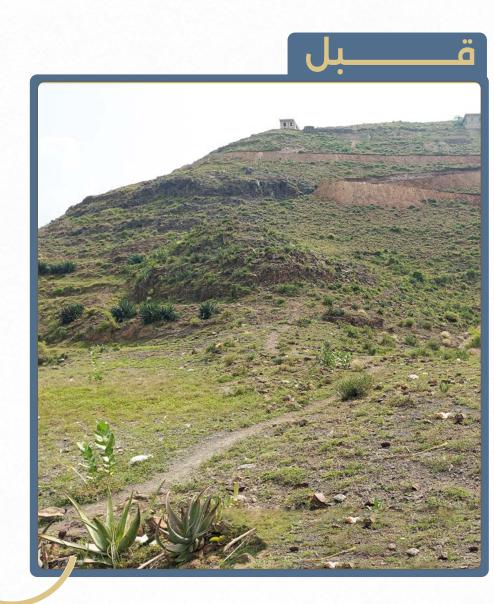


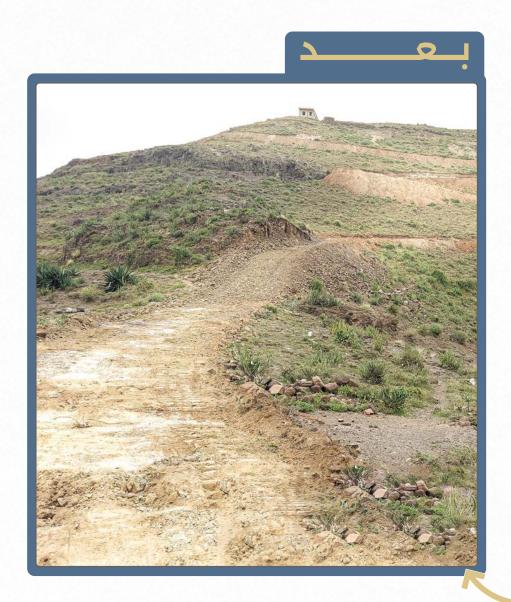


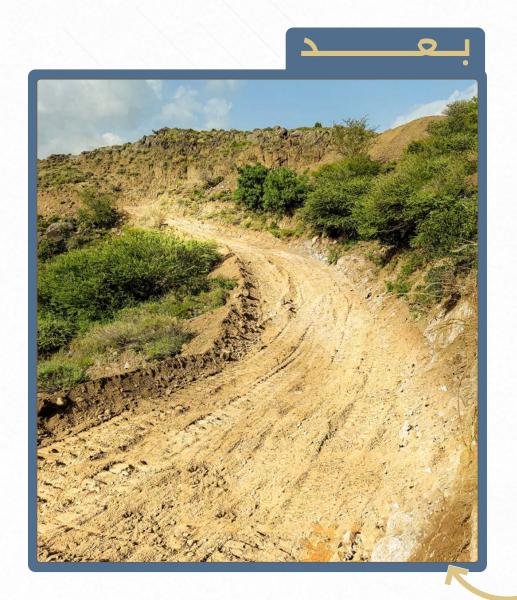


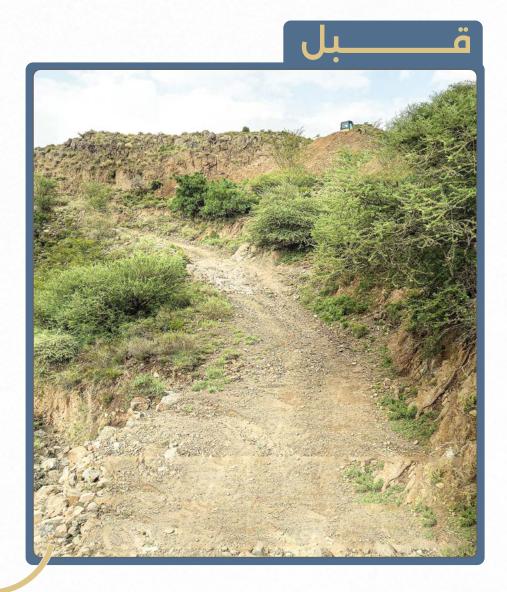

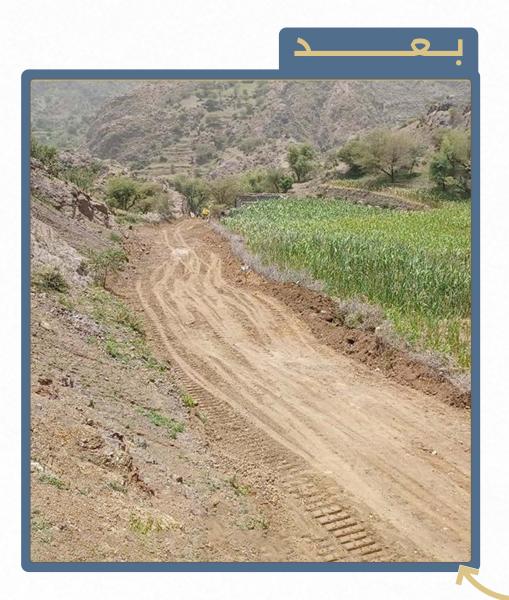

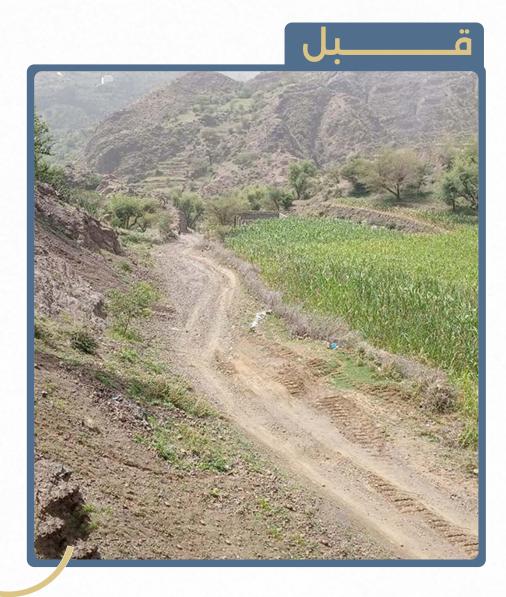

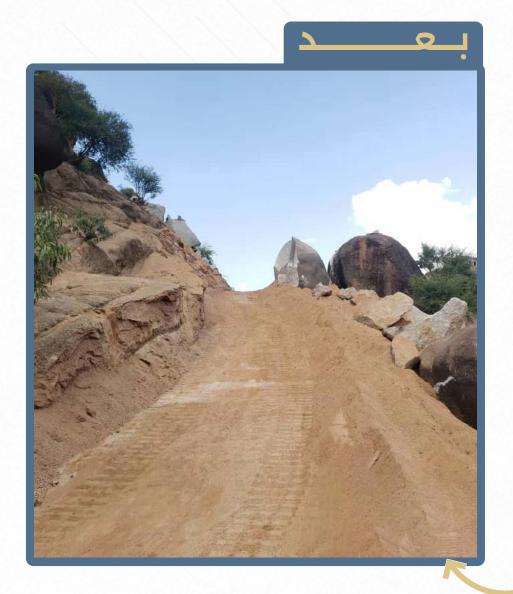

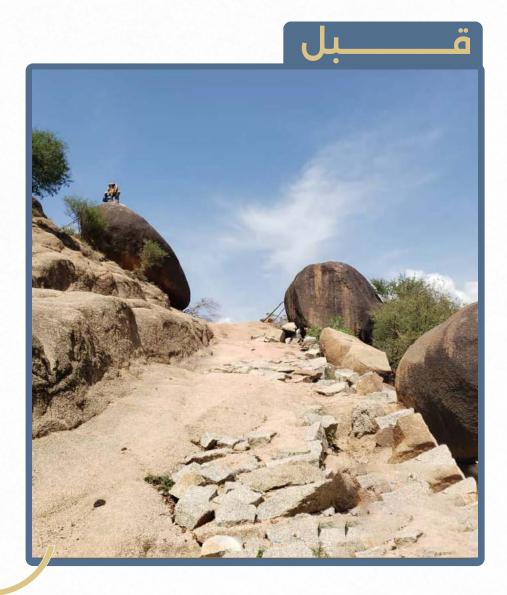



المحافظات (ع) المستهدفة


إجمــــاليـ المديريــات المستهدفة إجمــــاليـ المحافظات المستهدفة


52

12 محافظة

إجمالي عدد المشـــاريع

520




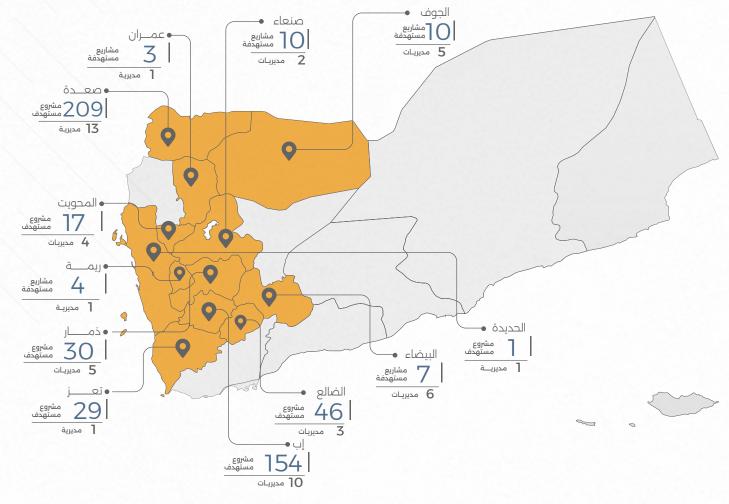

اليستهداف



تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكبر شريحة من المجتمعات الأكثر إحتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الإتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية 1,935,864 نسمة،

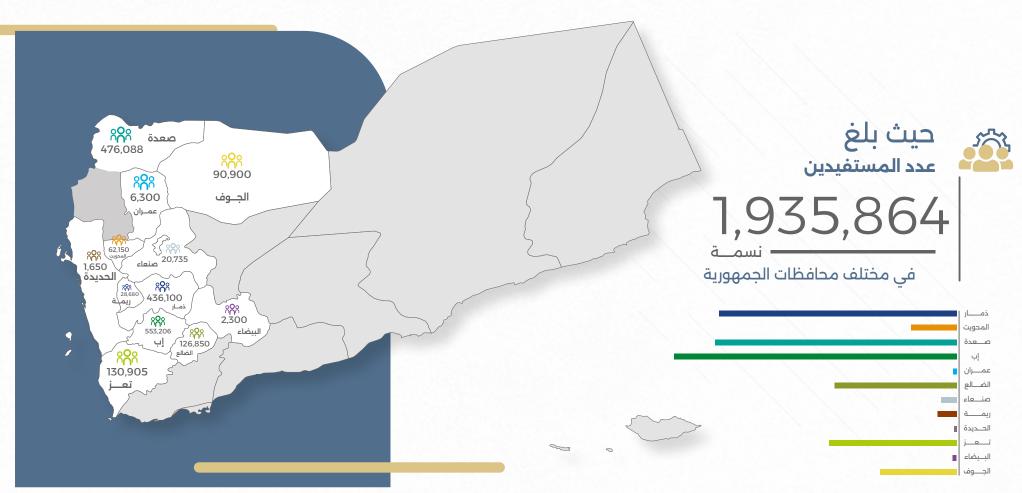

إجمالي تكلفة المشـــاريع



التكلفة المتبقية

3,763,217,036



التكلفة المنفذة


2,972,853,492



التكلفــة التقديرية

6,736,070,528



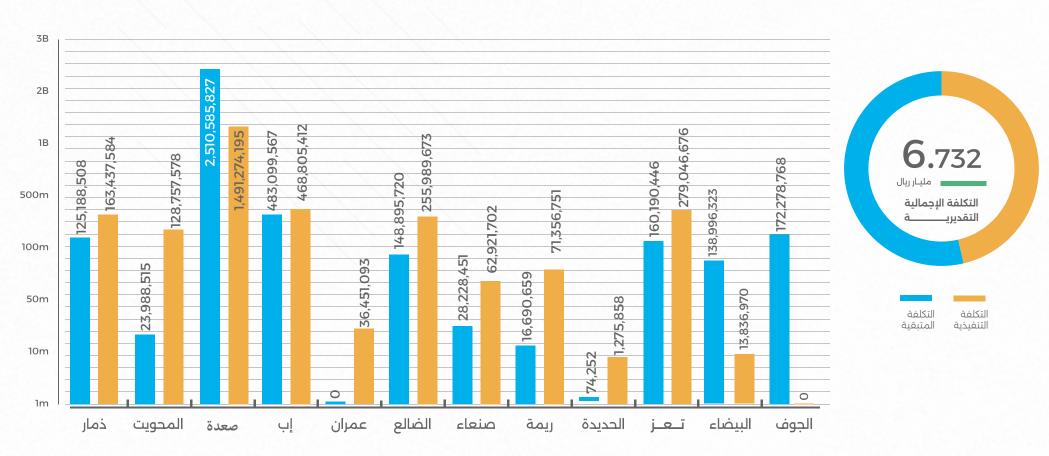








خلاصة الوضع العام لمحافظة ذمار









شــــــق و تــــوســـعة				
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صـخــري	
42,791	21,215	42,312	29,673	
م.ط	3م	36	36	














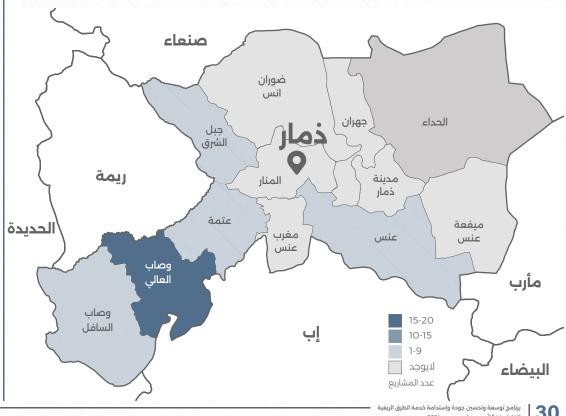








من واقع **الميـدان**



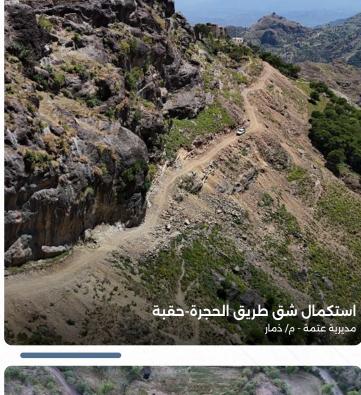












من واقع **الميـدان**






جانب من أعمال وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المناطق المتضررة جرّاء الأمطار والسيول وفتح الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل مصاريف المياه في عزلة بني موسى مديرية وصاب السافل.



مسارات مشاريع توسعة وتحسين جـــودة خدمـــة الطـــرق الريفيـــة

محافظة ذمار

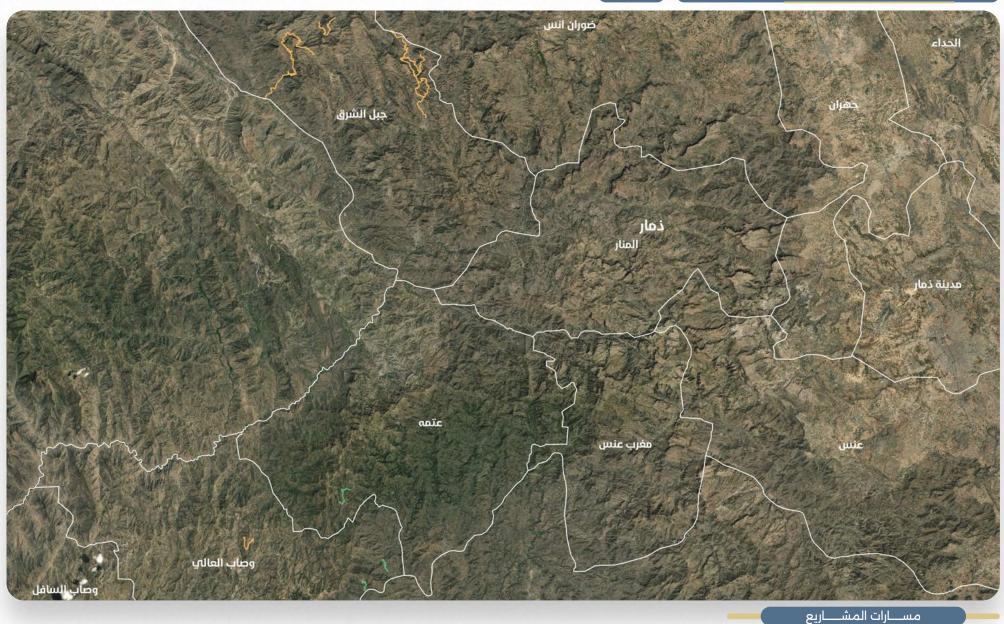







خلاصة الوضع العام لمحافظة المحويت










شـــــــق و تــــوســــعة				
مسح و تسوية	تــــرابـــي	مختلط	صــخــري	
80,997	40,153	48,212	9,472	
م.ط	م3	م3	م3	

62,150 🕰 17 مستفيد





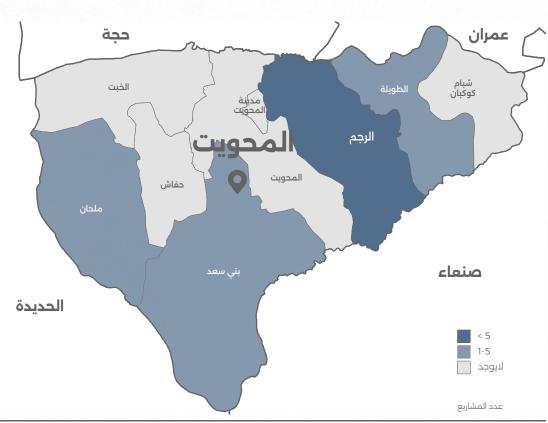







من واقع **الميـدان**









مسـارات مشـاريع توسـعة وتحـسين جــــودة خدمــــة الطــــرق الريفيـــة

محافظة المحويت







خلاصة الوضع العام لمحافظة صعدة




عدد المشاريع عدد المستفيدين

عدد المشاريع عدد المستفيدين

	1	صفراء
-	1	سحار

59,962	17	بني بحر
03,468	115	حيدان
6,000	10	ساقين
11,214	4	شداء
42,420	7	غمر
22,686	9	كتاف
3,850	5	مجز
2,800	1	منبة
0,900	2	آل سالم
22,276	13	الحشوة
50,843	23	الظاهر








شـــــــق و تـــــوســــعة			
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صــخــري
342,926	132,205	373,041	133,881
م.ط	م3	36	م3

476,088 2 209 13 9


63%	37%
2,510,585,827	1,491,274,195
تكلفة المشاريع المتبقية (ريال)	تكلفة المشاريع المنفذه (ريال)



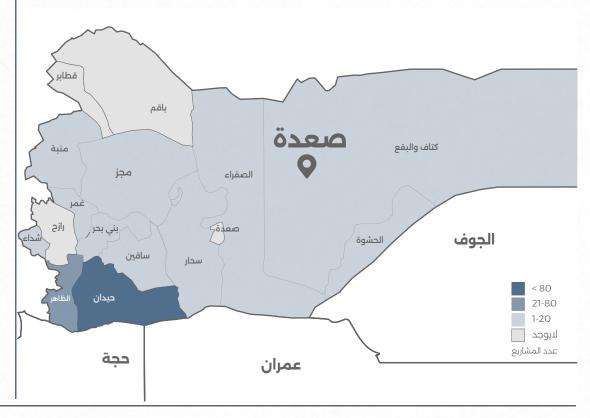





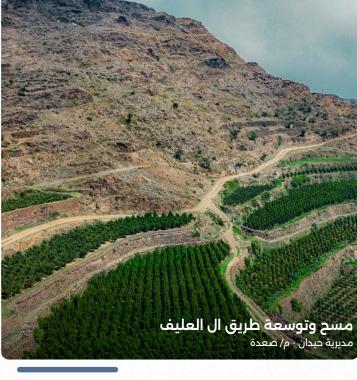









عدد المستفيدين

42,700

24,890

1.185

246,471

63,590

15,000

124,012

13,523

عدد المشاريع

45

25

45



خلاصة الوضع العام لمحافظة إب

العدين المخادر

النادرة

حزم العدين

فرع العدين

مذيخرة

يريم

حبيش


جبلة






154


10 9



906.9





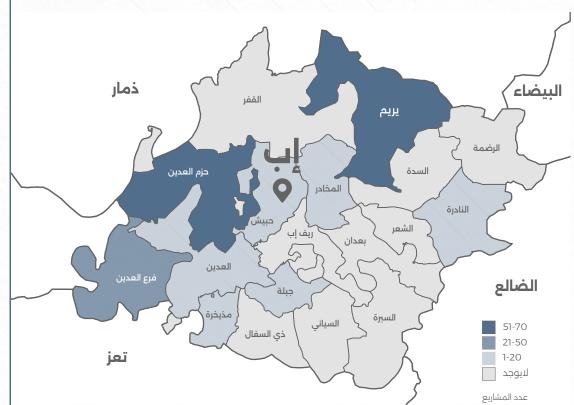



شــــــق و تــــوســــعة			
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صخري
313,673	191,014	131,395	22,484
م.ط	م3	م3	32







مسح وتوسعة طريق نجد العدن - الاحكوم مديرية خزم العدين - م/ إب



من واقع **الميـدان**




شق طريق القحاطنة مديرية فرع العدين - م/ إب

محافظة إب



مسارات مشاريع مديرية المخـادر

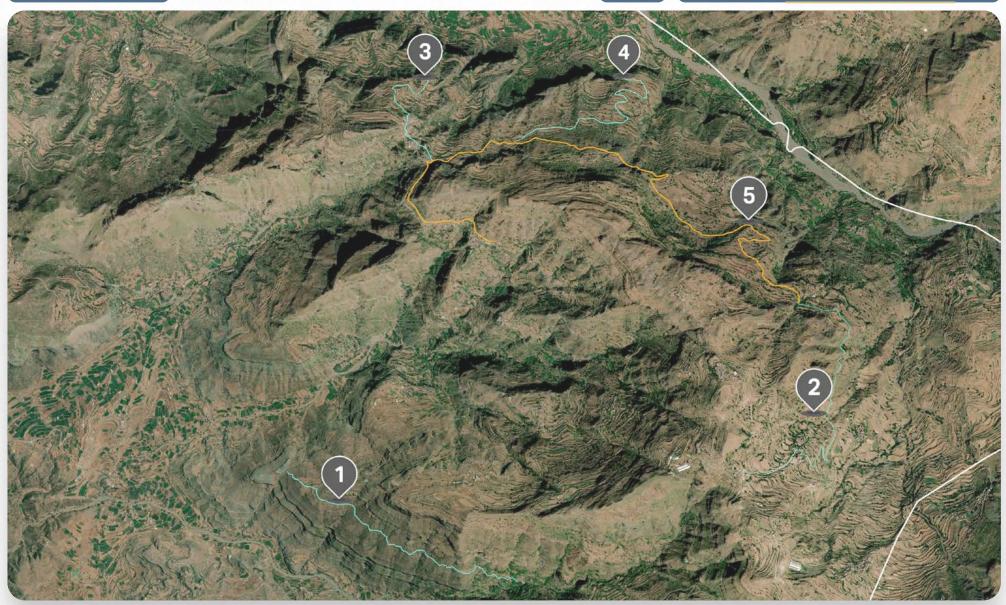


مسارات مشاريع مديرية يريـــــم



مسارات مشاريع توسعة وتحسين جـــودة خدمـــة الطـــرق الريفيـــة


محافظة إب

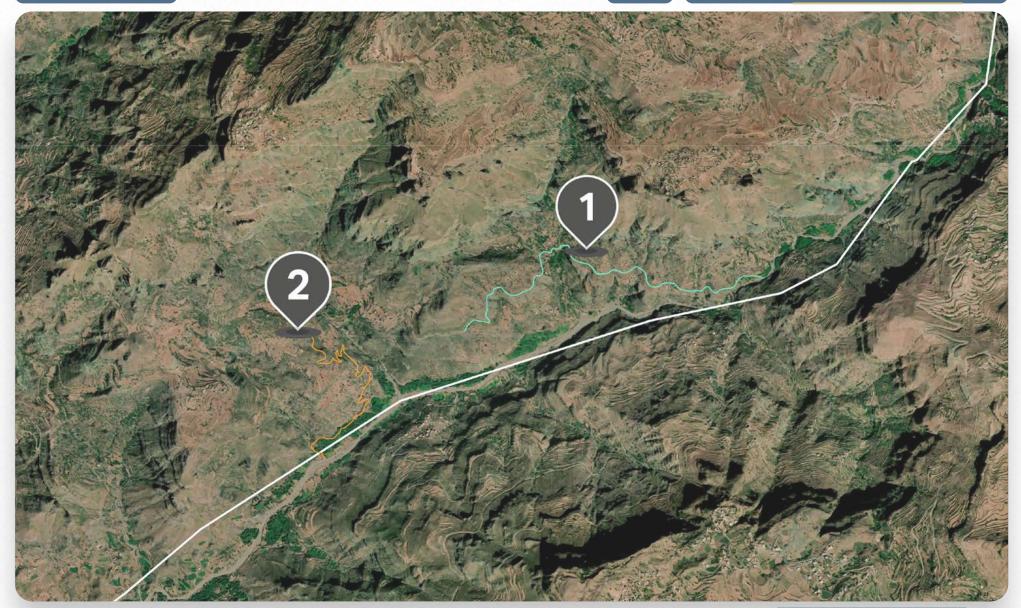

محافظة إب



مسارات مشاريع مديرية حزم العدين

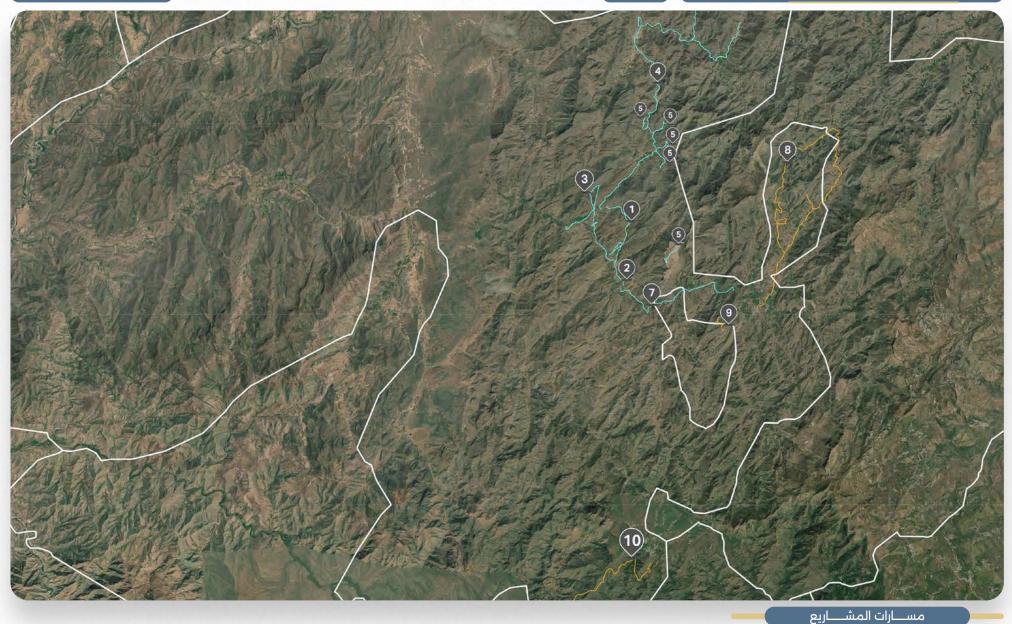


مسارات مشاريع مديرية فرع العدين



مسـارات مشـاريع توسـعة وتحـسين جـــودة خدمـــة الطـــرق الريفيــة

محافظة إب

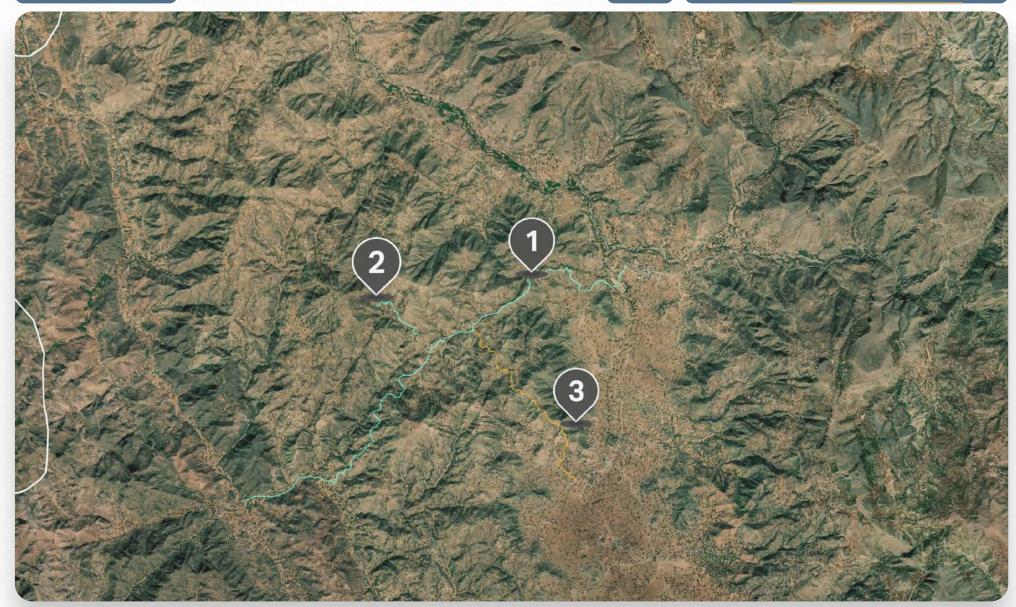






خلاصة الوضع العام لمحافظة عمران



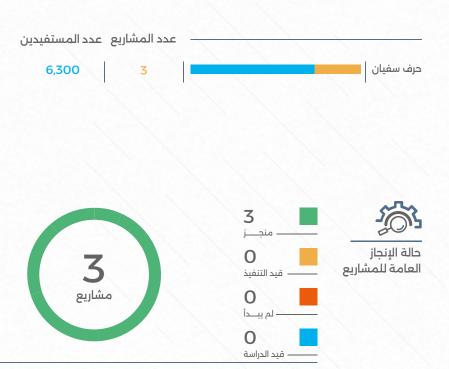









ىة	وسع	ــــــق و تــ	شـ
مسح و تسوية	تـــرابــي	مخــتــلط	صخري
66,617	7,148	9,670	2,231
م.ط	3م	3,2	م3



















خلاصة الوضع العام لمحافظة الضالع










ىة	وس	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	شـ
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صخري
107,149	60,019	56,997	32,706
م.ط	3م	3,9	م3







37%	63%	/- O/-
148,895,720	255,689,673	404.5
تكلفة المشاريع المتبقية (ريال)	تكلفة المشاريع التنفيذية (ريال)	القال القال

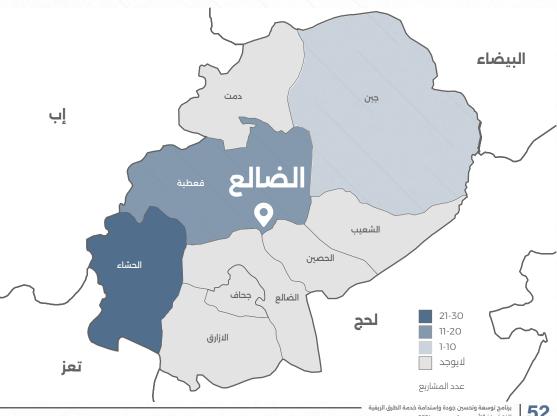


















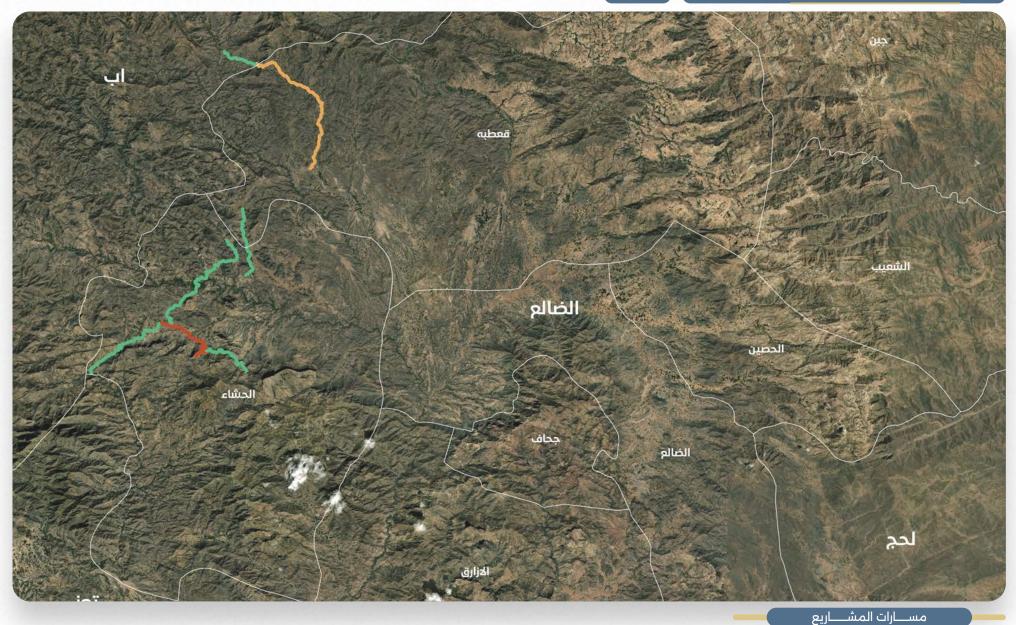





خلاصة الوضع العام لمحافظة صنعاء










ــــوســــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	شـ
تـــرابـــي	مخــتــلط	صخري
23,386	18,909	6,004 3,a
	تـــرابـــي	مخــتــلط تــــرابـــي 23,386 18,909







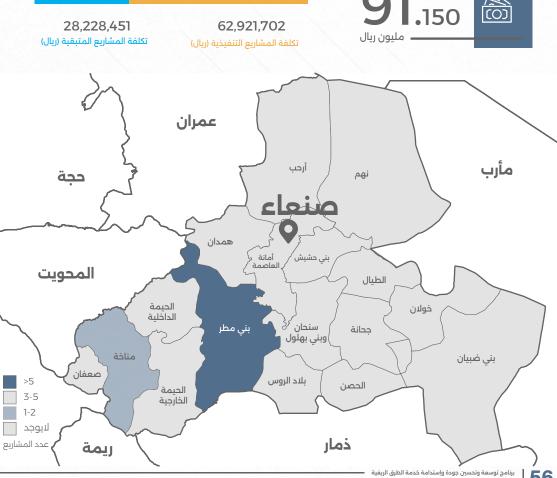










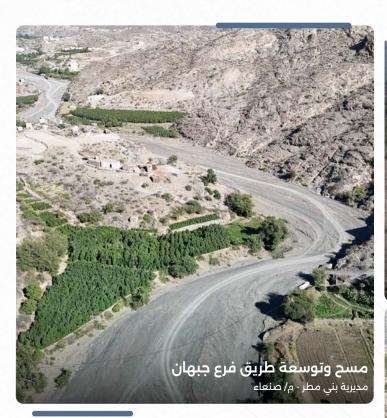




محافظة صنعاء

مسارات مشاريع توسعة وتحسين جـــودة خدمـــة الطـــرق الريفيـــة



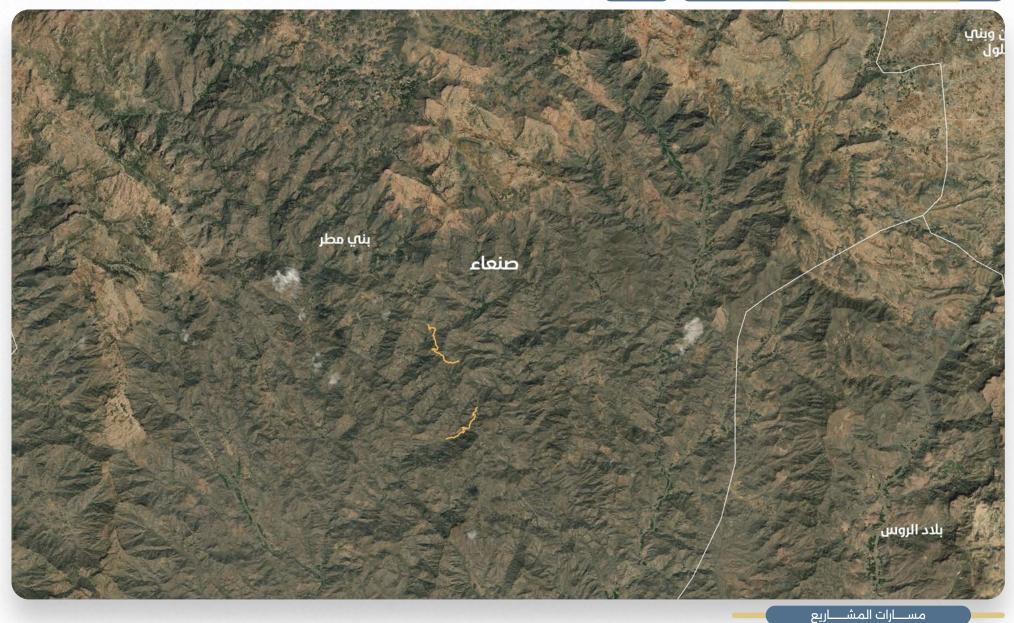






خلاصة الوضع العام لمحافظة ريمة









ىة	وس	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	شـ
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صـخــري
7,201 م.ط	15,731 عم	17,294 م	11,095 م3












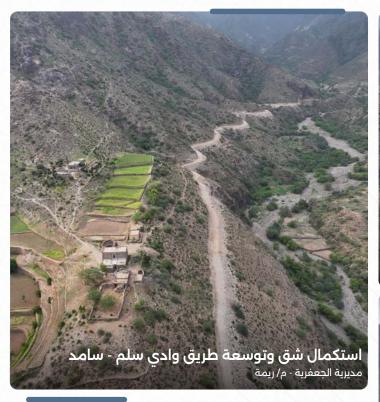





مديرية الجعفرية - م/ ريمة

استكمال شق وتوسعة طريق وادي سلم - سامد











خلاصة الوضع العام لمحافظة الحديدة

لايوجد عدد المشاريع



تعز

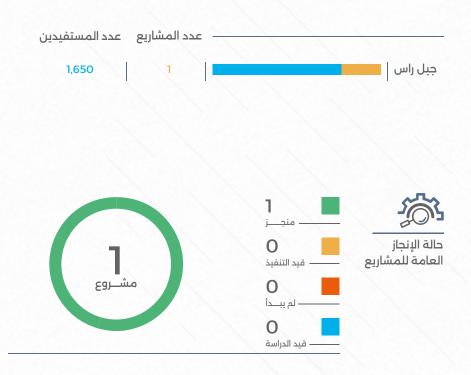

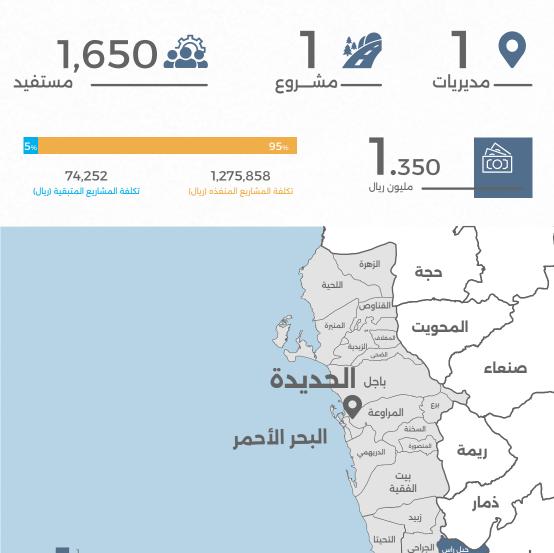




ىة	وسع	ــــــق و تــ	شـ
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مختلط	صــخــري
2,929	850	120	-





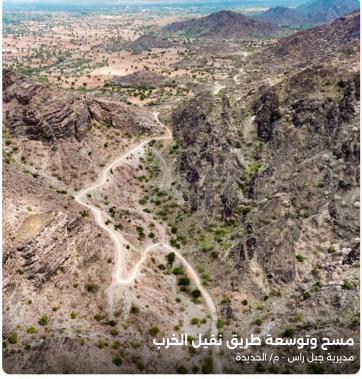












ً خلاصة الوضع العام لمحافظة تعز

36%

(ریال)









ىة	وسع	ــــــق و تــ	شـ
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مختلط	صخري
123,110 م.ط	58,893 عم	46,464 3م	13,863 م







	64%	7.70
160,190,446	279,046,676	459. 2 مليون ريال
تكلفة المشاريع المتبقية	تكلفة المشاريع المنفذه (ريال)	الميون ريان













مسح وتوسعه طرق مقهايه انعم - العميضيه - الكرابده الزيلعي - الحيضان - الضاجع - السياله - مفرق الوريف مديرية مقينة - م/ تعز











من واقع **الميــدان**






جانب من أعمال وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المناطق المتضررة جرّاء الأمطار والسيول وفتح الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل مصاريف المياه في مديرية مقبنة.



مسـارات مشـاريع توسـعة وتحـسين جـــودة خدمـــة الطـــرق الريفيـــة

محافظة تــعـــز

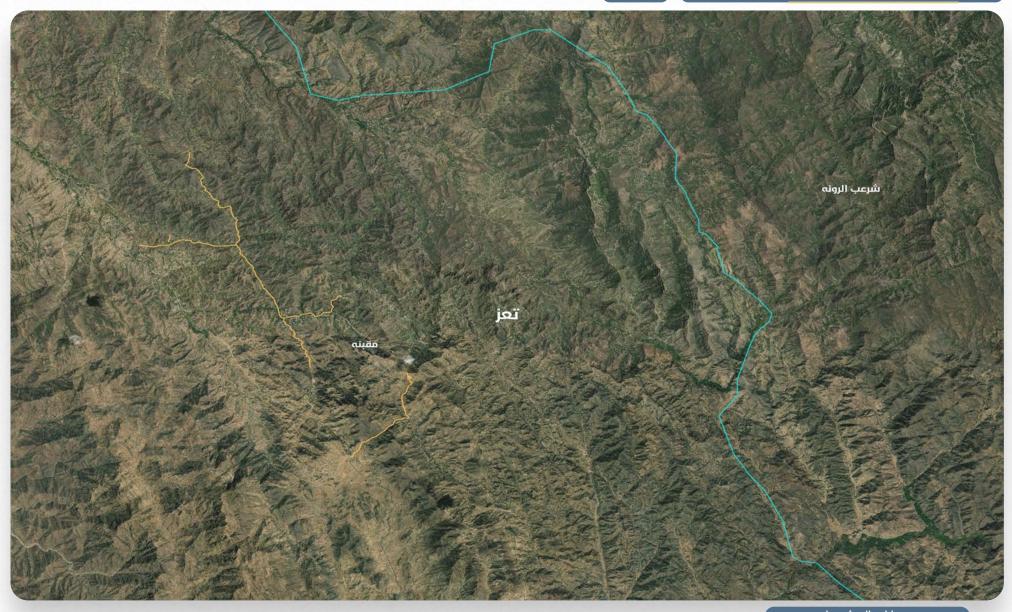

محافظة البيضاء



خلاصة الوضع العام لمحافظة البيضاء



















محافظة الجوف الجوف



خلاصة الوضع العام لمحافظة الجوف







شــــــق و تــــوســـعة			
مسح و تسوية	تـــرابـــي	مخــتــلط	صخري
- م.ط	- 3م	- عم	- ع










100%	0%
172,278,768	
تكلفة المشاريع المتبقية (ريال)	تكلفة المشاريع المنفذه (ريال)





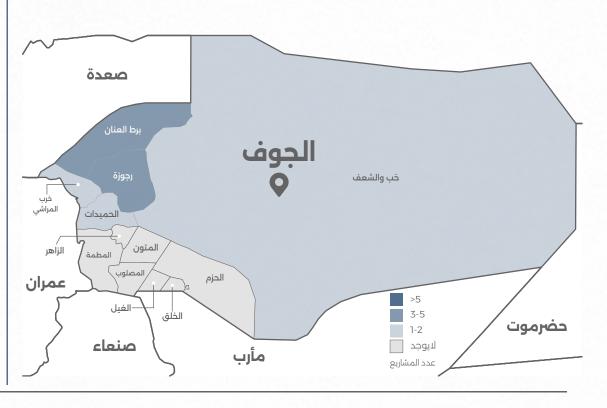



	شروع	ـــالة الم	٦		تكلفة المشروع		ات المنجزة	الكمي		تكلفة المشروع	22E	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	و
نسبة الإنجاز (%)	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لاربة طبيعية (م")	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
100%				1	5,501,600	0	215	2,800	1,175	7,719,792	1,200	شق صخري - تسوية	شق وتوسعة طريق الاثغار الظلعة			1
100%				1	6,097,300	0	2,118	1,976	1,388	6,168,189	600	شق صخري - تسوية	استكمال شق طريق الحجرة-حقبة			2
0%		1			0	o	0	0	0	6,800,492	8,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الضبورة	عتمة		3
0%	1				0	0	0	0	0		-	شق	شق طريق الموسل - سلف العقد			4
100%				1	595,676	2,174	0	0	0	569,247	5,000	مسح وتسوية	مسح وتسوية طريق الجمعة الدن			5
100%		1	ļ	1	15,686,552	9,900	1,350	4,235	1,260	16,727,244	16,500	مسح وتسوية وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة طريق جعر _ خدمان _ الحيث			6
100%		-		1	4,082,923	7,152	810	1,250	0	4,496,231	5.000					7
100%		-		1								مسح وتسوية	مسح وتوسعة طريق وادي عيبة - مغربة الوسط - القصاعي			
				ļ	4,560,000	1,948	2,222	959	513	4,641,094	600	شق وتسوية	شق وتسوية أرضية مدرسة النصر - خدمان + أرضية مدرسة الشرقي - جعر			8
100%				1	4,497,372	5,361	450	1,825	0	13,743,986	5,000	توسعة ومسح	طربق الاجعود احد عمق			9
100%				✓	2,959,679	14,500	170	0	0	4,555,909	32,000	مسح وتسوية	مسح طريق مغربة صعر كبود			10
100%				1	2,230,484	1,250	2,127	343	0	4,321,266	7,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الظاهر-الفاج الوكر			11
100%				1	5,539,780	0	0	476	2,860	8,054,573	-	توسعة صخرية	توسعة وتسوية طريق الاجعود - احد عمق			12
100%				✓	15,097,200	0	0	2,274	5,269	16,576,569	5,000	شق صخري -تسوية	إستكمال شق وتوسعة طريق الهيجة العوافل - النجد الأجعود			13
100%				1	6,635,960	0	300	3,080	0	7,808,382	33,200	مسح وتوسعة	مسح طريق زاجد كبود +استكمال طريق قرية العارضة	وصاب العالي	ंठी	14
93%			1		15,418,740	0	688	4,368	3,344	9,910,342	10,000	شق	استكمال شق طريق مغربة الوسط السخيم		1	12 13 14 15
58%			1		13,864,400	506	4,568	3,545	3,270	15,134,817	20,000	شق صخری -تسویة	استكمال شق طريق النجد -محزر- وادى رماع			16
66%		+	1		28,950,182	0	3,127	2,596	9,232	40,968,679	10,000	- شق صخری -تسویة	شق طریق بنی مسعود			
100%				1	13,442,678	0	1,593	5,749	1,363	7,212,664	-	- استكمال شق	 استكمال شق طريق قرية العارضة			18
0%		1			0					3,392,034	600	شق	شق طريق مغربة موزك - مقارة سايلة الورك			19
0%		1			0	0	0	0	0	7,566,392	7,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحلة والبرحة الجبجب			20
0%		✓			0	0	0	0	0	4,653,986	5,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق محطة عوبل - سوق يحضر			21
0%		1			0	0	0	0	0	11,600,043	10,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الديادير دبابة وادي رماع			22
0%		1			0	0	0	0	0	11,969,643	20,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق غربي غيثان القائمة			23
0%		✓			0	0	0	0	0	13,132,892	2,000	شق وتوسعة	استكمال شق وتوسعة طريق زاجد هصة			24
90%			1		13,027,058	0	1,479	6,836	0	5,874,630	8,000		مسح وتوسعة طريق الجمعة مغربة العنب المتصل بطريق الحيمة صنعاء	جبل الشرق		25
0%		✓			0					5,395,424	400		مسح وتوسعة طريق السنافي	G/ 5		26
100%				1	1,750,000	0	0	0	0	-	200,000		معالجة اضرار السيول في المناطق المنكوبة قرية الحصب وادي حطب - م/ وصاب السافل	وصاب السافل		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
27%			1		3,500,000	0	0	0	0	22,357,997	,	فتح طرق وإزالة مخلفات	معالجة اضرار السيول في المناطق المنكوبة الخط الرئيسي- خط ذمار الحسينية - م/ وصاب السافل	Ç		28
0%		1			0	0	0	0	0	20,597,624	12,000	مسح وشق وتوسعة	شق طريق بخران - الشماحي	wie		29
0%		✓			0	0	0	0	0	6,675,951	12,000	توسعة	استكمال شق طريق عمد		<u> </u>	30
58%	1	10	5	14	163,437,584	42,791	21,215	42,312	29,673	288,626,092	436,100		اجمالي محافظة ذمار		·	
100%	ļ		ļ	1	24,490,933	22,420	4,573	7,356	2,001	12,742,342	13,500	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة طريق عقبة المحطة_ هوع	بني سعد		31
100%		1	ļ	1	16,199,543	15,409	4,743	7,611	0	11,646,897	10,500	مسح وتوسعة	استكمال الاعمال الاضافية بمشروع شق وتوسعة طريق عقبة المحطة_ هوع		المحويت	31 32 33 34 35 36
100%		-		1	12,420,000	300	820	2,113	4,535	13,168,730		توسعة صخرية-حفر دتشات	مسح وتوسعة وتصفية دتشات طريق المحطة هوع (المرحلة الثانية)	بنی سعد	Ť	33
89%			1		2,668,000	0	468	542	467	4,220,054	800	شق وتسوية صخرية	شق وتسوية وتاهيل طريق بني عمر	ŷ.		34
0%		✓			0	0	0	0	0	8,159,901	2,000	شق وتوسعة	استكمال شق وتوسعة طربق بني جعفر			35
100%			ļ	✓	7,748,879	7,891	4,367	2,213	0	10,636,619	650	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة طريق قرن ملاح - الزبيح - وادي لاعة			36
100%				1	6,764,632	6,407	2,752	1,011	0	8,351,159	800	مسح وتوسعة	مسح وإصلاح المقاطع المنهارة بجسم الطريق (المسار البديل لوادي لاعة) - وادي لاعة-طرقاعة	الطويلة		37
100%	<u> </u>			✓	5,784,859	5,498	3,379	1,629	0	6,744,232	1,100	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق طرقاعة - بيت عثمان - باب جلجل			38

	مشروع	دــــالة الد			تكلفة المشروع		ـات المنجزة	الكميـــــــ		تكلفة المشروع	عدد المستفيدين	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	محافظة
نسبة الإنجا	قيد الدراسة	لم ببداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م")	توسعة/شق لتربة مختلطة (م°′)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستقيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري			
00%				1	4,363,912	6,820	2,458	910	0	6,298,713	450	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق باب جلجل - اعبار الحجر - باب الجحرة		
00%				1	13,420,352	2,400	6,790	5,562	0	23,195,040	2,000	شق وتسوية	شق الطريق الرابط ما بين شبكة طرق عزلتي العزكي والروحاني بالطريق الرابط بين محافظة (المحويت - حجة - عمران)		a
0%				✓	6,107,178	3,448	1,602	3,886	145	7,028,188	6,000	مسح وتوسعة	توسعة طريق الوادي الظهارة الضبر معثل		المحويت
)%				1	5,384,088	4,705	2,435	2,281	386	3,719,246	600	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق قرية تعز	الرجم	-3
)%				✓	5,429,709	5,699	543	4,477	44	8,957,690	20,000	تسوية ومسح	توسعة وتسوية طريق الوادي قلعة شاور		
1%				1	6,608,731	0	2,167	4,260	37	4,658,926	1,200	شق وتوسعة	شق وتوسعة طريق القصبه الغرة العذر البطنة		
%			1		835,502	0	1,017	55	55	9,210,049	-		استكمال شق طريق قرية تعز		
%				1	4,155,546		448	1,780	651	8,026,059	1,900	إزالة مخلفات وفتح الطرق	صلاح اغرار السيول الطريق همدان		
%			1		6,375,714		1,591	2,527	1,151	5,982,248	650		صلاح اضرار السيول الطريق جحشر «همدان	ملحان	
%	0	1	3	13	128,757,578	80,997	40,153	48,212	9,472	152,746,093	62,150		اجمالي محافظة المحويت		
96				1	11,584,221	20,380	3,712	3,250	0	26,641,649	15,000	مسح وتوسعة	- مسح وتوسعة طريق خزيجة - الاعدوف - الوريف - شم <u>ر</u>		
%				1	6,019,372	18,511	2,545	320	0	4,818,686	4,200	مسح وتوسعة			
%		-		1	3,740,719	5,337	1,122	1,152	45	698,593	3,000	شق وتسوية	شق طريق المغيريية الزرايب قرية الرويحا		
%		 		1	8,862,730	13,565	5,070	1,470	0	6,747,547	2,270	شق وتوسعة	شق وتوسعة ومسح طريق جورانة سعنب		
%				1	21,298,939	18,587	2,020	11,025	55	20,642,718	9,600	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق مصنع البرح - العرف - الكححة		
%				1	15.996.226	19.663	1.305	6,080	750	12,764,718	2,270	مسح وتوسعة	أستكمال الاعمال الإضافية لمشروع مسح وتوسعة طريق مصنع البرح - العرف - الكححة		
%		-		1	6,644,730	555	1.650	2,333	550	4,867,466	3.000	شق وتسوية	شق تحويلة خلفية للمسار (طريق مصنع البرح العرف - الكدحة)		
%		-		1	1,035,623	300	190	475	41	1,047,449	3,000	شق وتسوية	شق حویه حسید محرب المربی المحتم المرب المربی المحتم المرب ال	مقينة	
%				1	15,117,385	15,424	4,738	3,992	777	9,575,841	3,600	شق وتسوية	شق وتوسعة ومسح طريق الخريبة - نخلة - هكمان	معنته	تعز
%				1	3,004,038		194	1,031	723	4,134,367	1,200	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق (الحجرة-العوادر)		
%				1	3,259,405		0	2,682	0	1,990,908	800	شق وتسوية	شق ومسح وتوسعة طريق (جسار - الديمه) قرية الغراق		
%				1	3,474,142		2,853	486	0	1,728,485	1,200	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة مشروع الحجرة العقيدة		
%				✓	3,979,924		2,304	583	0	3,722,602	800	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق العقيدة - الخط الرئيسي		
%				1	4,857,258		1,968	1,537	0	3,813,549	1,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق حصب الطويل العشش		
%				✓	2,585,285	0	517	554	0	3,666,944	2,400	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحاضنة المعيقيب		
%				✓	760,200	0	0	0	0	768,000	1,000	تسوية وعمل مصارف سيول	فتح الطرق المتضررة من السبول (قرية الهجر - قرية الذناب)		
		1		1	8.000.000	0	7.013	757	0	8.000.000	عدة عزل	تسوية وعمل مصارف سيول	إزالة الاضرار الناتجة عن الامطار والسيول في مديرية مقبنة -تعز		

		توسعة وتسوية طريق الوادي قلعة شاور	تسوية ومسح	20,000	8,957,690	44	4,477	543	5,699	5,429,709	✓				00%
		شق وتوسعة طريق القصبه الغرة العذر البطنة	شق وتوسعة	1,200	4,658,926	37	4,260	2,167	0	6,608,731	1				00%
		استكمال شق طريق قرية تعز		-	9,210,049	55	55	1,017	0	835,502		1			12%
		صلاح اضرار السيول -لطريق همدان	إزالة مخلفات وفتح الطرق	1,900	8,026,059	651	1,780	448		4,155,546	✓				00%
	ملحان	صلاح اضرار السيول -لطريق جحشر -همدان		650	5,982,248	1,151	2,527	1,591		6,375,714		1	-		75%
		اجمالي محافظة المحويت		62,150	152,746,093	9,472	48,212	40,153	80,997	128,757,578	13	3	1	0	58%
T	<u> </u>		مسح وتوسعة	15.000	26,641,649	0	3,250	3,712	20,380	11,584,221	1		-		00%
								-			· /		 		00%
		مسح وتوسعه طرق (مقهايه انعم - العميصيه - الكرابده - الزبلعي - الحيضان - الضاجع - السياله - مغرق الوريف)	مسح وتوسعة	4,200	4,818,686	0	320	2,545	18,511	6,019,372		ļ	ļ		
		شق طريق المغيريبة الزرايب قرية الرويحا	شق وتسوية	3,000	698,593	45	1,152	1,122	5,337	3,740,719	1		ļ		00%
		شق وتوسعة ومسح طريق جورانة سعنب	شق وتوسعة	2,270	6,747,547	0	1,470	5,070	13,565	8,862,730	✓		ļ		00%
		مسح وتوسعة طربق مصنع البرح - العرف - الكدحة	مسح وتوسعة	9,600	20,642,718	55	11,025	2,020	18,587	21,298,939	1				00%
		أستكمال الاعمال الإضافية لمشروع مسح وتوسعة طريق مصنع البرح - العرف - الكدحة	مسح وتوسعة	2,270	12,764,718	750	6,080	1,305	19,663	15,996,226	1				00%
		شق تحويلة خلفية للمسار (طريق مصنع البرح العرف - الكدحة)	شق وتسوية	3,000	4,867,466	550	2,333	1,650	555	6,644,730	1				00%
j	مقينة	شق تحويلة خلفية أمنية هامة	شق وتسوية	3,000	1,047,449	41	475	190	300	1,035,623	1				00%
,		شق وتوسعة ومسح طريق الخريبة - نخلة - هكمان	شق وتسوية	3,600	9,575,841	777	3,992	4,738	15,424	15,117,385	1				00%
		مسح و توسعة طريق (الحجرة-العوادر)	مسح وتوسعة	1,200	4,134,367	723	1,031	194		3,004,038	1				00%
		شق ومسح وتوسعة طريق (جسار - الديمه) قرية الغراق	شق وتسوية	800	1,990,908	0	2,682	0		3,259,405	1				00%
		مشروع مسح وتوسعة مشروع الحجرة العقيدة	مسح وتوسعة	1,200	1,728,485	0	486	2,853		3,474,142	1				00%
		مسح وتوسعة طريق العقيدة - الخط الرئيسي	مسح وتوسعة	800	3,722,602	0	583	2,304		3,979,924	✓				00%
		مسح وتوسعة طريق حصب الطويل العشش	مسح وتوسعة	1,500	3,813,549	0	1,537	1,968		4,857,258	✓				00%
		مسح وتوسعة طريق الحاضنة المعيقيب	مسح وتوسعة	2,400	3,666,944	0	554	517	0	2,585,285	✓				00%
		فتح الطرق المتضررة من السيول (قرية الهجر - قرية الذناب)	تسوية وعمل مصارف سيول	1,000	768,000	0	0	0	0	760,200	1				00%
		إزالة الاضرار الناتجة عن الامطار والسيول في مديرية مقبنة -تعز	تسوية وعمل مصارف سيول	عدة عزل	8,000,000	0	757	7,013	0	8,000,000	✓				00%
		مسح وتوسعة طريق حاجز الاوطية	مسح وتوسعة	1,645	1,454,328	752	335	0	500	990,000	✓				00%
		مسح وتوسعة طريق مدرسة الاوطية	مسح وتوسعة	,,- ,-	517,458	0	504	0	940	495,000	1				00%
		شق طريق السواغ الجبل-سواغ الوادي	شق وتسوية	3,700	6,631,333	285	2,040	4,121	9,348	9,044,231		✓			69%
		مسح ورصف طريق سقم - المريقيع - ميراب - شرعب الرونة	توسعة ومسح ورصف	2,000	242,977,920	9,885	0	2,440	0	123,005,121		1			51%
		مسح وشق طريق (مفرق بيدح - ضمين- المجاعشة)	شق وتسوية	2,264	19,261,822	0	2,768	11,808	0	15,064,517	✓				81%
j	مقينة	رصف الطريق الرئيسي لعزلة قراضة	رصف حجري	2,500	34,082,700	0	0	0	0	0		1			0%
,		مسح وتوسعة طريق الرومية نقيل الشطيط	مسح وتوسعة	1,800	1,697,563	0	0	0	0	1,697,563	1				00%
		شق طريق المخشب بني صلاح	شق	1,800	1,940,628	0	0	0	0	0			1		0%
		طريق الربط بين مشروع حصب الطويل -العشش ومشروع مفرق بيدح - المجاعشة		16,397	2,432,742		1,670	612		2,896,787		1			95%
		شق طريق حاجز الدويق - قرية اللصبة		26,598	2,213,638			1,223		1,317,192	✓				00%
		مسح وتوسعة طريق المرزام - الحيساء		5,361	6,769,510		288	1,019		1,883,651		✓			25%
		مشروع الطريق الرابط بن مشروع المرزام-الحيساء ومشروع الحاضنة -المعيقيب		12,000	3,627,958		1,131	470		2,432,419		1			60%
		اجمالي محافظة تعز		130,905	439,237,122	13,863	46,464	58,893	123,110	279,046,676	22	6	1	0	36%
		مشروع مسح وتوسعة طريق بيحان جروة - عزلة خودان	مسح وتوسعة	2,000	3,291,693	85	850	1,956	5,870	3,838,923	1				00%
		مسح وتوسعة طريق الرفد	مسح وتوسعة	1,000	545,929	0	240	305	1,174	743,838	1				00%

افظة	المديرية	اسم المشروع	طبيعة الأعمال	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)		الكمي	ــات المنجزة		تكلفة المشروع التنفيذية (ريال)			ــــالة المث	E91	
			شق، مسح، توسعة، قطع صخري	المستفيدين	التقديرية (زيال)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م٣)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	استقیدیه (زیان)	منجز	قيد التنفيذ	لم يبداء الد	يد راسة	نسبة الإنجا
		شق وتوسعة طريق قرية ذنبان	شق وتوسعة	2,000	4,054,315	75	750	3,355	4,185	4,430,156	1				100%
		مسح وتوسعة طريق الظهرة القدارى الديارة الساقمة الحمرى و السنام والشمارى الدشان	مسح وتوسعة	2,500	3,656,914	708	3,300	3,925	6,555	9,650,099	1				100%
		مشروع شق طريق الديارة	شق وتسوية		4,717,756	315	2,191	1,278	1,174	4,601,481	1			-	100%
		استكمال مسح وتوسعة طريق الديارة عزلة خودان	مسح وتوسعة	1,400	2,229,426	117	951	552	2,565	2,266,765	1			-	100%
		توسعة وتسوية طريق ايفاعة العليا	توسهةوتسوية	462	2,449,084	457	564	519	589	2,400,000	1				100%
		مسج وتوسعة طريق السنام الجبجب دهاق الشمارى المثوابة		-	-	1,768	2,366	4,198	518	10,968,935	1				100%
		مسح وتوسعة طريق الوبلى - المحيب	مسح وتوسعة	6.500	4,242,266	50	422	4.550	3.457	4.848.170		1		-	84%
		شق وتوسعة ومسح طريق نقيل القرهدى حنجب حماطة شنانه	شق وتسوية	2.200	8,069,787	1,087	935	2.264	1,733	6,955.000		1			80%
		شق وتوسعة ومسح طريق خربان نقيل بايع يفاعة السفلى	شق وتسوية	3,000	6,154,659	887	2,223	2,361		7,500,000	1				100%
		مسح وتوسعة طريق الرعادي الحدبي المحيب	مسح وتوسعة	2.500	2.248.499								1	-	0%
ب	يريم	مسح وتوسعة طريق بنى مسعود - دهاق	مسح وتوسعة	15,000	7,470,109								1	+	0%
		مسح وتوسعة طريق معلص الذراع قرية خودان ريح	مسح وتوسعة	2,000	3,575,041								1	+	0%
		مسح وتوسعة طريق الحياض يلالة	مسح وتوسعة	3,700	3,371,871						-		1	+	0%
		مسح وتوسعة طريق الحياضي حطب المحفد	مسح وتوسعه	3,000	3,425,095						-		· ·	+	0%
		مسح وتوسعه طريق طنبان عبر الماء الزراعى حجر ادهان	مسح وتوسعة	3,500	3,979,907								1		0%
		مسح وتوسعة طريق تلباس الشكامى	مسح وتوسعة	1,500	2,434,273								1		0%
		مسح وتوسعة طريق الشكامى القدمة خربان	مسح وتوسعة	6,000	4,872,207								1	+	0%
		مسح وتوسعة طريق ريمان باتجاه شعر	مسح وتوسعة	13,000	8,653,250				V				1	-	0%
		مسح وتوسعة عدد (B) فرع ضمن عزلة خُودان (الشكامي-المقبض-توالق-عدن مدر-عدن حجار نجد السد-المحجر- اللاحة ضُولان الحياض منحم-العقر وقرامل-ذي يتيمة ربح الرعادي-ريح الحياضي)		13,500	13,827,045								1		0%
		مسح وتوسعة عقبة الرزمة - عرعرة - الحسور	مسح وتوسعة	2,000	3,049,688								1		0%
		مسح وتوسعة وشق طريق الحسور الوقلى	شق وتوسعة	2,000	3,723,073								1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق الوقلى - الهحرة والحر والطلب	مسح وتوسعة	1,500	2,229,625	<u> </u>	V I						1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق الهجرة العارضة الخربة	شق وتسوية	800	1,835,356								1		0%
		مسح وتوسعة طريق قرية بسر	مسح وتوسعة	700	2,194,277								1		0%
		مسح وتوسعة طريق الحسور المنازل العدوف بنى غبس	توسهةوتسوية	4,000	4,965,890								1	1	0%
		مسح وتوسعة نقيل الشور باتجاه اللكمة		600	4,074,488		V	N					1	1	0%
		مسح وتوسعة طرق قرى المرقب والبلد والحلف	مسح وتوسعة	1,750	1,851,671								1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق هيوة شعر	شق وتسوية	3,000	4,481,106								1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق برك الشور - قرية الاعكاي	شق وتسوية	1,000	4,204,543								1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق قرية الاعكاي - خلل والحابط	مسح وتوسعة	1,200	3,287,299								1		0%
		مسح وتوسعة طريق قرية الاعكاى - قرية الجبل	مسح وتوسعة	600	2,020,764								1	1	0%
		مسح وتوسعة طريق قرية الجبل - بيت راشد والبلسي	مسح وتوسعة	1,000	2,132,333								1	1	0%
	يريم	مسح وتوسعة طريق قرية الجبل - قرية قرون	مسح وتوسعة	1,000	2,052,006								· /	-	0%
	. =	مسح وبوسعه طربق مرية الجبل - مرية مرون مسح وتوسعة طربق قرية قرون - الصافية		1,000	1,832,988				-				· ·	-	0%
		مسح وتوسعة طريق الضافية - مسحلة - البلسى	مسح وتوسعة مسح وتوسعة	800	1,832,988				-				→	-	0%
		مسح وبوسعه طربق الصامية - مسحله - البلسي مسح وتوسعة نقيل المدرج - عيانة - قرية العيان	مسح وتوسعه مسح وتوسعة	1,200	2,867,367 5,460,367				-				✓	-	0%
		مسح وبوسعه نعيل المحرج - عيانه - هرية العيان مسح وتوسعة طريق قرية العيان - نقيل منوخ نزولا الى السايلة	مسح وتوسعه مسح وتوسعة	3,900	5,460,367 4,570,117								· ·	-	0%
		مسح وتوسعه طريق مرية العيان - نعيل منوح بولا الى السابلة مسح وتوسعة نقيل منوخ - فرع قرية طنبة	مسح وتوسعة مسح وتوسعة	1,500	4,570,117 5.031.310								· ·	-	0%
		مسح وتوسعه نعبل منوح - فرغ فرية طنية مسح وتوسعة طريق الغرباب - الضبعة والمسو	مسح وتوسعه مسح وتوسعة	1,500	2,378,384								· ·	-	0%
		مسح وتوسعة طريق الفصحى - الشقاحى مسح وتوسعة طريق الفصحى - الشقاحى	مسح وتوسعه مسح وتوسعة	800	2,378,384			-					√	+	0%
		مسح وتوسعة طريق الشقاحي - حصن الشرف التعابر مسح وتوسعة طريق الشقاحي - حصن الشرف التعابر	مسح وتوسعه مسح وتوسعة	800	2,683,260								· ·	+	0%
ب		مسح وبوسعه حريق السعادي - حصل المارات التعابر توسعة ومسح عدد (٤) فروع ضمن عزلة بنى عمر(اذهاب بيت القدم-الخرابة-قربة الجدد)	مسے وتوسعہ	5.100	2,118,942								1	-	0%
		توسعه ومسح عدد (ع) مروع تعمل غربه بني عمر ادهاب بيت استحم انحرانه امرية انجدد) مسح وتوسعة طريق التعابر - بيت ربيد - اصواع - هرجاب	مسح وتوسعة	2,600	7,487,401								1	-	0%
		مسح وتوسعة صريق التعابل - بيت ربيد - اصواع - هرجاب توسعة ومسح عدد (١٠) مشاريع في عدة عزل بمديرية حزم العدين (الرياسي،وادي عضمان-الضبحة-نقيل	مسك وتوسعه	2,000	7,407,401									ļ	100%

حتی دیسمج ۲۰۱۶م	لفترة منذ التأسيس	دة خدمة الطرق الريفية لـ	توسعة وتحسى حو	برنامج مشاريع
7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, 🔾,	J. U. J	

23	لمشرو	- الة اا	,		تكلفة المشروع التنفيذية (ربال)		ات المنجزة	الكمي	,	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	عدد المستفىدىن	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	لمحافظة
ىة نسبة ا	قيد الدراس	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	السفيدية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م ۱۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م٣)	الىقدىرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري			
%				1	13,751,698	20,851	1,000	6,500	88	2,825,366	14,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق بني وائل		
%				✓	2,464,663	2,582	0	1,470	0	3,293,724	12,000	مسح وتوسعة	مسح واستكمال شق طريق الجوز الدغبور الكشخة بني وائل حليمة		
%				✓	1,279,770	3,315	0	560	0	1,207,769	1,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق القتيب - الشعيب		
%				✓	1,415,867	2,902	635	320	0	620,298	1,600	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الجعافرة راس النقيل		
%				✓	1,140,174	2,337	850	0	0	516,975	1,800	مسح وتوسعة	مسح طريق نجد الهتيرة المعالف - شعبة		
%				✓	1,918,609	1,304	1,450	350	0	2,034,756	1,800	شق وتسوية	شق طريق نجد السقائة - الكديد - اللصوب		
%				✓	17,772,449	26,466	9,750	4,230	0	6,013,610	16,850	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة فروع عزلة بني سليمان الاجعوم	حزم العدين	
%				✓	4,541,570	2,174	1,400	1,650	520	3,238,037	4,000	شق وتسوية وتوسعة	مشروع شق وتوسعة طريق نقيل سالم - المحرور- الأجعوم		
%				✓	1,625,000	3,804	0	750	0	983,104	1,000	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة طريق العينيين - الأجعوم		
%				1	1,799,250	3,587	0	905	0	759,381	1,100	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة طريق سنايا- الأجعوم		
%				✓	7,921,970	2,174	3,330	3,650	0	4,877,543	1,500	شق وتسوية	مشروع شق طريق نقيل الاحطوب - خبات- الأجعوم		
%				1	2,447,391	8,696	1,000	0	0	2,144,913	5,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية ساحة الرسول الاعظم بالاجعوم		
%				1	1,586,716	4,073	999	0	0	1,299,157	15,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طربق الاحكوم - المزارقة		
%				✓	2,636,283	5,978	1,050	550	0	2,369,682	2,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق نجد الامير - السهلة		
%				✓	1,637,018	1,379	850	500	0	9,760,942	14,000	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق الاوهار الشعاور		
%				1	931,291	1,630	311	274	0	440,664	13,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق المزارقة - الأوهار		
%				✓	1,809,865	3,533	1,210	110	0	1,926,332	550	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق الأوهار - المشواف		
%				✓	5,720,957	4,728	3,800	1,250	0	917,605	5,000	شق وتسوية	شق طريق الأوهار - الرهش		
%				✓	3,360,588	3,924	3,220	0	0	38,635,271	16,000	مسح وتوسعة وشق	مسح وشق طريق الصريم - المزارقة		
%				1	6,336,668	10,630	3,500	1,348	0	25,819,613	20,000	مسح وتوسعة وشق	مسح و توسعة طريق الشعاور الصريم		
%				✓	3,307,822	6,793	1,653	660	0	4,333,150	5,000	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق نجد الأمبر الوقعة - مفرق تناعم		
%				✓	4,681,465	17,391	105	1,340	0	2,394,555	6,000	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق الوقعة - اللفج - العقبة		
%				1	7,302,774	11,430	3,107	2,021	155	6,769,322	12,700	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق فروع عزلة الشعاور		
%				1	1,456,775	2,080	870	315	0	1,480,267	850	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق خط شعب شرهان		
%				✓	2,469,539	0	4,805	0	0	2,966,182	15,000	تنظيف الدتشات من المخلفات ونقلها لمكانها	رفع المخلفات المتساقطة في الدتشات و العبارات في الخط الأسفلتي من مفرق الحزم الى مركز المديرية - حزم العدين - اب		
%				1	2,835,271	6,710	1,722	85	156	917,605	800	وتفتها تمدانها مسح وتوسعة	العدين - اب مسح وتوسعة طريق المزارقة الجبجب		
%				1	11,701,624	0	3,225	1,952	1,152	10,417,548	1,400	مسح وتوسعة	مسح وتسوية خط بنى على - الجحجوح		-
%				1	1,424,815		659	540	0	3,749,930	685	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الخرابة -شعب مجود -الزوانى العالى - فروع بنى على		
%				1	1,703,826		678	577	0	2,284,183	615	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحمرة - شعب الداخل العورم - فروع بنى على		
%				1	2,202,649		547	498	322	3,538,468	260	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق المشواف - شعب الفقى - فروع بنى على		
%				~	1,805,323	0	1,121	362	0	2,729,076	440	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق العدنة - كباهبة فروع بنى على		
%				✓	1,372,590	-	605	360	-	2,106,077	315	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق اكمة عيانة - المحجر - القلة - فروع بنى على		
%				1	5,742,488		2,070	2,148		6,916,155	2,200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الموسطة العدن نجد السبيح		
%				1	2,764,122		1,632	897		4,622,050	400	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق المقحوز - فروع بنى على		إب
6			1		16,587,394	23,617	4,120	6,500	0	4,637,739	20,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق نجد العدن الى العرم - الاحكوم		72
			1		182,800	440	100	80	0	6,597,697	1,320	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق المناطيش الصلوة الزواقر المؤهيل الظفير		
,		1			0	0	0	0	0	10,878,630	1,500	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق النجد - يخوض - الجبجب	حزم العدين	
,		1			0	-	-	-	-	4,356,416	871	شق وتوسعة ومسح	شق وتوسعة طريق المحرق العلى والسافل		
,		1			0	-	-	-	-	1,907,568	382	شق وتوسعة ومسح	شق وتوسعة طربق الحناني الشاحة		
		1			0					6,262,726	860	مسح وتوسعة	" مسح وتوسعة طريق عبر الجنيد الشكو - فروع بني علي		
,		1								7,716,307	5,400		مسح وتوسعة طريق المندب الأحمر الى الابعون		
		1								17,103,030	5,334		شق وتوسعة طريق عرض الرهاء نجد العين العمود		
,		1								10,874,602	1,300		مسح وتوسعة طريق (المحجر -الجميمه -الاطراف - ودن جيش والمقاطين)حقين مركز المديرية		
		1								15,744,595	1,232		مسح وتوسعة طريق (مصحيح المستورية) والمقاول المقاول الم		

	مشروع	ـــالة الد	۵		تكلفة المشروع 		ات المنجزة	الكميـــــــــ		تكلفة المشروع	77E	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	<u> </u>
نسبة الإنجاز (%)	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لاَرية طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
100%				✓	8,908,924	9,783	6,000	750	0	10,814,588	5,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق المحطة - بركة الصلب - المحرم - الزياعي - السور			167
100%				✓	2,355,504	2,870	1,850	0	0	3,430,595	950	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق ضبر المسرب			168
100%				✓	766,813	707	585	111	0	1,295,454	500	مسح وتوسعة	مسح و توسعة طريق المقالدة النوبة			169
100%				✓	2,206,055	1,196	1,425	375	0	2,664,033	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة و تسوية قربة السور- المغربة	المخادر		170
100%				1	8,366,633	3,530	2,826	3,111	0	5,593,141	1,500	شق وتسوية	شق ومسح وتسوية طريق قرية الكراثي			169 170 171
100%				1	7,891,287	4,500	3,434	2,383	0	8,094,566	2,300	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق (الهتك -العارضة - نجد السهب)			172 173 174 175
100%				1	747,950	400	600	150	0	903,696	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق نجد ساهب الرشاي			173
100%				1	2,136,650	1,450	1,700	400	0	2,419,351	200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الريد			174
100%				✓	3,167,862	0	2,264	966	118	3,271,443	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق دار الشرف الجلبة حجب			175
100%				✓	8,853,191	6,410	1,916	2,543	610	17,928,358	7,300	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحواتر العقيرة- ذي صبر			176
100%				✓	4,842,741	2,810	493	2,105	248	5,042,207	1,800	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحواتر البهالي			177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
100%				✓	7,949,741		5,901	249	0	-	-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق البهالي الشاحي -نجد ساهب	المخادر		178
6%			1		2,032,346	20	128	74	39	44,899,863	900	مسح وتوسعة ورصف	مسح وتوسعة ورصف طريق الطنبي عزلة الصفي			179
5%			1		1,818,469	85	87	190	49	40,410,433		مسح وتوسعة ورصف	مسح وتوسعة ورصف طريق حنفة عزلة الصفي			180
92%			1		5,248,805		2,533	2,325	50	2,739,574	364	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق (المرباعة - السور - الدسام)			181
0%		✓			0	· ·	-		- \	1,277,055	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق العقيرة			182
100%				✓	13,193,179		1,337	7,672	0	14,181,122	1,576		مسح وتوسعة طريق مدر الشعب			183
			1		0					57,379,033	1,185		مسح وتوسعة رصف طريق قرية المصلول عدسان	النادرة		184
100%				✓	3,362,631	6,757	1,775	231	0	3,110,150	900	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحطامة - الجلة			185
100%				✓	6,321,858	1,396	3,667	2,441	0	6,152,433	1,100	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الحطامة _ النوبة	فرع العدين		186
100%				✓	462,370	1,130	0	155	0	825,151	1,200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة نقيل المكسر - عنبجين			187
100%				✓	503,063	503	0	320	0	1,225,993	800	شق وتسوية	شق طريق نقيل الروادف			188
100%	ļ	-		✓	1,720,214	1,304	626	688	10	1,712,730	550	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق نقيل القريف _ الجلة			189
100%				4	4,583,250	2,446	0	3,500	0	5,199,297	1,850	شق وتسوية	مسح وشق طريق المنادم - الجلة			190
100%				✓	2,878,645	3,304	2,105	289	84	1,985,163	700	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الجلة _ نقيل الاحجان _ المتخبي			191
100%				/	2,126,031	2,491	1,802	162	0	2,413,569	850	مسح وتوسعة	توسعة ومسح طريق المغربة_الروينة			192
100%		-		√	673,423	1,261	554	0	0	836,939	250	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق المريكز			193 194
		-			36,544,135	11,283	12,810	10,710	3,438	25,254,410	30,000	شق وتسوية	شق طريق القحاطنة			
100%		-		√	5,992,618	410	1,605	2,071	1,125	3,223,445	700	شق وتسوية	شق طريق الجوف			195 196 197
100%		-		✓	10,398,440	4,630	1,070	3,671	2,445	5,150,712	950	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق طربق حبانة بني فايد			196
100%				✓	6,205,520	3,830	2,755	2,196	236	3,403,767	4,000	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة طريق الشجين وادي البراء			
100%				✓	4,393,220	3,310	2,370	1,510	0	11,158,792	2,100	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتوسعة طربق حسيد المحرج	فرع العدين		198 199 200
100%		ļ		✓	1,095,910		420	565	0	-	-		فتح الطرق المتضررة من السيول (في قرى الاشعاب)			199
100%		ļ		✓	2,250,000		192	0	925	2,280,422	800		شق وتوسعة طريق نقبل خزيف بني يوسف (مرحلة أولى)			200
100% 69%		-	1	✓	4,911,500 4,375,860	1,174 450	390 730	2,276 1,645	345 960	13,173,339 6,717,248	4,000	توسعة وشق	استكمال شق وتوسعة طريق نقيل خزيف بني يوسف مشروع مسح وتوسعة طريق عرجمة الكدحه			201 202 203
56%			· ·		1,707,465	0	135	765	210	3,184,022	1,600	مسح وتوسعة مسح وتوسعة	مسروع مسح وبوسعه طريق «لحفولله» الذناب-عدن تمارة)			202
38%		-	· ·		1,707,465	5,680	135 5,670	765 4,313	922	3,184,022 12.144.898	1,600	مسح وتوسعة مسح وتوسعة	مسح وتوسعه طريق (الطويله-الدناب-عدن تمازه) مشروع مسح وتوسعة طريق (الحرية - حسيد- القهراء)			203
7%			· /		255,960	5,300	5,370	-,210	158	3,858,511	2,900	مسح وتوسعة	مسروع مسح وتوسعه طريق الدرية - تسيد- انهراء) مشروع شق و مسح وتوسعة طريق الاشعاب الحدية الرويس			205
0%		1			0				1.50	4,012,678	3,000	مسح وتوسعة	مساروع مسح وتوسعة طريق مركز المديرية القطاع الغربي (تقبل قشوبة - الصندقة وصولا الى مدرسة حذيفة)			206
0%		1			0					3,439,860	2,000	مسح وتوسعة	مشروع مسح وتسویة طریق نقیل عسقین اسفل		إب	205 206 207 208 209
0%		1			0					3,001,198	700	شق وتسوية	مشروع شق طريق الشرج			208
0%	1				0	-	-	-	-	0	-	مسح وشق وتوسعة	مسح وشق نقبل برح الطعنة _ نقبل إبراهيم سجرة			209

حافظة	المديرية	اسم المشروع	۵.	لبيعة الأعمال	33E	تكلفة المشروع		الكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـات المنجزة		تكلفة المشروع		۵.	ــــالة المشرر	89
			شق. مىر	ـح، توسعة، قطع صخري .ــ	المستفيدين	التقديرية (ريال)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	التنفيذية (ريال)	منجز	قيد التنفيذ	قيد لم يبداء الدران	: سة نسب
	مذيخرة	تصفية مخلفات الدتشات والعبارات في الطريق الرابط بين م/ مذيخرة وم/ التعزية		رفع مخلفات	15,000	3,843,426	0	0	5,780	0	2,988,002		1		
		مسح وتوسعة طريق وادي الدور		مسح وتوسعة	9,000	5,893,905	0	0	9,310	0	11,128,500	1			
		مسح طريق الغضيبة ابتداً من مستشفى الكامل الى الغضيبة		مسح وتوسعة	4,500	2,279,502	0	648	443	0	3,289,500		1		
		مسح طريق الشرقي		مسح وتوسعة	6,000	4,701,023	-	-	1,017	-	3,555,000		1		
	العدين	مسح وتوسعة طريق الرضائي		مسح وتوسعة	1,200	2,497,263	-		-	-	0		1		
	0.	شق طريق الجمجام الى الثجع		شق	4,000	19,512,249	-		-	-	0		1		
		شق طريق مروة		شق	2,500	9,282,611	-	•	-	-	0		1		
		الدراسة الأولية لشق طريق الاحمودي - القفر - حيران		شق	12,000	28,251,968	874	2,074	1,302	0	6,282,000		1		
		شق طريق الشراعب الدفدف		ق وتوسعة ومسح مجرى السيول للجسور	3,500	9,098,932	-	-	-	-	0		1		
	جبلة	فتح مجرى السيول للجسور المسدودة في مديرية جبلة		مجرى السيون للجسور لعبارات المسدودة	-	720,000	0	0	0	0	690,000	1			
		مسح وتوسعة طريق الركية -نجد الحمر -حبانة بيت الاديب			693	3,361,672	612	1,123	700		4,343,634	1			
	القفر	مسح وتوسعة طريق دوام -القهابي -الحجة بيت الديب			4,310	5,127,803	105	770	159		1,469,997	✓			
		مسح وتوسعة طريق نقيل الهيل - البارة -نجد مدر بني مهدي			14,260	18,404,536	833	2,984	552		6,989,672		1		
	حبیش	مسح وتوسعة طريق نجد المندب - الحباجي			821	2,346,779	75	619	488		1,417,905	1			
		مسح وتوسعة طربق الدهرة			1,216	1,301,082		156	345		838,600	1			
		مسح وتوسعة طريق الظهره - الكسر			485	1,452,922	72	240	110		646,989	1			
		شق وتوسعة طريق الركب شعب النكاع			328	1,388,010		140	1,020		1,017,360	1			
إب	حبيش	مسح وتوسعة طريق الموسطة - المحراق			5,373	3,978,660		782	1,447		2,717,893	1			
		مسح وتوسعة طريق حبران - نجد المصراع السهلة			5,300	6,893,835		1,158	1,936		3,921,344	1			
		مسح وتوسعة طريق الرقيعية - معلص - القباظة			-	-		1,256	3,431		4,773,242	1			
		مسح وتوسعة طريق القطبة - وادي العبيد			-	-		335	1,318		1,795,716		1		
		اجمالي محافظة اب			553,206	906,904,979	22,484	131,395	191,014	313,673	468,805,412	85	22	1 46	
		مسح وتوسعة طربق الجلة - محلى		مسح وتوسعة	1,250	9,500,195	666	2,273	2,161	16,530	9,500,195	1			
مران	حرف سفيان	مسح وتوسعة طريق موطك - السواد		مسح وتوسعة	2,550	12,017,587	775	2,520	2,887	24,000	12,017,587	1			
		مسح و توسعة و تسوية طريق (السواد - دهمة - صبارة)		مسح وتوسعة	2,500	14,933,311	790	4,877	2,100	26,087	14,933,311	1			
		اجمالي محافظة عمران			6,300	36,451,093	2,231	9,670	7,148	66,617	36,451,093	3	0	0 0	,
		طريق الجرف وعالي		مسح وتوسعة	200	5,845,258	977	2,235	1,030	3,261	7,291,297	1			
		طريق جبل الحشاء بني صبح عتابة		مسح وتوسعة	30,000	16,683,790	5,572	6,753	4,594	16,891	28,962,730	✓			
ضالع	الحشاء	الأعمال الإضافية لمشروع جسر اللفج	1	ستكمال بناء جسر	-	4,501,882	0	0	0	0	2,438,198	1			
		شق طريق المحامدة		شق وتسوية	400	1,850,392	777	900	646	1,565	3,731,788	1			
		شق طريق قرية الشجو		شق وتسوية	900	6,575,007	962	2,164	1,923	2,717	7,043,867	1			
		شق ومسح وتوسعة طريق قرية وجرة المراكب		شق وتسوية	250	4,522,147	830	926	702	1,304	3,720,664	1			
		مسح وتوسعة وشق طريق المحاد		مسح وتوسعة	600	4,490,138	390	2,700	1,595	3,913	6,183,203	✓			
		شق طريق الصيرات أبو زيد			-	1,150,000	0	412	518	1,000	1,129,964	1			
		مسح وتوسعة وشق طريق الخرابة الصيرات		شق وتسوية	1,200	6,991,036	1,111	4,302	7,018	6,203	14,262,174	1			
		مشروع عمارة - الذربة - الزجع	ش <u>ن</u>	ى وتوسعة وتسوية	2,100	6,745,956	999	5,020	3,780	11,735	13,350,086	1			
		مسح وتوسعة طريق المقدار علمان		توسعة صخرية	700	12,828,990	3,284	0	0	0	9,374,800	1			
		استكمال اعمال مشروع الفطع الصخري الإضافي وحفر دتشات رتقيل ضوران وعقبة المنقل + طريق جبل الحد وعتابة) الضالع	الحشاء حفيد	نشات وتوسعة صخرية		15.935.459	2.787	2.936	2.902	0	14.750.000	1			

سیس حتی دیسمبر ۲۰۲۶م	خدمة الطرق الريفية للفترة منذ التأر	برنامج مشاريع توسعة وتحسين جودة
----------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	مشروع	الة الد			تكلفة المشروع التنفيذية (ريال)		ات المنجزة		ı	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	عدد المستفيدين	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	محافظة
نسبة الإنجاز	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز		مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)			شق، مسح، توسعة، قطع صخري			
100%				1	14,124,442	14,995	3,497	5,560	456	7,952,661	30,000	مسح وتوسعة	طريق مركز المديرية - بلاد الحيقي النجد		
100%				1	4,519,458	2,709	1,649	1,496	450	4,809,542	1,200	مسح وتوسعة	مشروع الزجع - النجد		
100%				✓	19,183,985	19,102	5,500	6,416	1,059	15,068,311	15,000	مسح وتوسعة	طريق مركز المديرية - جبل الحشاء		
100%				✓	2,123,930	1,714	1,300	584	12	3,888,627	700	مسح وتوسعة	مسح ونوسعة طريق قرية ثوبائة	الحشاء	
100%				1	6,878,623	4,728	6,047	399	163	12,808,896	3,000	مسح وتوسعة	طريق الحذية - الجول وفروعها		
100%				1	7,288,587	6,437	2,441	2,386	0	14,315,123	500	مسح وتوسعة	مسح توسعة طريق الحبول		
100%				✓	27,552,000	0	922	660	6,690	28,246,180	3,000	توسعة صخرية	شق وتوسعة طريق وادي بقر راس النقيل الحيفة		
100%				1	8,821,045	2,417	3,927	2,118	912	8,833,393	400	شق ومسح وتوسعة	شق طريق شعب الارك		
21%			1		936,000	0	6	141	115	4,354,418	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق طريق المشارع		
100%				1	6,696,000	0	64	408	1,438	1,729,469	200	شق ومسح وتوسعة	شق ومسح وتوسعة طريق قرية الجهف		ضالع
86%			1		13,139,710	6,458	2,831	5,017	1,137	14,961,576	2,000	شق ومسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق طربق جرفة قرية البيت		
0%		1			0	0	0	0	0	5,295,791	500	شق ومسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق طريق الخورات		
0%		1			0	0	0	0	0	4,319,906	8,000	مسح وتوسعة	طريق المليح حبيل الذربية		
0%		1			0	0	0	0	0	17,774,657	8,000	مسح وتوسعة	طربق الطمحان - المليح		
16%			1		6,831,000		2,256	1,614	386	101,037,772	5,500	مسح وتوسعة	مسح ونتوسعة طريق الضبيانية العلياء	בִּאָי	
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتوسعة	مسار طريق شليل - القدم - عزاب عزلة الاعشور		
0%	1				0	0	0	0	o	-	-	مسح وتوسعة	الاعمال الترابية لطريق عزاب - بيت الشوكي عزلة الاعشور		
55%			1		25,356,122	0	4,870	1,852	2,198	71,069,017	12,000	شق ومسح وتوسعة	مسح وشق وتوسعة طريق الوطيف - الحصن بيت النهام - نجد سنف عزلة الوحج		
0%	1	İ			0	0	0	0	0	-	-	شق ومسح وتوسعة	استكمال شق ومسح وتوسعة طريق عقبة العشوة الظفير - عزلة الشرنمة السفلى		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتسوية	مسح وتسوية طريق المعصر - رمة عزلة الاعشور		
0%	✓				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتسوية	مسح وتسوية طريق جيشان - روسان - عزلة الاعشور	قعطبة	
0%	1				0	0	0	0	o	-	-	شق ومسح وتوسعة	شق وتوسعة طريق قرية قدارة - عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	o	-	-	مسح وتسوية	مسح وتسوية طريق نجد الريس - السور - حضار - عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتسوية	مسار طريق القعرة - حبيل السماعي عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتسوية	مسار طريق المحجر - رباط السلامي		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الضمري - نجد اجزر - بيت النهام عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	0		-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق بيت الشوكي -جبل الشامي - رمة عزلة الاعشور		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	شق ومسح وتوسعة	شق ومسح وتوسعة طريق قرية ساروة عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتوسعة	مسار طريق نجد حمة عزلة الوحج		
0%	1				0	0	0	0	0		-	مسح وتوسعة	مسار طريق الاغوال - حطب بيت الشرجبي عزلة الاعشور	قعطية	ضالع
0%	1				0	0	0	0	0	-	-	شق	شق طريق جديدة لمركز المديرية		
0%	1				0	0	0	0	0		-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الاعشار - المشوقة - عزلة الشرنمة السفلى		
0%	✓				0	0	0	0	0		-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق شعور - المودم - عزلة بلاد اليوبي		
0%	✓				0	0	0	0	0	-	-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طربق - جبل حمك - عزلة الوحج		
50%	18	3	4	21	255,689,673	107,149	60,019	56,997	32,706	404,585,393	126,850		اجمالي محافظة الضالع		
100%				1	9,085,000 20,100,484	0 9,605	0 7,037	0 7,021	3,476 1,507	9,314,974 20,216,055	10,600 5,000	شق مسح وتوسعة	شق طريق (الحرمة - غرابة) عزلة لهاب مسح وتوسعة الخط الرئيسى قطع الشرف - حيد الحرب - نهاية وادى الشهلى	مناخة	
100%		-		· ·	1,188,440	1,900	7,037	80	0	1,179,235	670	مسح وتوسعة	مسح وتوسعه انحص انرتيسي قضع السرف - خيد تحرب - نهينه وادي السهتي مسح وتوسعة طريق (كسب - الخلق)		
100%				1	358,271	350	175	163	0	491,119	-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة فرع جهامة قرية الصلو مسح وتوسعة فرع جهامة قرية الصلو		
100%		+		1	1,057,842	520	918	330	0	1,256,915	-	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق قرية الصلو-فرع البير		

						٦٩	بسمبر ۲۶۰	بس حتی دی	رة منذ التأسي	الريفية للفتر	مة الطرق	ېتحسين جودة خدد	برنامج مشاريع توسعة و			
	شروع	ــــالة المن	۵		تكلفة المشروع		ات المنجزة	الكميـــــــا		تكلفة المشروع	عدد المستفيدين	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	م ا
نسبة الإنجاز	قيد لدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لاربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
100%				1	18,145,521	5,461	11,668	5,334	506	19,959,637	1,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق (الخط الرئيسي - العشة - جهامة - وادي بقلان)	بني مطر	صنعاء	28
85%			1		7,397,281		1,870	2,586	515	9,036,983	2,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق (فرع جبهان)			28
8%			1		913,100		150	875		10,818,658	635		مسح وتوسعة طريق بيت الكامل			28
65% 0%			✓	-	4,675,763		838	2,520		7,159,298	317	استكمال شق ومسح وتسوية	مسح وتوسعة طريق الخلات			28 28 28 28
					0					11,717,279	513	وتوسعة	توسعه ومسح طريق فرية شمسان- المرجلة			28
76%	0	0	3	6	62,921,702	17,836	23,386	18,909	6,004	91,150,153	20,735		اجمالي محافظة صنعاء			
100%				1	30,499,000	4,172	7,986	10,027	3,067	26,808,807	3,200	شق صخري -تسوية	شق وتوسعة طريق الجوملن الجند مديرية الجعفرية م/ ريمة			29
100%				1	17,045,300	2,324	1,999	3,167	3,862	28,743,342	3,500	شق صخري -تسوية	شق وتوسعة طريق مصبحي الجند مديرية الجعفرية م/ ريمة	5 1 - 11	-	29 29
100%				1	10,354,600	705	3,913	924	1,915	10,342,289	21,000	شق صخري -تسوية	استكمال شق وتوسعة طريق وادي سلم - سامد (الظهرة - قصبة)	الجعفرية	ريمة	29
61%			1		13,457,851	0	1,834	3,176	2,251	22,152,972	980	شق صخری -تسویة	مشروع سق وتسوية طريق الظهرة رأس الجند			29
90%	0	0	1	3	71,356,751	7,201	15,731	17,294	11,095	88,047,410	28,680		ا اجمالي محافظة ريمة			
100%				1	1,275,858	2,929	850	120	0	1,350,110	1,650	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق نقيل الخرب	جبل راس	الحديدة	29
100%	0	0	0	1	1,275,858	2,929	850	120	0	1,350,110	1,650		: اجمالي محافظة الحديدة		i	
100%				1	12,481,653	0	0	0	10	13,636,747	2,350	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران سائدة (طلعة الركب)			25
100%				1	6,487,109	0	0	0	3	6,487,109	3,000	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (طلعة جبل عيبان)			2
100%				1	5,010,627	0	0	0	12	5,160,627	3,000	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (طلعة حسن)	حيدان	صعدة	2
100%				1	4,341,244	0	0	0	0	4,649,441	3,000	بناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (طلعة سفير)			2
100%				1	2.103.852	0	0	0	10	2.391.563	3.000	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (العبارة)			2:
100%				1	10,372,733	0	0	0	25	11,046,330	1,500	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (النيسة)			34
100%				1	21,456,772	0	0	0	0	22,285,190	2,800	رصف وبناء جدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة (الشاطئ)			3
100%				1	9,190,072	0	0	0	5	9,645,826	2,800	رصف-وتوسعة صخرية	رضف وبناء جدران ساندة (الشعوب)			3
100%				· •	10,272,500	0	0	0	2,998	18,650,143	300	مسح ووسعة صخرية	ربعت ويتع خبران شدده (استغوب) مسح وتوسعة طريق الجوة			3
100%				1			 	 	-		 		-			3
					38,155,000	18,000	0	0	0	38,155,000	3,600	مسح وتسوية	شق وإصلاح الطرق الوعرة بمناطق ذويب السفلى			
100%				1	14,198,720	0	0	0	0	14,353,220	6,250	رصف وجدران ساندة	رصف طريق قدم الغبر حلس (المرحلة الثانية)			3
100%				1	111,789,151	0	0	0	0	111,830,831	8,500	رصف وجدران ساندة	رصف طريق عقبة فوط (مرحلة أولى)			3
100%				1	117,105,085	0	0	0	0	117,110,903		رصف وجدران ساندة	استكمال رصف وتحسين طريق عقبة فوط (مرحلة ثانية)			3
100%				1	22,702,438	3,300	0	0	0	23,654,873	3,500	رصف وجدران ساندة	رصف طريق ال جعوان			3
100%				1	15,032,114	0	o	o	0	15,639,285	2,000	رصف وجدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة طلعة المدرسة			3
100%				1	4,736,878	0	0	0	72	5,427,276	1,500	رصف وجدران ساندة وتوسعة صخبية	رصف وبناء جدران ساندة عردوم			3
100%				1	25,610,368	0	0	o	249	26,919,489	2,500	صحابه رصف وجدران ساندة	رصف طريق الغبر			3
100%				1	5,008,512	0	0	0	0	5,321,870	1,500	رصف وجدران ساندة	رصف وبناء جدران ساندة طحلان			3
41%			1		36,122,422	0	0	0	0	91,251,218	5,086	رصف	رصف طريق الت السميك			3
0%		1								23,157,820	440	رصف	رصف طريق المنقل		=	3
0%		1								54,971,306	2,454	رصف	رصف طريق شربوب	حيدان	صعدة	3
0%		1								22,004,261	354	رصف	رصف طريق العصيمى - الوجر			3
0%		1								28,918,557	-	شق وتوسعة	استكمال رصف طريق ال سلمان			3
100%				1	27,472,735	10.352	5.289	4.236	3.965	36,465,656	5,400	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق حلس طلان- النعاشوه -ال المقراتى			31

	مشروع	ــــالة الد			تكلفة المشروع		ات المنجزة	الكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		تكلفة المشروع	אר	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	a
نسبة الإنجاز (%)	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لترية طبيعية (م٣)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
100%				1	1,509,344	2,150	781	273	0	1,708,372	300	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طربق شربوب			319
100%				1	3,391,524	1,425	438	794	430	3,857,869	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق فرع طلان - الجبل (المرحلة الاولى)			320
100%				1	9,637,816	4,570	1,614	1,444	1,402	14,054,449	1,400	مسح وتوسعة	استكمال مسح وتوسعة طريق النعاشوه - جزاع (المرحلة الثانية)			321
100%				1	27,242,153	o	2,117	5,554	6,172	27,242,221	1,600	شق وتسوية	شق وتسوية تحويلة جزاع غارب المصروف			322
100%				1	779,450	1,044	0	384	0	931,672	2,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الركايب			323
100%				1	11,157,928	4,470	1,283	2,708	1,815	10,072,708	1,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الجبهة			324
100%				1	13,732,700	3,775	4,727	2,848	1,673	11,999,078	4,850	شق وتسوية	شق وتوسعة طريق قدم - الغبر - حلس وفروعة (المرحلة الاولي)			325
100%				1	21,069,935	0	4,730	6,221	2,888	30,062,202	4,500	شق وتسوية	شق طريق البلقي قرى ال معصوم قراش القعوه			326
100%				1	23,220,657	3,110	430	9,016	112	8,072,641	3,500	شق وتسوية	شق وتوسعة ومسح طريق القعوه العوالي طلح ذويب			327
100%				1	3,113,183	0	208	898	735	3,360,573	400	شق وتسوية	شق تحويلة قدم - الغبر			328 329
100%				1	6,147,840	8,560	2,165	1,701	368	10,623,453	5,182	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة طريق ال العصيمي- ذويب			329
100%				1	1,642,984	0	0	407	531	1,468,306	200	شق وتسوية	شق طريق الوادي - الغبر			330
100%				1	1,217,967	200	0	825	149	1,075,247	250	شق وتسوية	شق طريق الوحدة الصحية - الغبر			331
100%				1	1,673,432	2,362	0	985	0	2,514,676	1,250	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة ظريق ال البيلم العلياء			332
100%				1	3,052,735	0	0	458	583	3,298,817	400	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ساحة الكهربا ء جبل قذمر			333
100%				1	1,947,438	0	0	65	478	2,160,361	250	مسح وتوسعة	توسعة وتسوية طريق ال العمر			334
100%				1	2,114,045	93	148	418	310	1,304,366	300	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق عقبة المنفل ال المقراني			335
100%				1	1,839,869	0	0	427	281	2,050,080	650	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ال الكعمي			336
100%				1	788,825	o	0	397	149	2,189,816	80	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ال العصيمي- الذروع			337
100%				1	1,914,870	0	717	300	159	2,126,816	240	شق وتسوية	شق وتسوية طريق قرية شاطي سري			338
100%				1	1,014,420	o	0	870	0	1,296,632	400	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الركب - المنظرة			339
100%				1	2,975,634	0	42	1,114	600	3,217,754	-	حفر	حفر بار القعوة			340
100%				1	953,646	0	0	281	269	1,136,722	-	شق وتسوية	شق طريق حاجز عثارب			341
100%				1	7,256,438	0	0	12,175	0	7,941,764	12,500	تنظيف دتشات وعبارات	تصفية دتشات + عبارات طريق مران			342
100%				1	46,043,794	3,100	0	17,024	10,078	45,862,484	4,000	شق وتسوية	شق ومسح طريق الغثار			343
100%				1	5,129,043	3,790	590	2,885	25	7,558,599	200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ال العليف	حيدان	صعدة	344
100%				1	672,800	1,000	200	270		1,898,147	80	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ال ماطر - ال العليف	ميدان	المعدد	345
100%				1	12,823,770	1,070	0	3,217	3,372	11,820,460	2,100	شق وتسوية	شق وتوسعة خط شروان - جمعة بني فاضل			346
100%				1	1,924,044	450	43	1,362	73	1,378,968	1,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة طريق سوق الجمعة - ولدنوار- غولة			347
100%				1	621,390	0	0	432	53	946,913	96	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة خط فرع الفرحة - ولد نوار			348
100%				1	179,025		0	87	34	541,188	96	شق وتسوية	مسح وتسوية وتوسعة طريق غارب جهنم - ولد نوار			349
100%				1	1,898,574	574	555	779	196	2,852,582	650	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق ال الحماس - ولدنوار			350
100%				1	2,099,332	762	853	683	216	2,209,355	270	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق جبل ال الحماس			351
100%				1	1,566,341	0	508	385	185	2,178,307	200	شق وتسوية	شق وتوسعة طريق فرع الجميل ال فاضل			352
100%				1	4,485,848	0	0	2,684	0	6,471,492	2,850	شق وتسوية	شق وتوسعة فروع طريق فروع الجبهة			353
100%				1	1,366,084			456	286	1,439,716	800	شق وتسوية	شق وتسوية تحويلة الوجرة			354

لمحافظة	المديرية	اسم المشروع	طبيعة الأعمال	عدد تكلفة المشروع	الكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ									
		€3)—— (—.	شق. مسح، توسعة، قطع صخري	المستفيدين	التقديرية (ريال)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	التنفيذية (ريال)	منجز	قيد التنفيذ	قيد لم يبداء الدراسة	نسبة الإنجاز (٥
		مسح وتوسعة طريق شوكان - المعقر طلان	مسح وتوسعة	450	9,273,012	0	4,009	1,413	4,300	7,204,421	1			100%
		مسح وتوسعة طريق ال جبران	مسح وتوسعة	350	1,974,579	276	504	0	0	1,672,046	1			100%
		مسح وتوسعة طريق فرع طريق المراشي - طلان	مسح وتوسعة	320	1,902,292	52	1,303	127	1,200	2,027,358	1			100%
		مسح وتوسعة طريق ذراع النخش	مسح وتوسعة	1,850	9,739,715	1,190	2,973	0	0	7,740,802	1			100%
		شق وتوسعة طريق ال العقابي	مسح وتوسعة	1,000	2,948,474	64	1,416	0	0	2,082,728	1			100%
		مسح وتوسعة فرحة ال فاضل- جمعه ال فاضل	مسح وتوسعة	220	5,280,930	566	2,018	272	728	4,050,332	1			100%
		شق وتوسعة طريق المحجل ال فاضل	شق وتسوية	500	3,687,845	168	780	295	o	1,698,686	1			100%
		شق طريق وادي البيطري	شق وتسوية	500	2,919,785	425	750	85	0	2,417,620	1			100%
		استكمال مسح وتوسعة طريق الوحدة الصحية - الغبر	مسح وتسوية	200	833,405		762			870,660	1			100%
		مسح وتسوية ارضيات لعدد ٣ متعاونين ومتفاعلين مع الوحدة في المديرية	مسح وتسوية	-	713,888	0	0	0	4,300	928,400	1			100%
		مسح وتسوية أرضية جمعة بن فاضل	مسح وتسوية	-	503,122	0	380	0	200	466,200	1			100%
		مسح أرضية الوحدة الصحية	مسح وتسوية	-	1,598,210	0	330	1,280	900	1,551,470	1			100%
		مسح وتسوية أرضية جامع الرقة	مسح وتسوية	-	2,420,741	0	388	2,370	1,000	1,482,580	1			100%
		رفع مخلفات المركز الصحى خميس - مران	رفع مخلفات	-	9,660,506	0	312	3,855	0	9,378,585	1	<u> </u>		00%
		شق وتوسعة طريق القشبة فوط	شق وتوسعة	1,200	21,438,646	4,813	6,646	1,130	1,705	19,682,915	1			100%
		شق وتوسعة فروع النعاشوة	شق وتوسعة	2,900	4,675,866	0	2,908	310	0	4,392,336	1			100%
		مسح وتوسعة وتسوية طريق آل الجرادي	مسح وتوسعة وتسوية	2,400	4,943,544	1,145	193	160	0	3,078,208	1			100%
		- شق وتوسعة فروع ال مربع	شق وتوسعة	536	1,955,159	182	479	507	0	1,317,178	1			100%
		اصلاح اضرار الامطار في طرق القعوة وال المقراني	تسوية وردم	-	4,540,620	0	0	0	0	4,115,742	1			100%
		شق طريق المشراق والسونة	شق وتسوية	800	4,402,623	1,885	1,170	640	0	6,847,585	1			00%
صعدة	حيدان	شق وتوسعة وتسوية فروع طريق العضيمى /الحفوز	شق وتوسعة وتسوية	850	1,470,650	0	966	300	0	1,417,116	1			100%
		شق وتوسعة طريق جونان	شق وتوسعة	1,000	4,394,993	755	1,704	0	0	4,620,890	1			100%
		شق وتوسعة وتسوية طريق العصيمي (النيسة)	شق وتوسعة	354	2,935,357	0	2,988	0	0	3,702,132	1			100%
		مسح وتوسعة طربق الحصن	مسح وتوسعة	177	4,990,451	0	2,778	0	0	2,894,676	1			00%
		شق وتوسعة تحويلة الصفاح	شق وتوسعة	124	3,083,690	0	1,920	1,142	0	3,424,494	1			00%
		توسعة طريق سد قوار	توسعه وتسوية	651	2,064,286	454	886		0	1,811,270	1			100%
		مسح وتوسعة طريق أرضية تجزر	مسح وتوسعة	700	2,417,278	220	500	80	0	1,217,320	1			100%
		شق وتسوية تحويلة الجزرة	مسح وتوسعة	8,300	3,980,123	0	2,584			3,268,760	1			100%
		مسح وتسويه فرع ال مامون	مسح وتوسعة	2,754	597,102	0	416			473,824	1			100%
		شق وتسوية تحويلة غارب الكظيمة	مسح وتوسعة	2,364	3,901,730	0	2,567			3,452,615	1	1		100%
		مسح وتوسعة طريق الردهة	مسح وتوسعة	600	19,262,474	1,796	7,582	264	1,204	14,724,352		1		79%
		توسعة تحويلة قدم الغبر	توسعة	16,725	15,122,646	3,703	798	863		10,044,666	1			100%
		شق وتوسعة طريق الشرو - المرقوع - مران	شق وتوسعة	2,000	29,459,190	3,178	8,280	1,098	3,463	17,170,812		✓		60%
		مسح وتسوية خط ال احمد	مسح وتوسعة	1,500	26,562,029	3,083	9,542	521	1,820	20,353,962		1		79%
		شق ومسح وتوسعة طريق شمر وفروعها	شق وتوسعة وتسوية	1,070	10,949,681	40	2,651	451	0	4,052,099		1		65%
		مسح وتوسعه طريق ال السندوبي	مسح وتوسعة	709	5,438,525	3,308	7,064	830	0	17,320,910		1		85%
		استكمال توسعة طريق الغثار	توسعة وتسوية	4,000	55,945,714	13,480	18.610		0	52,836,810	-	1		98%


برنامج مشاريع توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر ٢٠٢٤م

حــــالة المشروع تكلفة المشروع التغذيذ قريبال							ات المنجزة	الكمي		تكلفة المشروع	775	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة
نسبة الإنجاز	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري			
100%				1	9,382,909			3,770	2,056	12,409,100	1,500		شق وتوسعة وتسوية طريق جبل بني سوادة		
0%	✓				-			1,130	1,892				شق وتوسعة وتسوية فروع طريق جبل بني سوادة		
45%			1		5,598,968		115	1,583	1,747	12,315,460	30		شق طريق غارب مصيدة - الغبر		
0%	1				-		220	12,731	1,339		-		شق وتسوية تحويلة حلس		
0%	✓				-			150			-		مسح وتسويه ارضيه مدرسه غربي ال المقراني		
0%	✓				-			3,700		-	-		مسح وتعديل خط بينة ال درم		
0%	1				-		200	900	480		-		مسح وتسوية وتوسعة طريق مطواه ال فاضل		
0%	***************************************	1								84,795,938	1,500	جدران ساندة وعبارات	الدراسة الأولية جدران ساندة وعبارات طريق الغثار		
0%		1								16,345,246	1,450	شق وتوسعة ومسح	مسح وتوسعة طريق آل الفيش وفروعة	حيدان	
0%		1								5,216,640	775	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق السرو شيبان وفروعة		
0%		1								11,216,286	1,500	مسح وتوسعة	تأهيل وتسوية وتوسعة صخربة لطريق الخوجرة		
0%		1								8,225,545	300	شق وتوسعة	شق وتوسعة خط زهر - الحنجر - وفروع قرية مهد		
0%		1	ļ							11,069,925	1,600	توسعة	تاهيل الطرق التجميعية لقربتى المحفر والمعزب المتفرعة من الخط الرئيسى لعزلة ذويب السفلى		
0%		1	\ \ \							23,030,183	1,500	رصف			
0%		1								25,055,556	450	توسعة ورصف	طربق قربتى هافت والقلة		
0%		1								44,674,490	2,500	توسعة			عدة
0%		1								10,513,356	10,500	-	مسح وتوسعة طريق البلقى ال معضوم الطلح العوالى ذويب السفلى (مرحلة ثانية)		
0%		1								11,301,943	2,500	شق	شق طريق بكيل		
100%				1	6,288,206	1,300	0	2,400	522	7,468,430	2,600	شق وتسوية	شق وتسوية طريق سد ساقين - عرو		-
100%		-		1	1,470,000	350	200	0	233	1,650,851	1,800	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق عظاود		
100%		†		1	7.287.824	8,316	2,948	1.311	517	4,552,232	2,600	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طربق شعب المناسم - ذي عين - وهابة		
100%		-		1	8,670,834	8,882	2,647	1,762	787	7,902,628	3,700	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الشبحة - درجب - الوطن الربرية (المرحلة الأولى)		
100%				1	6,265,127	6.178	1.500	1.356	665	4.264.254	3.700	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة جو الزهرة - المحول - العطفة (المرحلة الأولى)		
100%		 		1	2.515.236	5.950	672	522	0	1,429,402	5.000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق تنبزه - طلان - دبر (المرحلة الأولى)	ساقين	
100%		-		1	14,867,262	7,373	5,607	4,212	1,152	11,581,160	3,700	مسح وتوسعة	صح و حريد حربي حرب سن عزر سخر سدوني. مسح وتوسعة وشق طريق دقرا - شرف الكرب (المرحلة الاولى)		
100%				1	7,304,791	3,571	859	1,064	968	5,288,689	2,100	شق وتوسعة	شق ومسح وتوسعة طريق سد المضايق		
100%		1	İ	1	2,341,546	6,480	1,868	90	0	2,566,292	2,300	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طرق (الصلة السفلى - ال المعيضي - ال العمري - حمك - ال بيضان - شجب)		
100%				1	5,420,052	0	8,808	0	0	9,053,914	18,500	تنظيف دتشات وعبارات	تصفية دتشات وعبارات طريق حيدان - ساقين		
100%				1	21,910,279	6,000	390	6,340	2,835	34,334,248	15,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة خط ذويب غافرة		
100%				1	10,218,960	2,800	1,010	3,250	870	12,116,344	4,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة خط مثلث الجميمة - الخرشعي - الوادي	الظاهر	
100%				1	12,553,914	3,850	2,350	3,050	1,200	18,735,177	9,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية وتوسعة طريق مثلث الجميمة العين _غافرة		
100%				1	8,113,215	3,425	2,230	1,860	530	5,715,180	3,000	مسح وتوسعة	مسح وتسوية طريق حفر العين		
100%		†		1	1,318,545	0	125	755	89	1,777,485	150	شق وتسوية	شق وتوسعة فرع خط الجشمى- غافرة		
100%		+		1	1,270,110	0		830	68	1,556,332	100	شق وتسوية	شق فرع خط دمنة الطور - غافرة		
100%		+		1	4,435,274	5,080	800	1,812	211	6,777,550	1,500	مسح وتوسعة	شق وتوسعة خط المقومة - تعشر - غافرة		
100%		+		1	3,571,890	1,740	80	930	470	4,406,499	2,500	مسح وتوسعة	تسوية وتوسعه طريق العين - القهرة		
100%		-		1	1,297,534	500	301	470	120	1,679,723	133	شق وتسوية	شویت وتوسعت حریق انغین - انظهره شق طریق فرع علیان		
100%				·	3,360,849	0	1,245	1,485	51	10,449,001	350	سق وتسویه شق وتسویهٔ	سق صريق مرع عبيان شق فرع الملطات		

قيد قيد		تكلفة المشروع	الكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	, الد			
نسبة الإنجاز (قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م٣)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين ا	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
100%				1	16,371,256	4,175	785	4,656	2,101	23,319,077	4,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة عقبة مركوزة			43
100%				1	3,370,223	0	2,151	1,062	68	2,700,297	500	شق	شق طريق طلح-غافرة			4
100%				✓	18,207,408	4,215	2,922	5,989	1,105	15,374,351	3,000	مسح وتوسعة	شق طريق القهرة - حَاْر - غافرة وفروعها			43
70%			✓		2,373,624	0	1,130	1,386	66	3,663,980	1,500	توسعة ورصف	مسح وتوسعة طريق بيوض	الظاهر		4
0%		1			0	0	0	0	0	3,416,949	430	توسعة ورصف	توسعة ورصف طريق ال الزبيري + ال أبو احمد			4
0%		✓			0	0	0	0	0	5,990,049	2,300	توسعة ورصف	توسعة وتسوية طريق عليان - جبل خلوفة			
0%		1			0	0	0	0	0	409,936	260	توسعة ورصف	توسعة ورصف طريق الجلاجيب			L
0%		1			0	0	0	0	0	2,969,629	600	توسعة ورصف	توسعة ورصف طريق اليمانية كويع		صعدة	
0%		1	ļ		0	0	0	0	0	1,225,803	-	توسعة ورصف	توسعة ورصف طريق عزان الكومة			L
0%		1			0	0	0	0	0	1,774,460	800	توسعة ورصف	توسعة واستكمال شق طريق عليان			
0%		1			0	0	0	0	0	1,366,229	260	شق وتوسعة	شق وتوسعة طريق العرام			
0%		1			0	0	0	0	0	12,871,547	260	توسعة ورصف	توسعة ورصف طريق نعمان عليان			
0%		1				0	0	0	0	3,025,659	700	مسح وتوسعة	الفروع الخارجة من سوق العين (ذراع الزوامخ)			
00%				1	17,665,744	9,007	4,706	3,923	957	15,195,446	2,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وشق طريق املح النجد موجاء (المرحلة الأولى)			
00%				1	1,694,608	1,132	442	234	179	1,899,791	650	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طربق النضد			
00%				1	18,979,127	9,678	3,513	3,377	1,851	19,978,656	6,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وتسوية الطريق الرابط بين م/ الحشوة و م/ برط العنان (عقبة ذي ملاح الشرج)			
00%				1	4,055,358	2,087	1,610	1,051	0	1,845,873	500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طربق املح النجد عضلة (المرحلة الثانية)			
00%				1	3,306,251	1,750	1,100	978	0	5,634,335	850	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق مخضع المصين (قرية موثبة العلياء)	الحشوة		
00%				1	9,365,625	7,797	1,402	2,330	645	3,395,304	3,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق مخضع ال سالم			
00%				~	14,488,146	25,764	2,281	4,093	1,051	15,368,026	6,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وتسوية الطريق الرابط بين م/ الحشوة وم/ برط العنان وال سالم (عرابة ومخضع)			
00%				1	2,320,193	3,000	432	803	144	3,805,763	100	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وتسوية طريق شبكة ومحطة عمارة			
00%				1	3,902,415	2,550	475	1,580	345	4,481,668	1,200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة وتسوية طريق (تجد - عيبة)			
0%		1			0	0	0	0	0	0	0	مسح	إعادة مسح خط املح تعديل من الوادي والى موجأ			
0%		1			0	0	0	0	0	0	0	مسح	مسح خط موثبة العليا	الحشوة		
0%		1			0	0	0	0	0	42,330,629	260	رصف	رصف خط النجد			
0%		1			0	0	0	0	0	19,443,050	216	رصف	رصف خط ذي ملاح			
29%			1		2,350,531	7,800	540	581	0	8,317,274	1,450	إصلاحات بعد الامطار	اصلاح اضرار الامطار في المديرية - وادي مصل			
0%	1				0	0	0	0	0	0	2,400	رصف	رصف طريق جلود الجرف			
0%	✓				0	0	0	0	0	0	0	عبارات	طرق بني عباد	مجز		-
0%	1				0	0	0	0	0	0	0		طربق العشقي			
0%	✓				0	0	0	0	0	0	0		مسح وتسوية طريق المعاريف			-
51%			1		20,797,378	1,340	1,295	8,345	3,649	42,027,127	1,500	شق وتسوية	استكمال شق طريق غور- السواد			
0%		†	1			0	0	0	0	5,679,510	8,700	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الخراب - العادي			-

		تكلفة المشروع		ات المنجزة	الكميـــــــ		عدد تكلفة المشروع	طبيعة الأعمال	طبيعة الأعمال اسم المشروع						
نسبة الإنجاز	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لتربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري	53) — 1		
0%			✓			0	0	0	0	2,229,254	1,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الثهران		
0%			1			0	o	o	0	3,566,228	4,600	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق مسار نيد االغاري	غمر	صعدة
0%			1			0	0	0	0	74,616,971	3,060	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة خط بقامة - آل بيضان - السهلة - الغمار		0300
0%			✓			0	0	0	0						
0%			1			0	0	0	0		-				
00%				~	15,612,588	14,756	6,141	4,842	757	15,668,886	10,000		مسح وتوسعة (منبر - مرر - ال عبيس)		
00%				1	15,800,703	0	130	1,608	99	مسح وتسوية طريق العقيق مسح وتسوية وتوسعة 6,000 مسح وتسوية وتوسعة 6,000 مسح وتسوية وتوسعة 6,000 مسح وتسوية وتوسعة 10,665,828 مصح وتسوية طريق الزيرات توسعة ورصف 1,500 مسح وتسوية طريق ال عبد شق وتوسعة طريق ال عبد مسح وتسوية طريق المرقب مسح وتسوية طريق المرقب مسح وتسوية طريق المرقب	مسح وتسوية وتوسعة	مسح وتسوية طريق العقيق			
100%				1	5,999,438	0	0	0	0		مسح وتسوية وتوسعة	استكمال مسح وتسوية طريق العقيق	-		
00%				~	8,380,706	0	1,037	2,372	0		توسعة ورصف	رصف وتوسعة طريق الزبيرات			
00%				1	9,413,675	0	1,767	2,738	40		1,500			كتاف	
00%				1	1,399,720	0	0	440	0		مسح وتسوية طريق المرقب				
46%			1		2,163,540	0	670	930	0	5,031,679	2,486	شق وتوسعة	شق وتوسعة طريق بني هويدي		
0%		1			0	0	0	0	0	3,088,421	200	شق وتوسعة	شق وتوسعة طريق السروح الشرقي		
0%		1			0	0	0	0	0	2,740,182	200	شق وتوسعة	شق وتوسعة طريق رحبت البر السروح		
100%				1	5,121,239	8,810	1,187	746	378	9,543,892		شق وتوسعة	مسح وتوسعة ونسوية طريق الجرشة ال عمار	الصفراء	
0%		1			0	0	0	0	0	3,243,974	6,000	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة ظريق البلسات الى جوار		
0%		1			0	0	0	o	0	14,440,740	4,900	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق عرابة جبل السعدي	آل سالم	
100%				1	37,576,221	5,257	3,718	9,950	5,299	25,292,592	4,000	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق تفتاح - عرامة - المحجل	بني بحر	
100%				✓	4,360,999	7,729	746	841	400	2,812,515	4,500	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة خط نوني وادي خبر - تمامة		
100%				1	4,456,990	3,814	818	1,534	358	3,018,507	2,850	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة سوق الاثنين - وادي المحرث		
100%				1	9,391,893	15,898	1,511	2,224	846	5,906,553	3,500	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق المسوح سوق الجمعة - فرع الموازي	-	
100%				✓	5,884,994	4,550	210	1,663	938	4,942,117	1,200	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق ال القاسم - الشرقي		
100%				1	7,062,281	16,000	1,763	1,262	374	6,079,561	3,500	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق جبل هثان - جبل السعدي - ال الوقيش		
100%				✓	4,250,406	6,818	360	2,186	0	7,416,392	4,200	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق غيل الخميس - الركبة - وادي سور	•	
100%				1	11,455,569	0	2,097	6,825	289	8,818,520	1,500	شق وتسوية	شق وتوسعة خط المروي - بهيمة - مصحان وفروعة شعب عامر وايلاهة		
100%				✓	8,611,610	3,700	980	5,390		7,062,469	800	مسح وتوسعة وتسوية	مسح وتوسعة طريق سنامة - العطفة - إيلامة	-	
100%				1	4,422,430	0	821	1,495	812	5,879,437	4,000	مسح وتوسعة وتسوية	توسعة طريق سد المورد	بني بحر	
100%				1	5,120,603	0	556	3,220	75	8,262,900	8,500	مسح وتوسعة وتسوية	تأهيل وتسوية ومسح طريق (المكاحل - شويف - واهرة - القملي)		
100%				✓	4,360,999	7,729	746	841	400	2,078,877	4,500	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق الشويف وادي خير	-	معدة
100%				1	2,744,028		957	1,985		10,856,897	1,200	مسح وتوسعة	مسح وتوسعة طريق جول - سور وادي قدامة		0302
90%			1		9,617,370	0	486	8,202	160	14,300,676	1,000	شق وتسوية	شق طريق ال الغيداء		
74%			✓		3,707,497			2,500	85	4,951,169	6,500	شق وتسوية	مسح وتسوية طريق الموقع الجمعه		
5 7 %			1		7,806,326	800	0	3,112	2,298	14,323,728	449		مسار شق وتوسعة طريق ال محفوض -خلب		
73%			1		14,520,667	 	350	7,780	530	20,776,937	6,001		مسح ونسوية طريق المسوح وادي بني علي وفروعها		

حـــــالة المشروع ة المشروع دة قرر ال ا							ات المنجزة	الكميـــــــ		تكلفة المشروع	775	طبيعة الأعمال	اسم المشروع	المديرية	المحافظة	
نسبة الإنجاز	قيد الدراسة	لم يبداء	قيد التنفيذ	منجز	التنفيذية (ريال)	مسح وتسوية لجسم الطريق (م.ط)	توسعة/شق لاربة طبيعية (م۳)	توسعة/شق لتربة مختلطة (م۳)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م۳)	التقديرية (ريال)	المستفيدين	شق، مسح، توسعة، قطع صخري				
0%		1			0	0	0	0	0	14,323,728	1,762		اصلاح اضرار الامطار طريق تفتاح بني بحر			4
0%		1			0	0	0	0	0	55,705,480	2,500	رصف	رصف طريق معنق العرجي - شاهد همدان راس الجبل			4
0%		1			0	0	0	0	0	137,878,618	-	شق	شق القطعة الرابطة بين المطاب - النموش			4
0%		1			0	0	0	0	0	2,467,845	6,714	مسح وتوسعة	توسعة وصيانة طريق العقوم المعانق بني الاعناق	شداء		
0%		1			0	0	0	0	0	36,424,281	2,000	رصف	المرحلة الثالثة لمشروع رصف طريق ثاهر همدان - راس الجبل المطاب			
0%		1			0	0	0	0	0	29,457,182	2,800		شق طريق اللسان ال عمر الدوشة الضالع	منبه		
2%			1		23,673,068	0	765	16,288	7,028	1,333,344,500	-	شق	شق وسفلتة شارع الستين (الشهيد الصماد)	سحار		
71%	9	37	23	139	1,491,274,195	342,926	132,205	373,041	133,881	4,001,860,022	476,088		اجمالي محافظة صعدة			
0%		1				0	0	0	0	41,752,361	0	شق ومسح وردم	طريق المشرع - شرجان - مروحة الحلحل - لودر (ابين - شبوة)	مكيراس		٦
0%		1				0	0	0	0	23,636,968	2,300	شق ومسح وردم	طريق عقبة الرياشية - جين - دمت - م/ الضالع	الرياشية		
0%	✓					0	0	0	0	0	0	شق ومسح وردم	طريق يكلا - عقبة زعج + طريق بلاد الظهرة بهران - مراد مارب	القريشية		
0%	✓					0	0	0	0	0	0	شق ومسح وردم	طريق المناسح - العشاش - زراجة م/ صنعاء	ولد ربيع		
0%	·					0	0	0	0	0	0	سی ومسے وردم ردم	تحريق النباط بين محيريات العرش - ولد ربيع - رداع الطريق الرابط بين محيريات العرش - ولد ربيع - رداع	رداع	البيضاء	
0%		1				0	0	0	0	4,182,539	0	شق ومسح وردم		الصومعة		
16%			1		13,836,970	7000 م.ط) مسح وتسوية.	م۳) ردم مستعار، و(۵ ساس مساعد		تم انجاز (241.04 م۳) قط	83,261,425	0	سفلته	سفلتة طريق جامعة رداع ٥٥٠٠	زحاع		
2%	3	3	1	0	13,836,970	0	0	0	0	152,833,293	2,300		اجمالي محافظة البيضاء			
0%	✓											رصف	رصف وتحسين طريق المعراضة جبل نهم			
0%	✓											رصف	رصف وتحسين طريق الجر - المظافرة - القعيف	برط العنان		
0%		1								88,664,789	17,177	رصف	رصف وتحسين طريق عقبة هجار - جحش- الظهرة - تواننة (رصف المقاطع الحرجة بطول ١٧١٠ متر طولي وعرض ٨٣٠ متر)			
0%	1											رصف	رصف وجدران طريق الجبل السعيدي - نهيان (رصف المقاطع الوعرة ٢٠٨٠ بطول متر وعرض ٣٨٨ متر وبناء جدران لحماية الطريق ومصارف للسيول)	برد العنان + المراشي		
0%	✓											رصف	رصف وتحسين طريق حلل (رصف المقاطع الحرجة بطول ١٢٢٥ متر طولي وعرض ٣٨٨ متر)	برط العنان + الحشوه ضعدة		
0%	✓											شق ورصف	استكمال شق ورصف طريق الشعف - اقبه	الشعف + الحميدات	الجوف	
0%	✓											رصف	رصف وتحسين طريق مقعر - شواحط -الشعف	خب والشعف		
0%		1								83,613,979	73,723	رصف	رصف وتحسين طريق الشقب (رصف المقاطع الوعرة ١٧٠١ متر طولي وعرض ٣٨٨ متر)	رجوزه		
0%	1											رصف	رصف وتحسين طريق السعلوي - سلبة غراء	12 40 02		
0%	1											رصف	رصف وتحسين طريق القالق - وادي خب (رصف المقاطع الوعرة بطول ٤٠٤٠ متر طولي وعرض ٣٠٨ متر)	رجوزه+ خب		
0%	8	2	0	0	0	0	0	0	0	172,278,768	90,900		اجمالي محافظة الجوف			
i3 %	40	103	68	307	2,972,853,492	1,105,230	550,615	744,414	261,408	6,736,070,530	1,935,864		الإجمــــــالي الكلي للمحافظات			

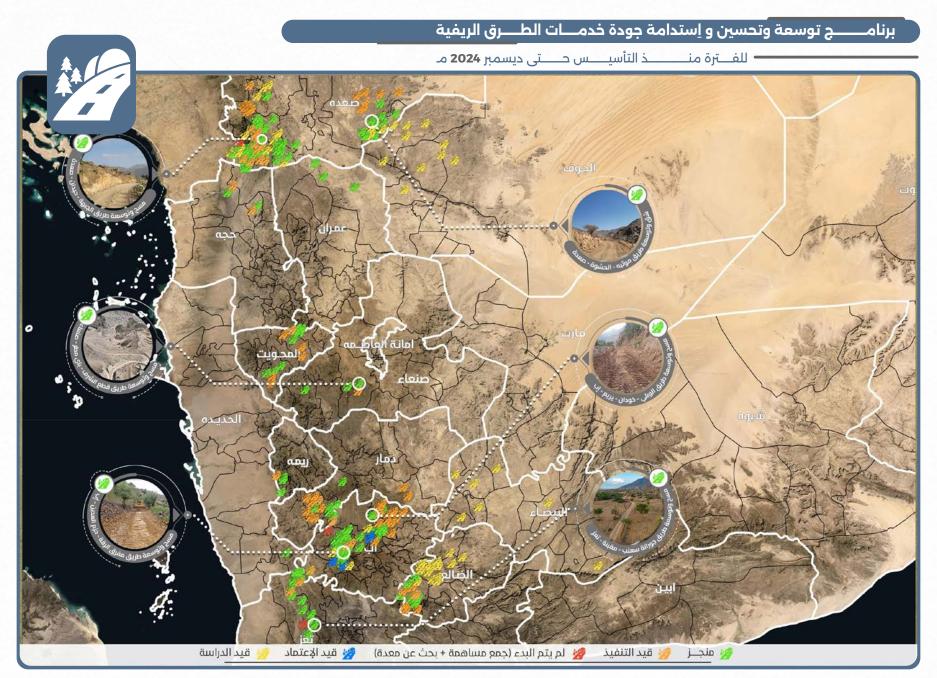







وَزَارَةُ الْمَالِيْتُ ﴾ وِزَارَةُ الْإِذَاقِ وَالنَّهُ عِلَيْهِ وَالنَّهُ عَلِيهُ وَالنَّهُ عَلِيهُ وَالرَّفِيَّةِ

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة Central Emergency Developmental Intrventions Unit

C E

D

U

781010777 🕲 🖸

@cediuye 🚯

@cediu_ye 🎯 🖠

info@cediu.gov.ye @



جميــــع الحقـــوق محفوظة © وحــدة التدخــلات المركزية التنموية الطارئــة

أمانــة العاصمة - صنعــاء، الجمهورية اليمنيـــة هاتــف: 967 781010777 +

فاكس: 470960 (1) 967 +
